

下線箇所について記載箇所・内容を再訂正

使用済燃料貯蔵プール上部鉄骨トラスがれきの撤去を実施

10時37分頃：鉄骨トラスがれきの撤去を開始


13時01分頃：鉄骨トラスがれきの分断

13時09分頃：把持点 南側（●小部材）撤去完了


13時18分頃：残りの鉄骨トラスがれき再把持

14時06分頃：鉄骨トラスがれきの撤去を完了

クレーンにて掴んだ箇所

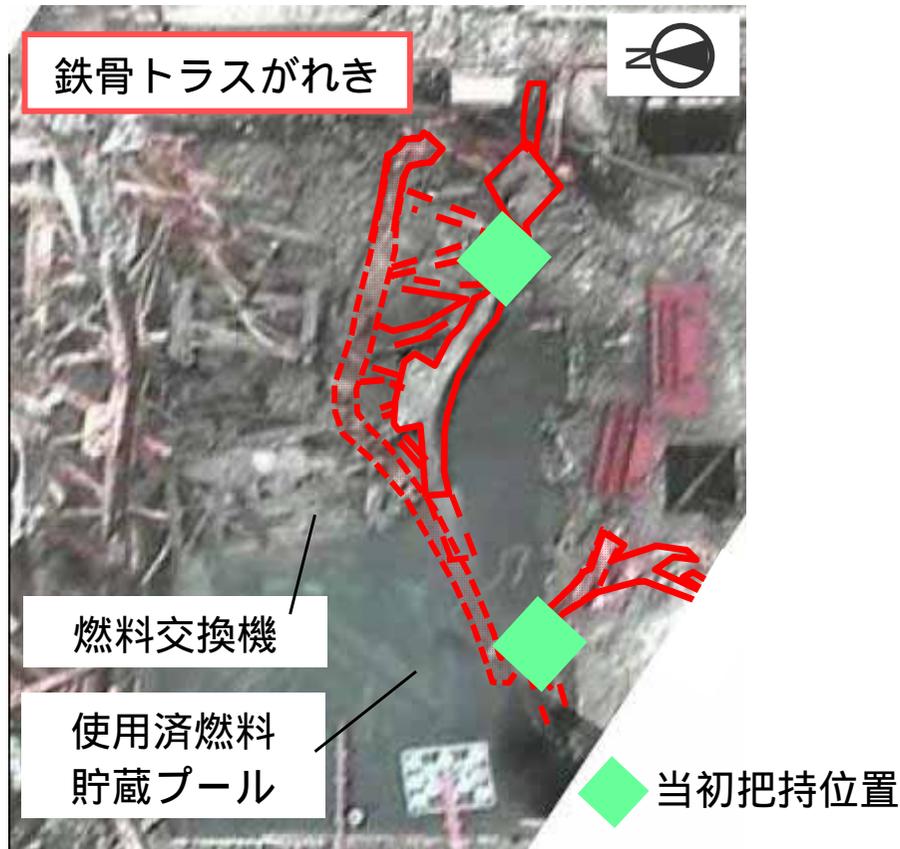

使用済燃料貯蔵プール（撤去前）

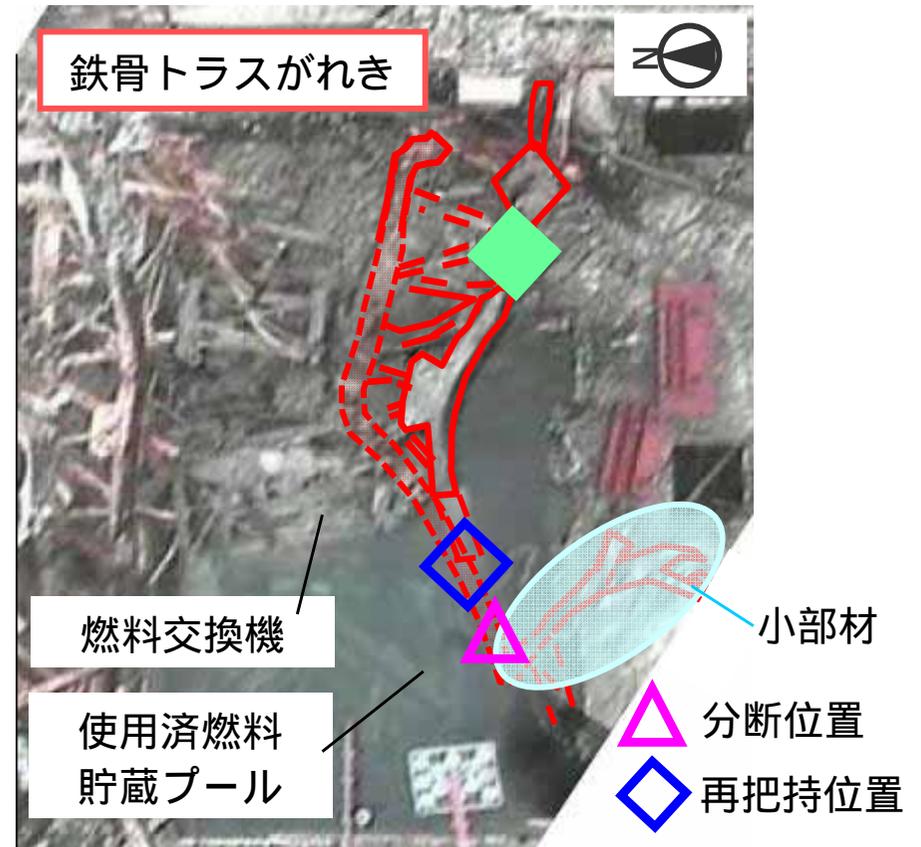

使用済燃料貯蔵プール（分断後）



使用済燃料貯蔵プール（撤去後）

水中カメラおよび気中カメラで当該がれきの挙動は監視しており、その挙動が燃料ラックおよびプールライナに影響を与えるものでないことを確認

作業開始前：使用済燃料貯蔵プール上部雰囲気線量25.6mSv/h

作業完了後：使用済燃料貯蔵プール上部雰囲気線量21.3mSv/h

使用済燃料貯蔵プールの水位に有意な変化が無いことを確認



鉄骨トラスがれき（揚重中）



鉄骨トラスがれき（撤去後）
