
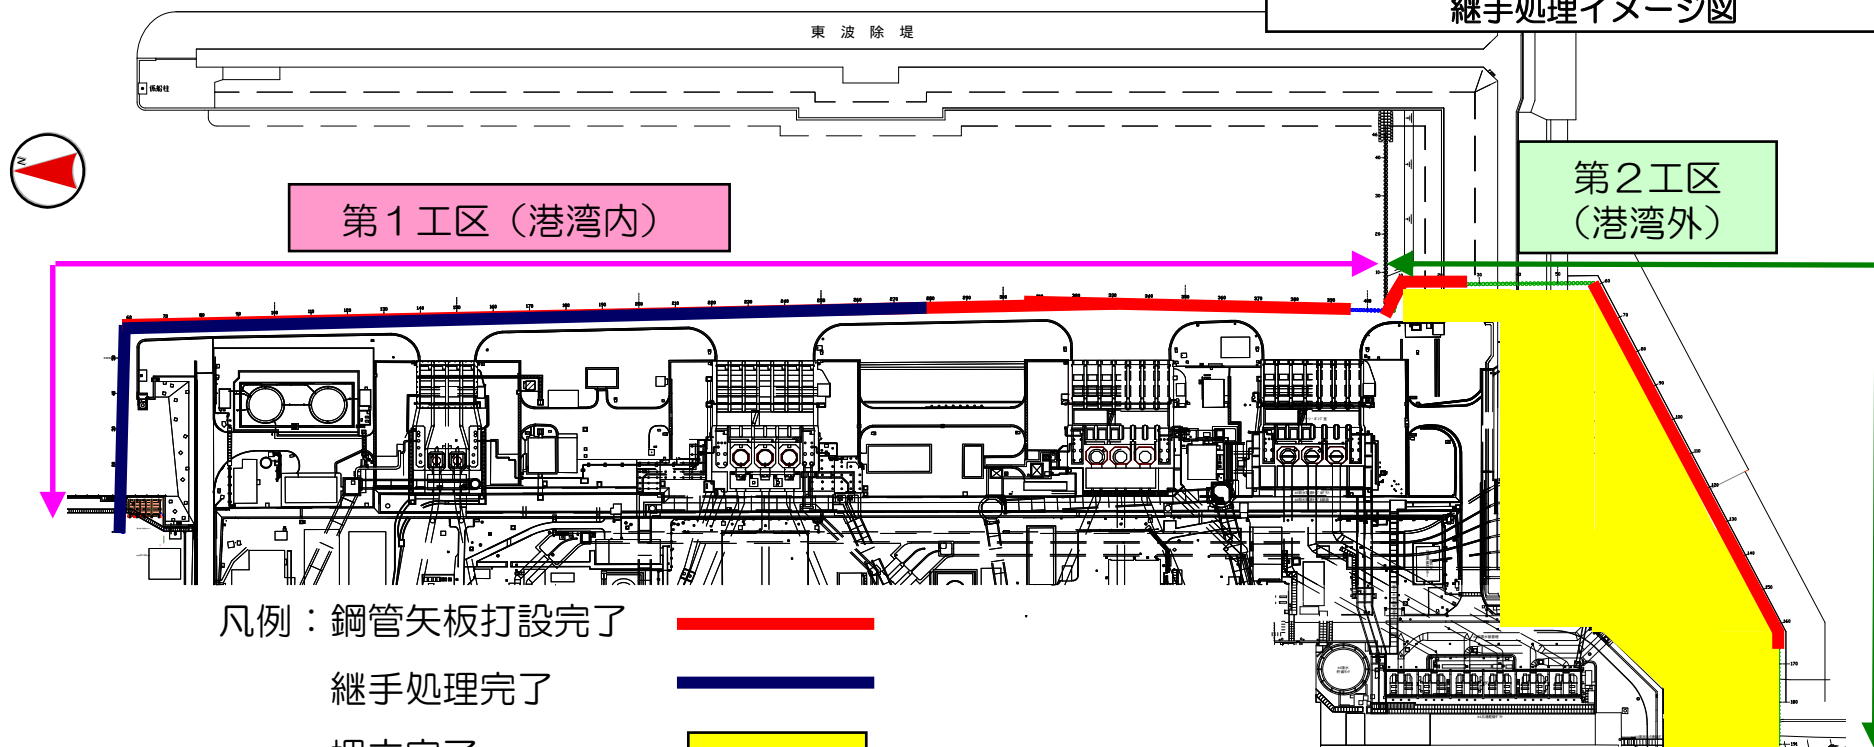


福島第一原子力発電所 海側遮水壁工事の進捗状況について

< 参考資料 >
平成26年1月27日
東京電力株式会社

1. 海側遮水壁の進捗状況（1/26現在）


- ① 第1工区（港湾内）の鋼管矢板打設完了（395／404本）
継手処理完了（293／404本）
- ② 第2工区（港湾外）の鋼管矢板打設完了（139／191本）

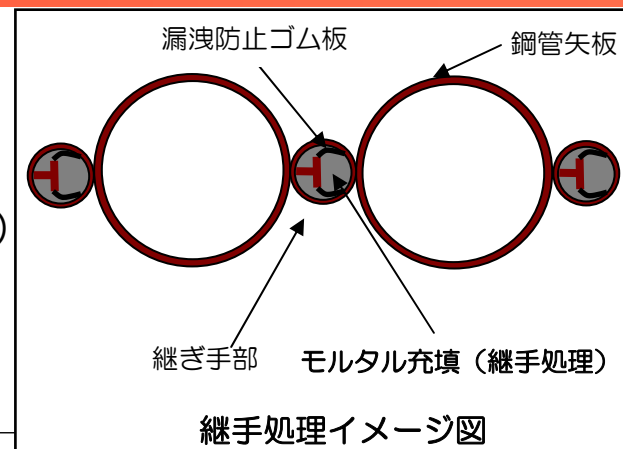

2. 港湾内埋立順序


ブロック分けを行い、北側エリアより、水中コンクリート打設ならびに埋立てを実施中。

港湾内：水中コンクリート	約 900m ³	／約 3,300m ³ (1/26現在)
埋立材（割栗石）	約 2,500m ³	／約 41,000m ³ (1/26現在)

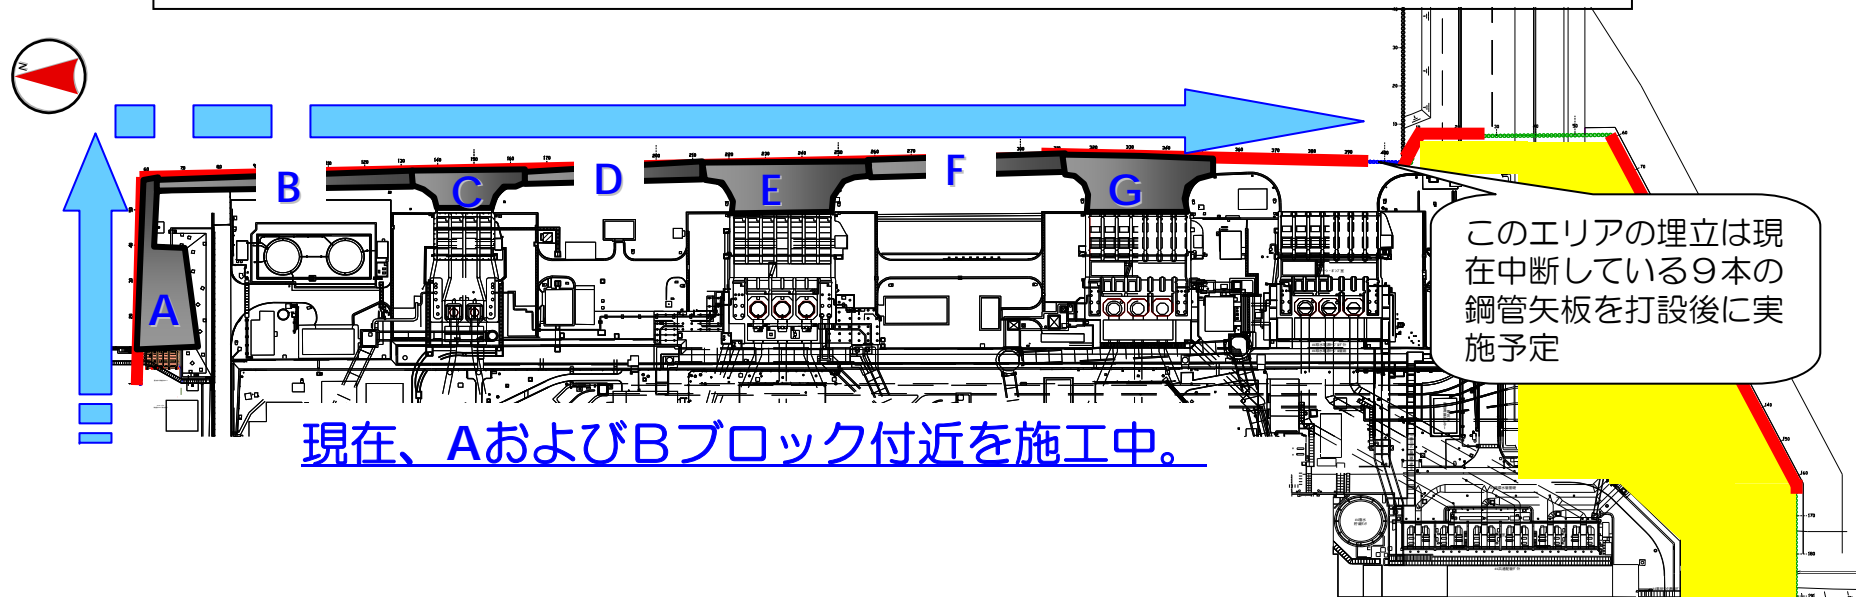

3. 埋立工事に伴う、海水モニタリング地点の減少予定

- 海側遮水壁の埋立工事の進捗に伴い、順次、海水の調査点が減少。
- 鋼管矢板締め切り後の取水路開渠の調査点として、1～4号取水路開渠南北の中央付近に、調査点を追加。

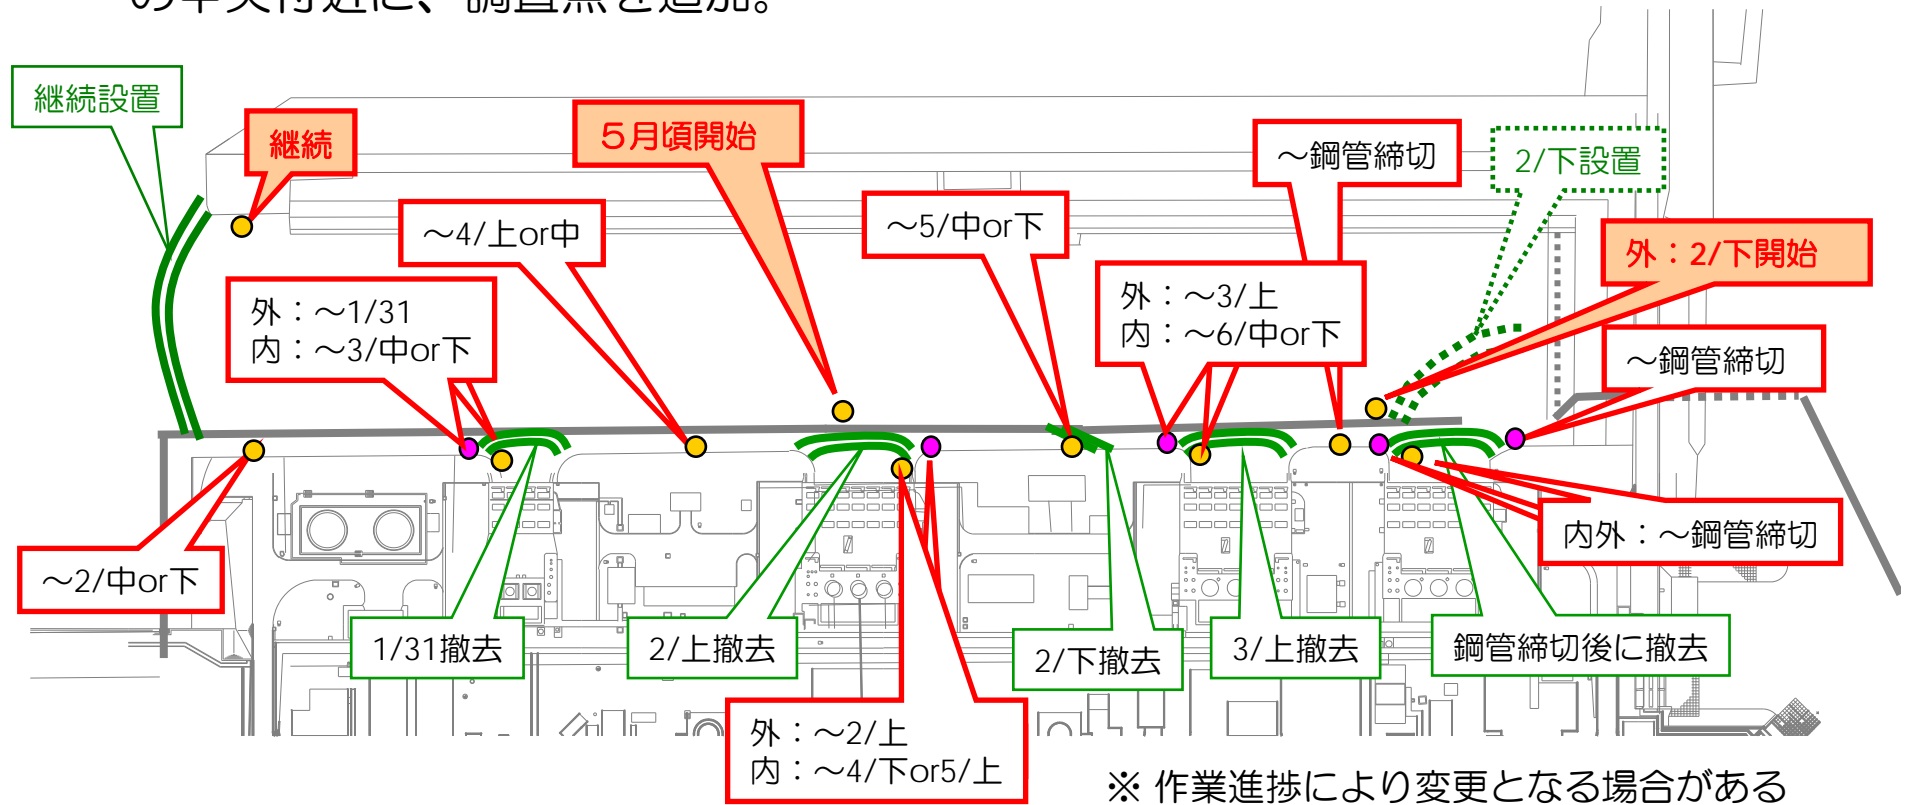

	シルトフェンス関連	● 、全 、H-3測定 ● のみ測定
	海水モニタリング関連 外：シルトフェンス外側 内：シルトフェンス内側	
