


# 福島第一原子力発電所 港湾内海底土被覆工事（その2）の実施状況

< 参 考 資 料 >  
2016年12月26日  
東京電力ホールディングス株式会社

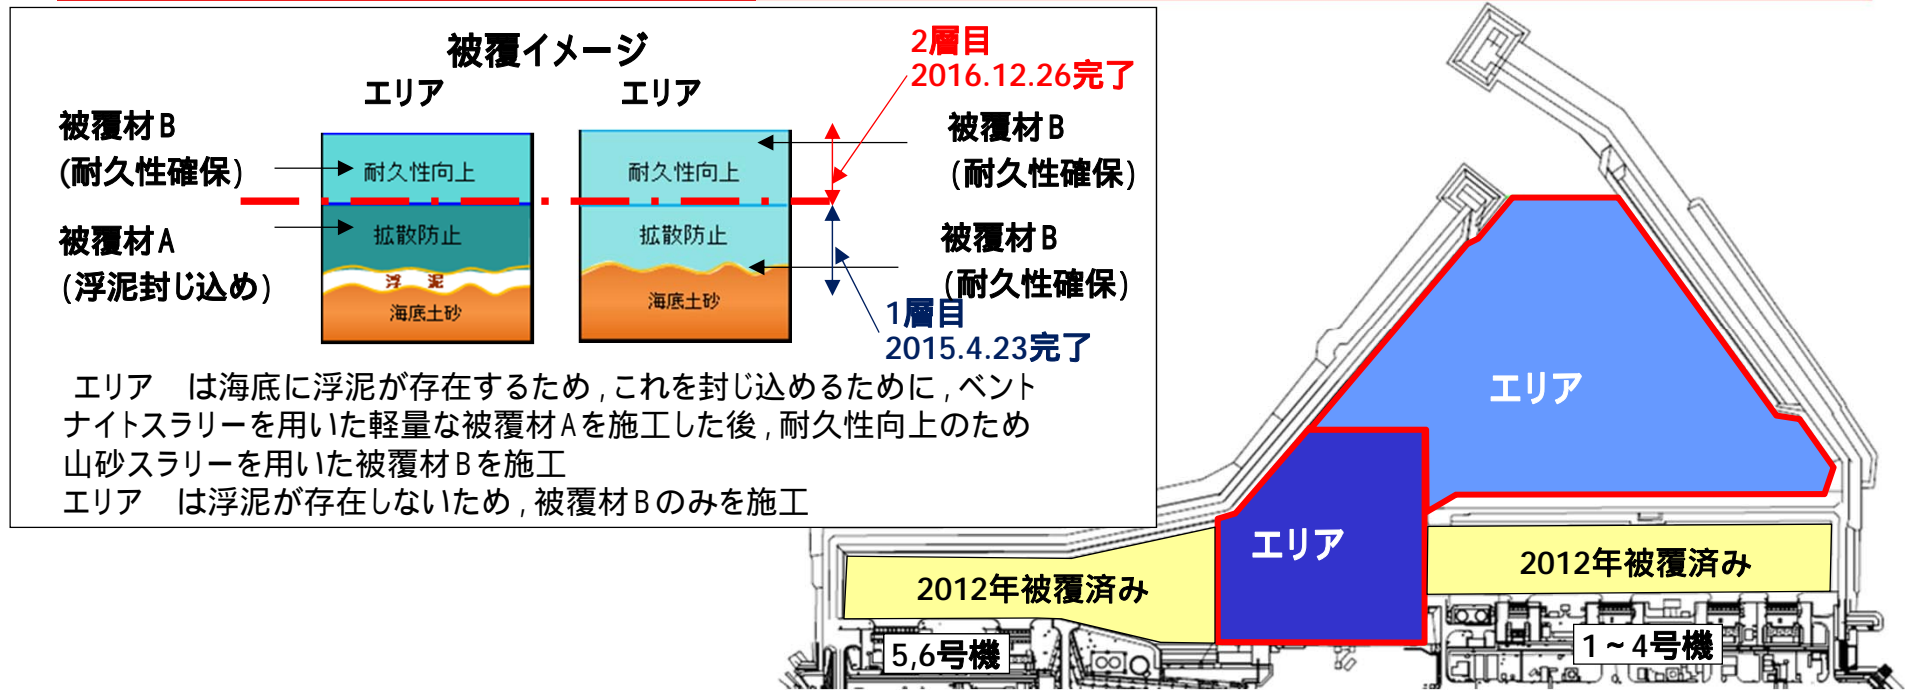

施工エリア	施工面積(m <sup>2</sup> )	耐久性向上:2層目			(参考 拡散防止:1層目)		
		打設量(m <sup>3</sup> )	開始日	完了日	打設量(m <sup>3</sup> )	開始日	完了日
エリア	50,900	21,200	2015.06.23	2015.12.21	10,700	2014.07.17	2014.10.03
エリア	129,700	48,600	2016.03.21	2016.12.26	21,800	2014.12.14	2015.04.23
合計	180,600	69,800	2015.06.23	2016.12.26	32,500	2014.07.17	2015.04.23

2層目打設量は暫定値であり今後変更となる場合がある

< 参考 > 取水口前面における被覆実績（海底土被覆工事(その1)で実施済み）  
 (1~4号機側) 被覆面積: 約34,000m<sup>2</sup>, 施工期間: 2012.3.14 ~ 5.11  
 (5,6号機側) 被覆面積: 約38,600m<sup>2</sup>, 施工期間: 2012.5.16 ~ 7.05  
 取水路開渠は浮泥が存在したため、ベントナイトスラリーを用いた被覆材を使用し、2層被覆した
