


分野名	期別中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定						5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月 以降		備 考
				25	1	8	15	22	29	6	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバールの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027～2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024～2026年度) ●1～6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバール	燃料取り出し用カバールの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のカレキの撤去 燃料取り出し用カバールの設置工事	1号機	(実 績)																				【主要工程】 ○ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバール設置後に再開予定） ・ウェルフラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・SFPゲートカバール設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20～'20/6/18 ・FHM養生設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24 ○大型カバール設置 ・大型カバール仮設構台等設置：'21/8/28～'24/4/11 ・大型カバールアンカー及びベースプレート設置：'22/4/13～'24/9/19 ・本体鉄骨（下部架構）設置：'23/6/19～'24/11/4 ・本体鉄骨（上部架構）設置：'24/11/15～ ・本体鉄骨（ボックスリング）設置：'25/5/21～ ・大型カバール換気設備他準備工事：'21/10/19～'24/12/19 ・大型カバール換気設備他設置工事：'24/12/16～ ・外周鉄骨撤去：'24/10/29～ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床面ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（'19/3/1） ・大型カバール 実施計画変更認可（'23/3/23） ・大型カバール換気設備他 実施計画変更認可（'22/10/27） ※○番号は、別紙配置図と対応	
					(予 定)																				(2026年度完了予定)	
					(実 績)																				(2026年度完了予定)	
					(予 定)																				(2025年度内完了予定)	
					(実 績)																				(2025年度内完了予定)	
		燃料取扱設備	1号機	(実 績)																				(2026年度完了予定)		
				(予 定)																				(2026年4月完了予定)		
			2号機	(実 績)																				(2026年度完了予定)		
				(予 定)																				(2026年度完了予定)		
			2号機	(実 績)																				(2026年度完了予定)		
	燃料取り出し	5号機	(実 績)																				使用済燃料搬出作業			
			(予 定)																				(2031年までに完了予定)			
		6号機	(実 績)																				新規追加			
			(予 定)																				新燃料搬出（準備作業含む）			
		6号機	(実 績)																				(2031年までに完了予定)			
		●その他プール燃料取り出し関連作業	共用プール	燃料受け入れ	(実 績)																				【主要工程】 ・6号機使用済燃料受け入れ（6号機→共用プール）：'22/9/19～'25/4/16 【1,456/1,456体完了（2025/4/16）】 ・SFPサイフォン防止配管修理工事：'24/2/26～'2/28	
	(予 定)																							継続製作者中		
	乾式キャスク製作			(実 績)																				【主要工程】 ・実施計画変更認可済（'20/9/29） 【規制庁関連】 ・基数変更及び収納燃料追加 実施計画変更認可（'24/1/15）		
				(予 定)																				継続製作者中		
	共用プール空き容量確保（既設仮保管設備受入）		(実 績)																				【主要工程】 ・乾式キャスク搬出作業開始（'22/5/11～） ・乾式キャスク搬出作業[6号機用22基中22基]完了（'24/2/16） ・乾式キャスク搬出作業[5号機用20基中5基]完了（'25/6/25） ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設（'22/6～'23/4/21） ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設準備工事（'23/10/18～'24/5/31） ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事（'24/2/9～） 【規制庁関連】 ・設備増設 実施計画変更申請（'23/7/6）			
(予 定)																						(2026年度完了予定)				
乾式保管設備（共用プール用）検討・設計・設置工事	(実 績)																					継続検討中				
	(予 定)																					継続検討中				
高総量機器取り出し	3号機		(実 績)																				(2028年度完了予定)			
			(予 定)																				(2028年度完了予定)			
		(実 績)																				(2028年度完了予定)				
		(予 定)																				(2028年度完了予定)				
	4号機	(実 績)																				(継続検討)				
		(予 定)																				(2036年度以降完了予定)				

廃炉中長期実行プラン2025

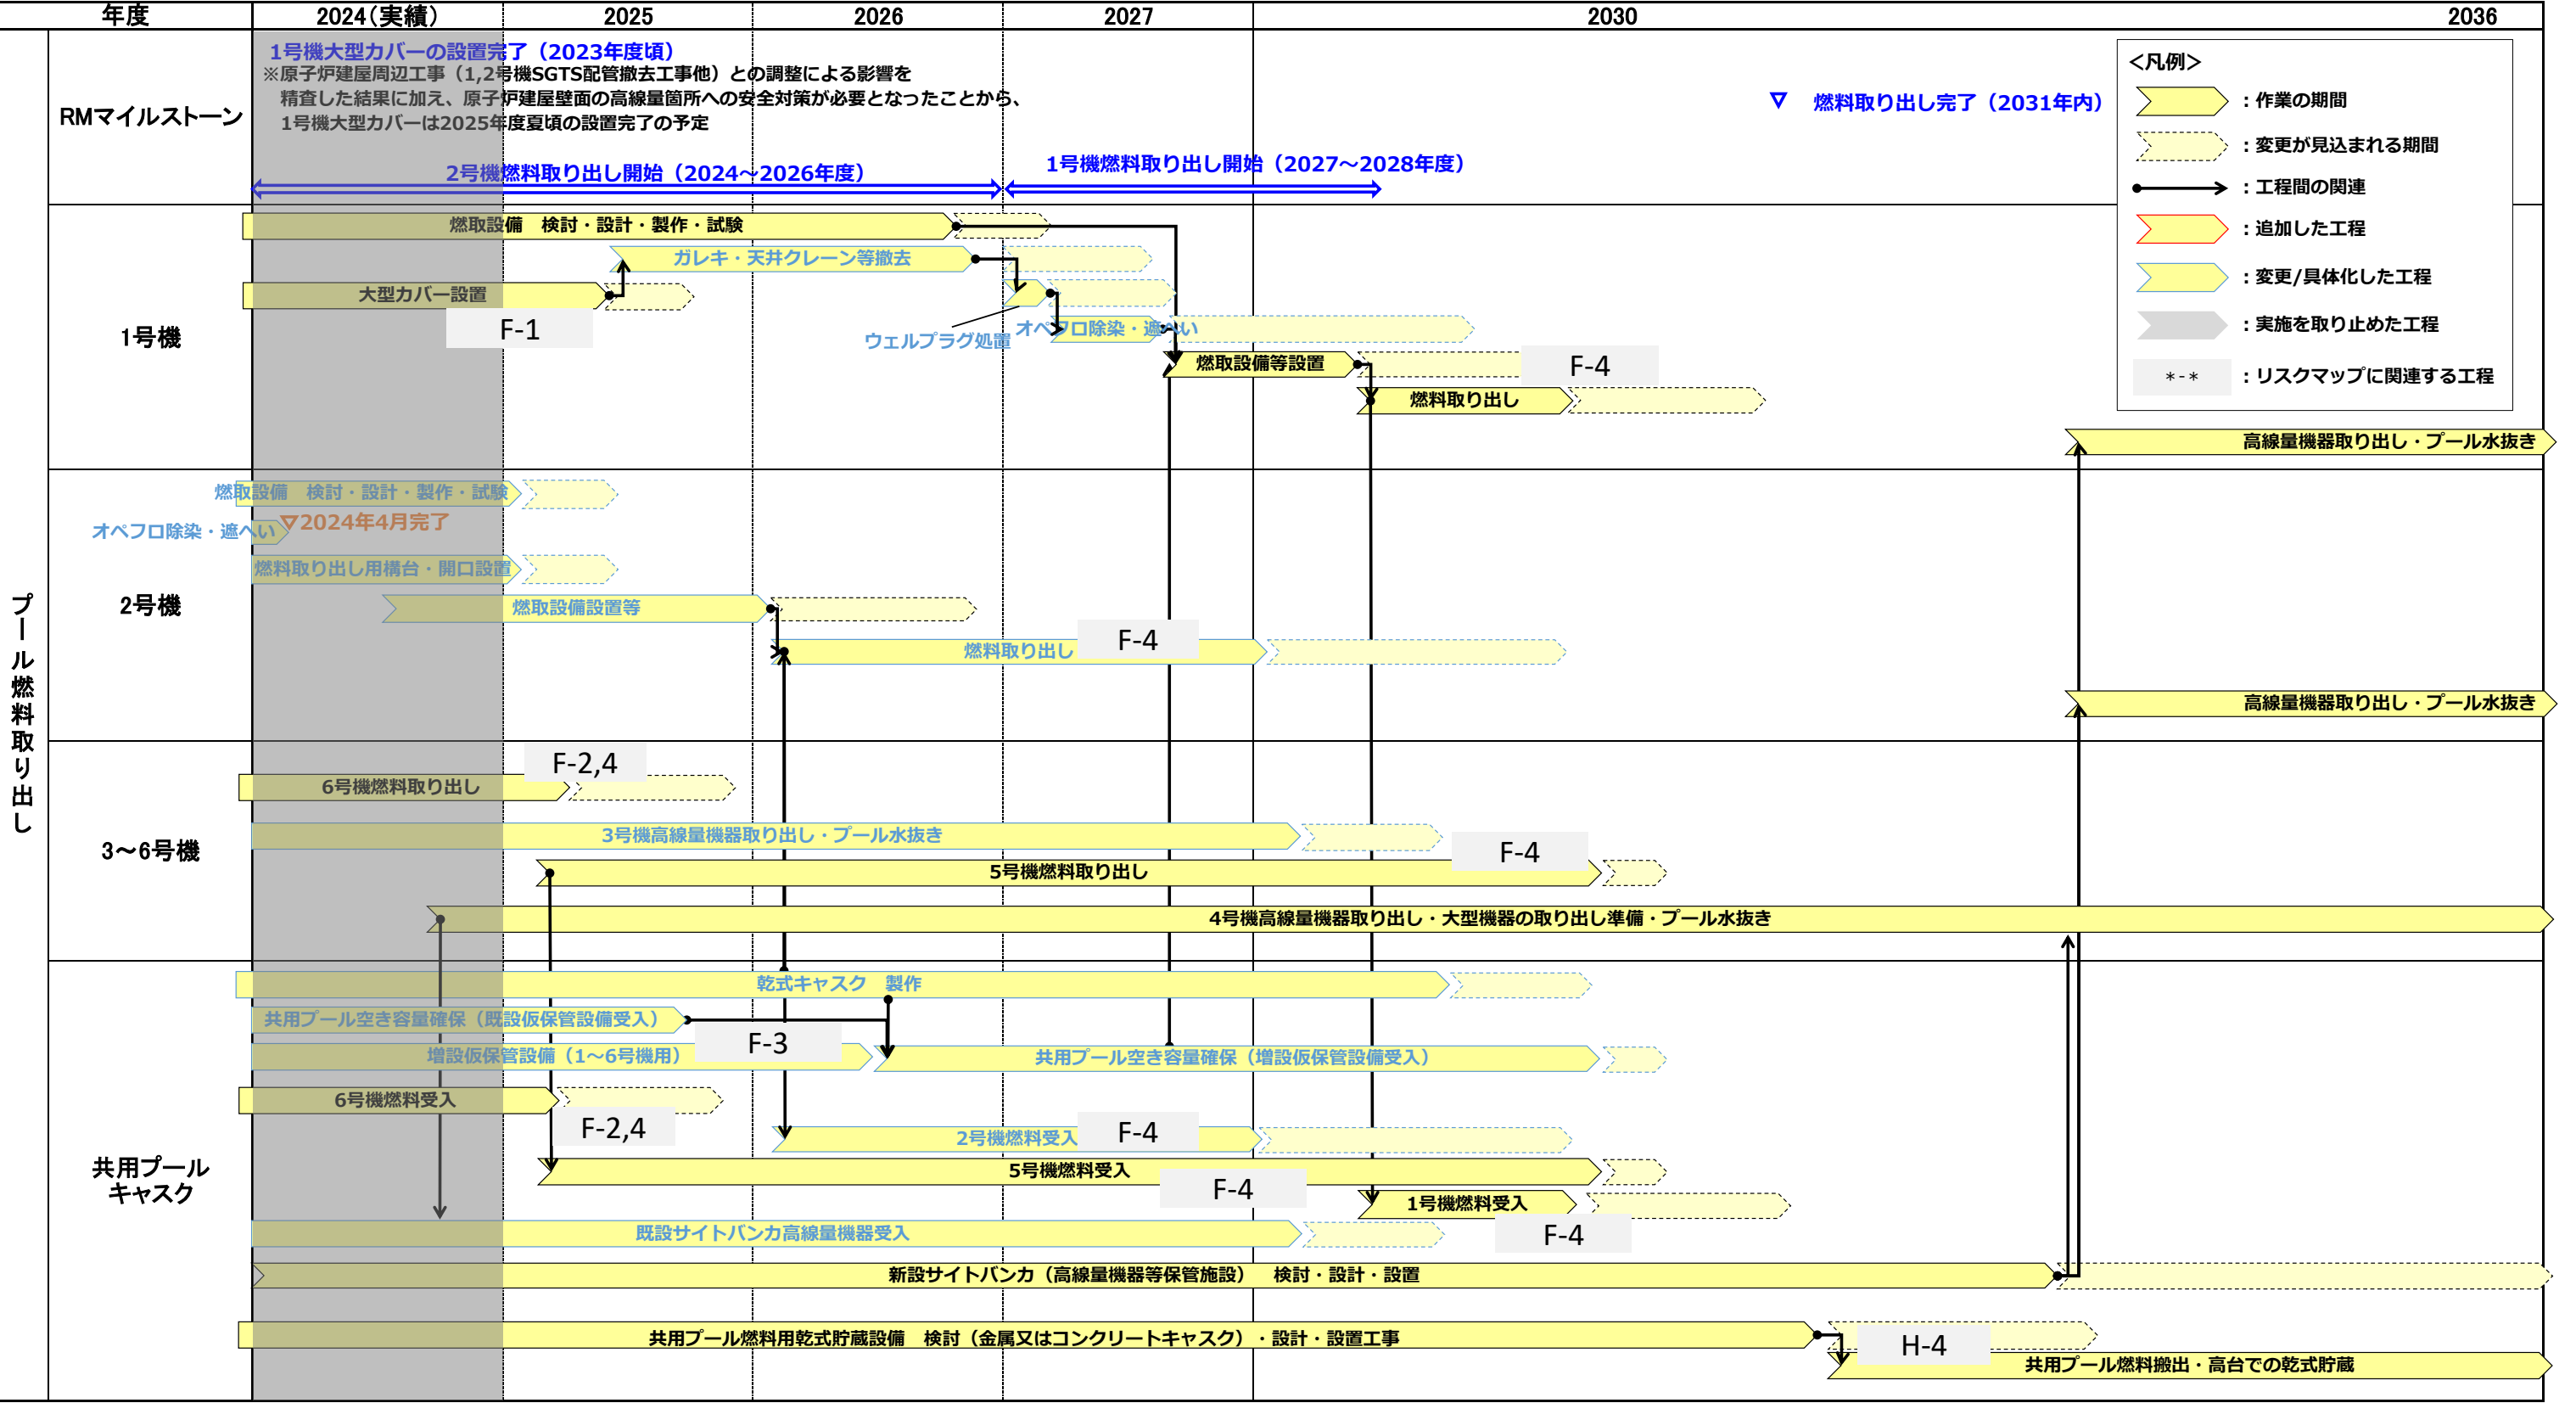

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *-* : リスクマップに関連する工程

プール燃料取り出し

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
