

# 1 汚染水対策


- 3つの基本方針に従った汚染水対策の推進に関する取り組みを行っています  
①汚染源を「取り除く」 ②汚染源に水を「近づけない」 ③汚染水を「漏らさない」

中長期ロードマップにおけるマイルストーン（主要な目標工程）


- ・【完了】汚染水発生量を150m<sup>3</sup>/日以下に抑制（2020年内）
- ・【完了】汚染水発生量を100m<sup>3</sup>/日以下に抑制（2025年内）
- ・【完了】建屋内滞留水処理完了※（2020年内） ※1～3号機原子炉建屋、プロセス主建屋、高温焼却建屋を除く。
- ・【完了】原子炉建屋滞留水を2020年末の半分程度に低減（2022年度～2024年度）

参考資料 1/6  
2025年10月30日  
廃炉・汚染水・処理水対策チーム合会  
事務局会議

|                  |                 | 2011年（平成23年）                                                                                                                          | 2012年（平成24年）                                                    | 2013年（平成25年）                                                                                                   | 2014年（平成26年）                       | 2015年（平成27年）                                                                                                | 2016年（平成28年）                                                                        | 2017年（平成29年）                                                                          | 2018年（平成30年）                                                                                                 | 2019年（平成31年/令和元年）                                                                                                | 2020年（令和2年）                                | 2021年（令和3年）                                                     | 2022年（令和4年）                                | 2023年（令和5年）                                                                           | 2024年（令和6年） | 2025年（令和7年） |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 汚染水対策<br>【取り除く】  | 汚染水処理設備         | ▽集中廃棄物処理建屋への滞留水受け入れ開始<br>▽除染装置（A R E V A）<br><br>▽蒸発濃縮装置<br>▽セシウム吸着装置（KURION）<br>▽第二セシウム吸着装置（SARRY）                                   |                                                                 | <div>セシウム吸着装置</div>           |                                    | ▽RO濃縮塩水の処理完了<br><br>▽セシウム吸着装置（KURION）でのストロンチウム除去（2015年1月6日～）<br>▽第二セシウム吸着装置（SARRY）でのストロンチウム除去（2014年12月26日～） |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              | ▽フランジタンク内のストロンチウム処理水の浄化処理完了<br><br>▽ストロンチウム処理水の浄化処理完了                                                            |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | 海水配管トンネル内の汚染水除去 | <div>第二セシウム吸着装置（サリー）の陸揚げ</div> <br>【海水配管トンネル内の汚染水除去】 |                                                                 | <div>多核種除去設備（ALPS）</div>      | ▽モバイル設備によるトンネル浄化<br>2号             | ▽トンネル部充填完了<br>▽滞留水移送完了<br>▽立坑充填完了（立坑D上部除く）<br>3号<br>▽トンネル部充填完了<br>▽開口部Ⅱ・Ⅲ充填完了<br>4号                         | ▽トンネル部充填完了<br>▽滞留水移送完了<br>▽立坑充填完了（立坑D上部除く）<br>3号<br>▽トンネル部充填完了<br>▽開口部Ⅱ・Ⅲ充填完了<br>4号 | ▽立坑充填完了                                                                               |                                                                                                              | <div>2号海水配管トンネル立坑D充填作業</div>  |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
| 汚染水対策<br>【近づけない】 | 地下水バイパス         |                                                                                                                                       | ▽地下水バイパス設置開始                                                    |                                                                                                                | ▽地下水バイパス稼働開始（2014年5月21日より排水開始）     |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | サブドレン           |                                                      | ▽サブドレンピット設置復旧・新設開始<br>▽サブドレン他水処理設備設置工事着手                        |                                                                                                                |                                    | ▽サブドレン稼働開始（2015年9月14日より排水開始）<br>（処理能力：1000m <sup>3</sup> /日）                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | 陸側遮水壁           |                                                                                                                                       |                                                                 |                               | ▽陸側遮水壁設置工事開始                       |                                                                                                             | ▽凍結開始                                                                               |                                                                                       |                                                                                                              | ▽北側、南側に維持管理運転開始<br>東側に維持管理運転開始                                                                                   | ▽凍結完了（一部除く）<br>▽全区間に維持管理運転開始               |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | フェーシング          | <div>サブドレン浄化設備</div>                                 |                                                                 | <div>陸側遮水壁ライン（冷媒）循環配管</div>  |                                    | ▽雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装（フェーシング）完了<br>（2.5m盤・6.5m盤・1～4号機周辺を除く）<br>▽完了                                               |                                                                                     |                                                                                       | <div>海側遮水壁打設完了の様子</div>  |                                                                                                                  | ▽雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装（フェーシング）完了<br>（1～4号機周辺を除く） |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
| 汚染水対策<br>【漏らさない】 | 護岸地下水対策         |                                                                                                                                       | 護岸の観測用井戸から高濃度の放射性物質を検出▽<br>▽2.5m盤 水ガラスによる地盤改良 開始<br>▽海側遮水壁 設置着手 | ▽汚染エリアからの水の汲上げ（ウェルポイント）開始                                                                                      |                                    |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | 貯留設備            | ▽鋼製角型タンクによる貯留<br><br>▽鋼製円筒フランジタンクによる貯留<br>▽フランジタンクから10Lの水漏れ                                                                           |                                                                 | ▽フランジタンクから300トンの漏洩<br>▽フランジタンクから100トンの水漏れ<br>▽漏洩拡散防止のための堰設置完了<br>▽堰高さ嵩上げ完了                                     |                                    | ▽RO濃縮塩水の浄化処理完了<br>▽鋼製角形タンクのリリース完了                                                                           |                                                                                     |  |                                                                                                              | ▽鋼製機置きタンクの搬去完了（濃縮廃液貯留用タンク以外）<br><br>▽フランジタンク内のストロンチウム処理水の浄化処理完了<br>▽フランジタンク内の処理水を全て溶接型タンクに移送・貯留                  |                                            |                                                                 |                                            |  |             |             |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                                 | ▽地下貯水槽からの汚染水漏洩⇒タンクへの移送開始<br>▽汚染水のタンクへの移送完了<br>▽鋼製円筒溶接タンクによる貯留                                                  |                                    |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  | ▽ストロンチウム処理水の浄化処理完了                         |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                | ▽雨水処理設備によるタンク内雨水の散水開始（2014年5月21日～） |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                            |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |
| 滞留水処理            |                 | ▽滞留水移送装置設置・移送開始                                                                                                                       |                                                                 | ▽移送ラインの信頼性向上（PE管化）工事完了                                                                                         |                                    | ▽サブドレン水位との水位差確保開始<br>▽各建屋から集中Rw建屋への移送開始                                                                     |                                                                                     | ▽1号機T/B 床面露出<br><br>▽3号機・4号機滞留水切離し                                                    |                                                                                                              | ▽1号機・2号機滞留水切離し<br>▽1号機Rw/B 床面露出<br><br>▽2号機・4号機滞留水切離し                                                            |                                            | ▽2号機T/B・Rw・B 床面露出<br>▽3号機T/B・Rw・B 床面露出<br>▽4号機R/B・T/B・Rw/B 床面露出 | ▽2号機R/B 目標水位まで低下完了<br>▽1,3号機R/B 目標水位まで低下完了 |                                                                                       |             |             |
| 津波リスクへの対応        | 開口部閉止           |                                                                                                                                       | ▽建屋開口部閉止対策検討開始                                                  | ▽共用プール工事完了                                                                                                     | ▽1,2号機T/B建屋工事完了<br>▽HTI建屋工事完了      |                                                                                                             |                                                                                     | ▽プロセス主建屋工事完了<br>▽3号機T/B建屋工事完了                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                  | ▽1～3号機R/B建屋工事完了                            | ▽開口部閉止対策完了<br>▽1～4号機Rw/B建屋工事完了                                  |                                            |                                                                                       |             |             |
|                  | 防潮堤             | ▽アウトターライズ津波防潮堤 設置完了                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                |                                    |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                              | ▽千島海溝津波防潮堤 工事開始<br>▽設置完了                                                                                         | 日本海溝津波防潮堤<br>▽現場着手                         |                                                                 |                                            | 日本海溝津波防潮堤 本体工事完了▽                                                                     |             |             |
|                  | メガフロート          |                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                |                                    |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       | ▽海上工事開始                                                                                                      | ▽メガフロート仮着底▽                                                                                                      | ▽内部充填完了（津波リスク低減）                           |                                                                 |                                            |                                                                                       |             |             |

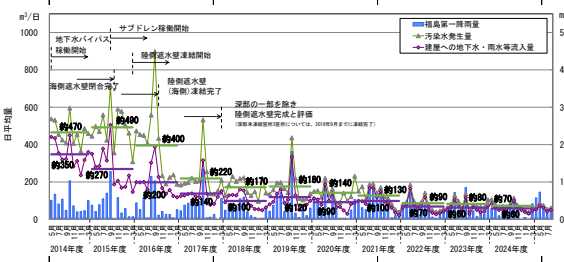

ALPS処理水の海洋放出に当たっては、安全に関する基準等を遵守し、人及び周辺環境、農林水産品の安全を確保してまいります。また、風評影響を最大限抑制するべく、強化したモニタリングの実施、第三者による客観性・透明性の確保、IAEAによる安全性確認などに継続的に取り組むとともに、正確な情報を透明性高く、発信していきます。

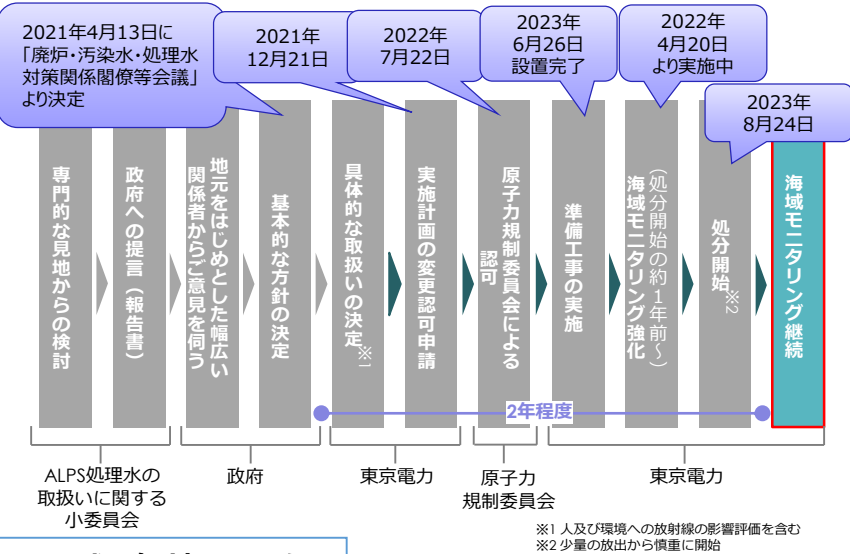

■ 様々な媒体を通じた廃炉に関するコミュニケーションや発電所視察により理解を深めて頂くよう取り組みを実施します。


- 当社ホームページ内の特設サイト「処理水ポータルサイト」（日・英・中・韓）にて、放射性物質モニタリング結果等もタイムリーに公開
- 福島第一原子力発電所の視察・座談会を2019年度から、浜通りの13市町村を対象に開催。2021年度以降は福島県内に拡大して実施
- 訪問説明や説明会等のさまざまな機会を通じ、関係者のご意見を伺いし、その想いを真摯に受け止めながら、当社の取組や考え、風評対策等をお伝えするコミュニケーションを継続



トリチウム水タスクフォース  
(2013/12～2016/5、15回)



大型休憩所から見たタンクエリア（2015年10月29日）

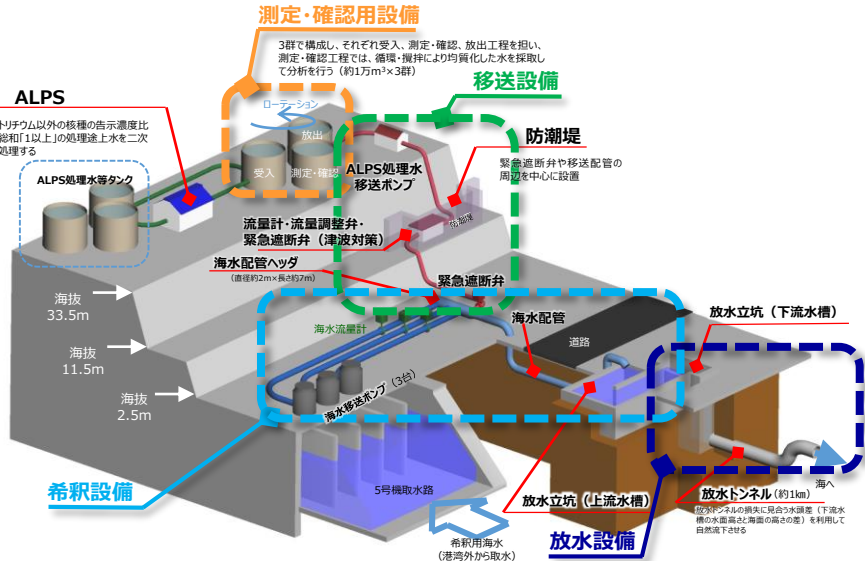


2023年8月24日よりALPS処理水の海洋放出を開始し、9月11日に初回の放出を完了しました。現在までに、以下のとおり実施しています。

放出期間中、国、福島県、東京電力が実施している海域モニタリングにおいても、異常は認められていません。

| 放出したタンク群 | A群                  | C群                  | A群                  | B群                  |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| トリチウム濃度  | 37万ベクレル/ℓ           | 25万ベクレル/ℓ           | 38万ベクレル/ℓ           | 21万ベクレル/ℓ           |
| 放出開始     | 2025年4月10日          | 2025年7月14日          | 2025年8月7日           | 2025年9月11日          |
| 放出終了     | 2025年4月28日          | 2025年8月3日           | 2025年8月25日          | 2025年9月29日          |
| 放出量      | 7,853m <sup>3</sup> | 7,873m <sup>3</sup> | 7,908m <sup>3</sup> | 7,872m <sup>3</sup> |
| トリチウム総量  | 約2.9兆ベクレル           | 約2.0兆ベクレル           | 約3.0兆ベクレル           | 約1.7兆ベクレル           |

- ・「通常海水」と「海水で希釈したALPS処理水」の双方の環境下で海洋生物の飼育試験を実施し、飼育状況等のデータにより生育状況の比較を行い、生育状況に差がないことを確認した。
- ・過去の知見と同様に「生体内でのトリチウムは濃縮されず、生体内のトリチウム濃度が生育環境以上の濃度にならないこと」を確認した。
- ・通常海水で飼育を行っていたヒラメおよびアワビについて、「環境中に放出された水」を使い飼育を開始したが、その前後でヒラメおよびアワビの生育状況に著しい変化はないことを確認した。約半年間の環境中に放出された水を使った飼育において、ヒラメ、アワビは変わりなく生育していることを確認した。

<https://www.iaea.org/topics/response/fukushima-daichi-alps-treated-water-discharge-comprehensive-reports>

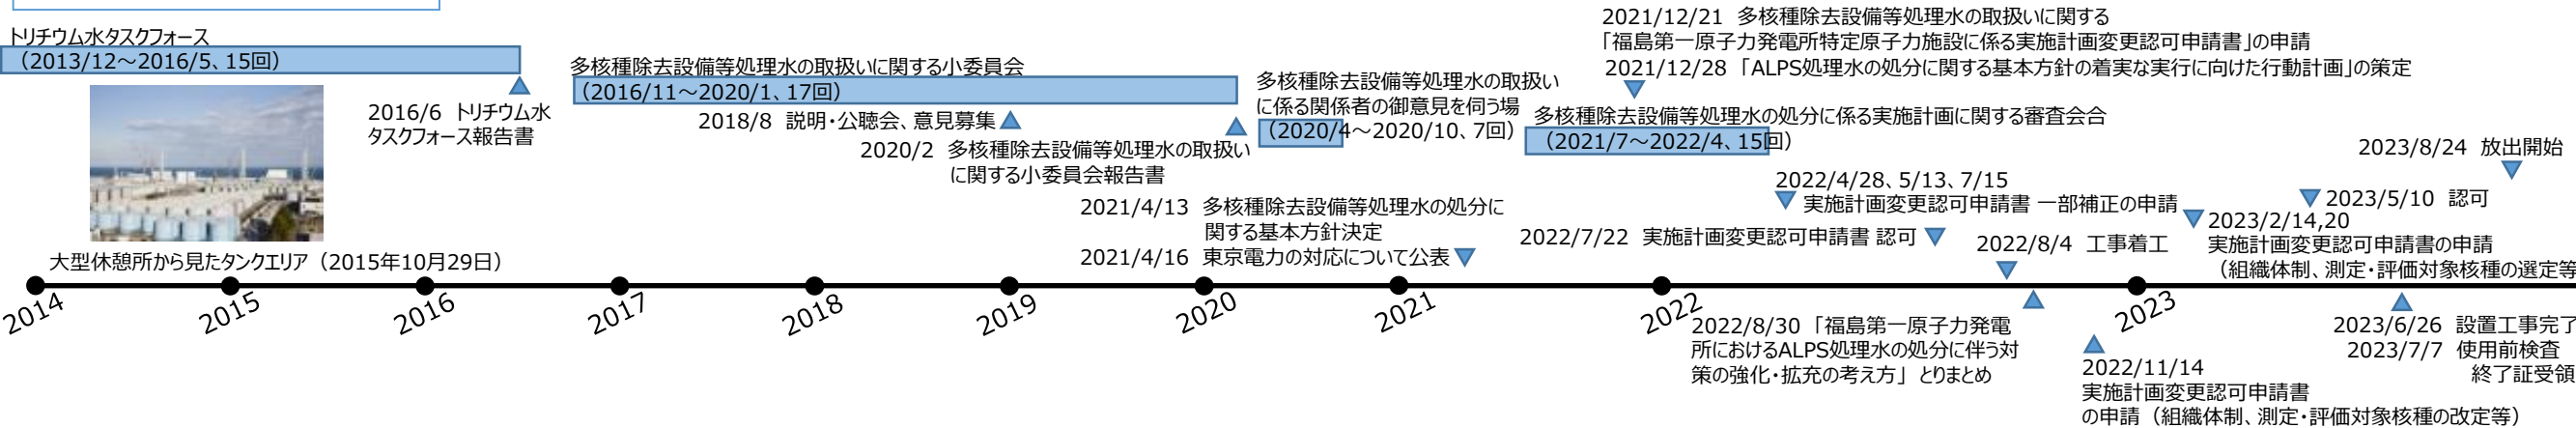

### 3 使用済燃料プールからの燃料の取り出し作業

## 中長期ロードマップにおけるマイルストーン（主要な目標工程）

- ・1～6号機燃料取り出しの完了（2031年内）
- ・1号機大型カバーの設置完了（2023年度頃）、1号機燃料取り出しの開始（2027年度～2028年度）
- ・2号機燃料取り出しの開始（2024年度～2026年度）






参考資料 3/6  
2025年10月30日  
廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合  
事務局会議

凡例

がれき撤去 等

燃料  
取り出し

## 燃料の保管搬出

| 2011年（平成23年） | 2012年（平成24年）                                                                                                                                                                                                                         | 2013年（平成25年） | 2014年（平成26年） | 2015年（平成27年）                                                                                                                                                                                                                         | 2016年（平成28年）                                                                                             | 2017年（平成29年）                                                                                                | 2018年（平成30年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019年（平成31年/令和元年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020年（令和2年）                                                                                       | 2021年（令和3年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022年（令和4年） | 2023年（令和5年） | 2024年（令和6年） | 2025年（令和7年） | ～ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1号機          | 1号機は、建屋全体を覆う大型カバーを設置し、大型カバーの中で、ガレキ撤去を行う計画です。                                                                                                                                                                                         |              |              | <br>ガレキ撤去（イメージ図）                                                                                                                                    | <br>燃料取り出し（イメージ図）      | ▼2017.12 建屋カバー解体 防風フェンス設置完了<br>▼2018.1～2020.12 原子炉建屋北側ガレキ撤去作業<br>▼2018.9～12 Xプレース撤去作業                       | ▼2017.12 建屋カバー解体 防風フェンス設置完了<br>▼2018.1～2020.12 原子炉建屋北側ガレキ撤去作業<br>▼2018.9～12 Xプレース撤去作業                                                                                                                                                                                                                            | ▼2020.3～6 使用済み燃料プール養生設置<br>▼2020.9～11 ガレキ落下防止・緩和对策<br>▼2020.11～2021.6 残置カバー解体<br>▼2021.8 大型カバー準備工事開始<br>▼2022.4 大型カバー設置工事開始                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>2024年12月撮影 | 1号機原子炉建屋への大型カバー設置に当たり、南面外壁で高線量箇所が確認されたため、被ばく低減対策として、高線量箇所に対する遮へいの設置を実施。<br>大型カバーの設置は、南面で確認されたホットスポットの影響（2023年12月公表）等を踏まえ、2025年度夏頃の完了を目指してきた。<br>下部架構を設置し、オペロからの線量影響を詳細に確認できるようになり、より安全に作業を進めるための被ばく抑制対策が必要になったことに加え、悪天候により作業中止を強いられた日数が多かったこと、作業に用いるクレーンの不具合等による工程延伸が発生している。<br>今後も同事象による工程延伸が発生する可能性に加え、夏季の猛暑による作業時間の短縮等を想定する必要があることも踏まえ、大型カバー設置完了の見通しについては、2025年度夏頃から2025年度内に変更する。<br>中長期ロードマップのマイルストーンのうち、2027年度から2028年度としている1号機使用済燃料プールからの燃料取り出し開始の時期については、ガレキ撤去後の作業において、作業手順の見直し等により、今後の工程短縮が可能であると考えており、現時点での見直しは行わない。 |             |             |             |             |   |
|              | ▼2020.3～6 使用済み燃料プール養生設置<br>▼2020.9～11 ガレキ落下防止・緩和对策<br>▼2020.11～2021.6 残置カバー解体<br>▼2021.8 大型カバー準備工事開始<br>▼2022.4 大型カバー設置工事開始                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |
| 2号機          | 2号機は、使用済燃料取り出しに向け、建屋南側に「燃料取り出し用構台（構台・前室）」の建設を行います。                                                                                                                                                                                   |              |              | <br>ランウェイガーダ                                                                                                                                     | ▼2015.3～2016.11 ヤード整備工事<br>▼2016.9～2017.4 西側構台設置工事<br>▼2017.5 西側外壁開口                                     | ▼2018.8～2020.12 残置物移動片付け                                                                                    | ▼2018.8～2020.12 残置物移動片付け                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ▼2020.6 使用済み燃料プール内調査実施<br>▼2021.6～2022.1 原子炉建屋オペロ除染（その1）<br>▼2021.9～2022.5 原子炉建屋オペロ遮蔽体設置（その1）<br>▼2022.5～2022.6 燃料交換機 移動<br>▼2022.7～2023.1 燃料交換機操作室 撤去・片付<br>▼2022.12～2023.3 オペロ既設設備撤去<br>▼2023.4～2023.11 原子炉建屋オペロ除染（その2）<br>▼2023.11～2024.4 原子炉建屋オペロ遮へい（その2）<br>▼2024.4 開口設置に向けた準備作業開始<br>▼2024.6 燃料取出用構台設置完了<br>▼2024.9 換気設備試運転開始<br>▼2024.10 ランウェイガーダ設置作業開始<br>▼2025.3 ランウェイガーダ設置完了<br>▼2025.5 燃料取扱設備の吊り込み完了 | ▼2021.10～2022.4 地盤改良工事<br>▼2023.1 鉄骨建方開始<br>▼2023.2 南側既設設備解体着手                                    | 2号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けては、2018年11月～2019年2月のオペロ内調査の結果を踏まえ、建屋上部を全面解体する工法から建屋南側に小規模開口を設置し、ブーム型クレーンを用いる工法へ変更することとした。引き続き、2024～2026年度の燃料取り出し開始に向け、検討を進める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |   |
|              | ▼2021.10～2022.4 地盤改良工事<br>▼2023.1 鉄骨建方開始<br>▼2023.2 南側既設設備解体着手                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |
| 3号機          | 3号機は、2021年2月に全ての燃料取り出しが完了しました。                                                                                                                                                                                                       |              |              | ▼2013.10 原子炉建屋最上階床面の大きなガレキ撤去完了<br>▼2015.8 使用済み燃料プール内の燃料交換機の撤去完了<br>▼2016.12 原子炉建屋最上階床面に遮へい体設置完了<br>▼2017.1 燃料取り出し用カバーの設置開始                                                                                                           | ▼2019.4.15 燃料取り出し作業開始                                                                                    | <br>カバー内部燃料取扱設備 全体イメージ | 燃料取り出し用カバー設置に向けて、プール内大型ガレキ撤去作業が2015年11月に完了。安全・着実に燃料取り出しを進めるために、現場に設置する燃料取扱設備を用いて、工場にて遠隔操作訓練を実施（2015年2月～12月）。2018年2月23日燃料取り出し用カバー設置完了。<br>燃料取り出しに向けては、燃料取り出し訓練と併せて計画していたガレキ撤去訓練を2019年3月15日より開始し、2019年4月15日より燃料取り出しを開始。2021年2月28日燃料取り出しを完了。                                                                        | <br>3号機 燃料取り出し用カバー（ドーム屋根）2019/2/21撮影>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |
|              | ▼2021.2.28 燃料取り出し作業完了（566体）                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |
| 4号機          | 4号機は、2014年12月に全ての燃料取り出しが完了しました。                                                                                                                                                                                                      |              |              | ▼2011.11～2012.7 原子炉建屋最上階のガレキ撤去作業<br>▼2012.4～2013.3 地盤改良および基礎工事<br>▼2013.4～2013.7 外壁・屋根パネル設置<br>▼2013.6～2013.10 天井クレーン、燃料取り扱い機設置<br>▼2013.8～2013.10 原子炉ウエル内ガレキ、プール内大型ガレキ撤去<br>▼2013.11.18 燃料取り出し作業開始<br>▼2014.12.22 燃料取り出し作業完了（1533体） | <br>4号機 燃料取り出し用カバー> | <br>燃料取り出し状況           | 中長期ロードマップでは、ステップ2完了から2年以内（～2013年12月）に初号機の使用済燃料プール内の燃料取り出し開始を第1期の目標としてきた。<br>2013年11月18日より初号機である4号機の使用済燃料プール内の燃料取り出しを開始し、第2期へ移行した。<br>燃料取り出し作業開始から1年以内となる2014年11月5日に、プール内の使用済燃料1,331体の共用プールへの移送が完了した。残りの新燃料の6号機使用済燃料プールへの移送は、2014年12月22日に完了。（新燃料2体については燃料調査のため2012年7月に先行して取り出し済）<br>これにより、4号機原子炉建屋からの燃料取り出しが完了した。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |
|              | ▼2011.11～2012.7 原子炉建屋最上階のガレキ撤去作業<br>▼2012.4～2013.3 地盤改良および基礎工事<br>▼2013.4～2013.7 外壁・屋根パネル設置<br>▼2013.6～2013.10 天井クレーン、燃料取り扱い機設置<br>▼2013.8～2013.10 原子炉ウエル内ガレキ、プール内大型ガレキ撤去<br>▼2013.11.18 燃料取り出し作業開始<br>▼2014.12.22 燃料取り出し作業完了（1533体） |              |              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |   |

※写真の一部については、核物質防護などに関わる機微情報を含むことから修正


※写真の一部については、核物質防護などに関わる機微情報を含むことから修正しております

中長期ロードマップにおけるマイルストーン（主要な目標工程）  
初号機の燃料デブリ取り出しの開始 2号機から着手。段階的に取り出し規模を拡大（2024年9月10日より、燃料デブリ試験的取り出し開始）

燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため原子炉格納容器（以下、PCV）内部調査を実施。


1号機 調査概要

- ・2015年4月に、狭隘なアクセス口(内径φ100mm)から調査装置を格納容器内に進入させ、格納容器1階内部の映像、空間線量等の情報を取得。
- ・2017年3月、ベデスタル外地下階へのデブリの広がり进行调查するため、自走式調査装置を用いた調査を実施し、PCV底部の状況を初めて撮影。得られた画像データと線量データを元に、PCV内部の状況を継続検討していく。

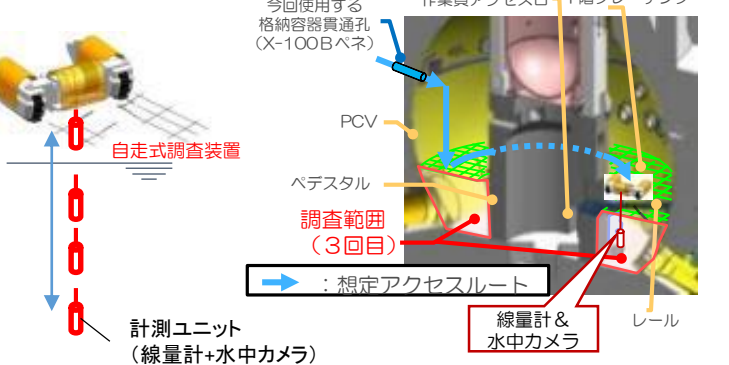

＜測定イメージ＞

- ・2022年2月に、調査を円滑に進める装置である「ガイドリング」を取付。2023年3月28日よりROV-A2によるベデスタル内の調査を開始し、ベデスタル内側の基礎部において一部配筋が露出していることを確認。ベデスタルの健全性に関しては、過去IRIDで実施した耐震性評価より、ベデスタルが一部欠損していても重大なリスクはないと評価しているが、現時点の情報は部分的なものであるため、可能な限り多くの情報取得をすべく、引き続き調査を継続し評価していく。

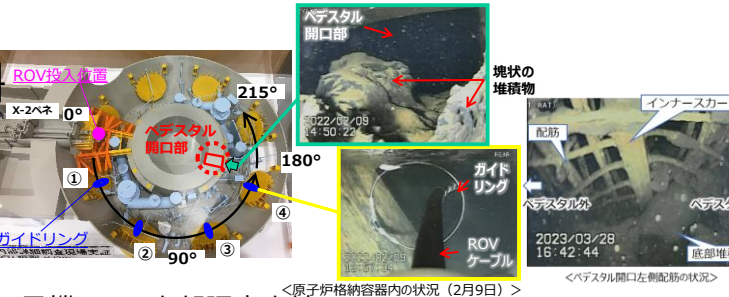

1号機 PCV内部調査実績

|                                                      |                                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PCV内部<br>調査実績                                        | 1 回目<br>(2012年10月)                                             | ・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定<br>・水位、水温測定 ・滞留水の採取<br>・常設監視計器設置            |
|                                                      | 2 回目<br>(2015年4月)                                              | PCV1階の状況確認<br>・映像取得 ・雰囲気温度、線量測定<br>・常設監視計器交換                  |
|                                                      | 3回目<br>(2017年3月)                                               | PCV地下1階の状況確認<br>・映像取得 ・線量測定 ・堆積物の採取<br>・常設監視計器交換              |
|                                                      | 4回目<br>(2022年2月～)                                              | PCV内部（ハデスタル内外）の情報収集<br>・映像取得 ・堆積物厚さ測定、採取<br>・堆積物デブリ検知、3Dマッピング |
| PCVからの漏<br>えい箇所                                      | ・PCVベント管真空破壊ラインベローズ部(2014年5月確認)<br>・サンドクッションドレンライン（2013年11月確認） |                                                               |
| ミュオン測定による燃料デブリ位置評価<br>炉心部に大きな燃料がないことを確認。（2015年2月～5月） |                                                                |                                                               |

2号機 調査概要

- ・2017年1月に、格納容器貫通部からカメラを挿入し、ロボットが走行するレールの状況を確認。一連の調査で、ベデスタル内のグレーチングの脱落や変形、ベデスタル内に多くの堆積物があることを確認。
- ・2018年1月、ベデスタル内プラットホーム下の調査を実施。取得した画像を分析した結果、燃料デブリを含むと思われる堆積物がベデスタル底部に堆積している状況を確認。堆積物が周囲より高く堆積している箇所が複数あることから、燃料デブリの落下経路が複数存在していると推定。
- ・2019年2月、ベデスタル底部及びプラットホーム上の堆積物への接触調査を実施し、小石状の堆積物を把持して動かせること、把持できない硬い岩状の堆積物が存在する可能性があることを確認。



- ・2020年10月、PCV貫通部（X-6ベネ）の堆積物接触調査を実施。今回の調査範囲において、接触により貫通孔内の堆積物は形状が変化し、固着していないことを確認。



2号機 PCV内部調査実績

|                                                                                                          |                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CV内部<br>調査実績                                                                                             | 1回目（2012年1月）                | ・映像取得 ・雰囲気温度測定                      |
|                                                                                                          | 2回目（2012年3月）                | ・水面確認 ・水温測定 ・雰囲気線量測定                |
|                                                                                                          | 3回目（2013年2月～2014年6月）        | ・映像取得 ・滞留水の採取 ・水位測定 ・常設監視計器設置       |
|                                                                                                          | 4回目（2017年1月～2月）             | ・映像取得 ・雰囲気線量測定 ・雰囲気温度測定             |
|                                                                                                          | 5回目（2018年1月）                | ・映像取得 ・雰囲気線量測定 ・雰囲気温度測定             |
|                                                                                                          | 6回目（2019年2月）                | ・映像取得 ・雰囲気線量測定 ・雰囲気温度測定 ・一部堆積物の性状把握 |
| CVから漏えい箇所                                                                                                | ・トラス室上部漏えい無 ・S/C内側・外側全周漏えい無 |                                     |
| オン測定による燃料デブリ位置評価 圧力容器底部及び炉心下部、炉心外周域に燃料デブリと考えられる高密度物質が存在していることを確認。燃料デブリの大部分が圧力容器底部に存在していると推定。（2016年3月～7月） |                             |                                     |

3号機 調査概要

- ・2014年10月、PCV内部調査用に予定しているPCV貫通部（X-53ベネ）の水没確認を遠隔超音波探傷装置を用いて調査を実施し、水没していないことを確認。
- ・2015年10月、PCV内を確認するため、X-53ベネから格納容器内部へ調査装置を入れ、映像、線量、温度の情報を取得、内部の滞留水を採取。格納容器内の構造物・壁面に損傷は確認されず、水位は推定値と一致しており、内部の線量は他の号機に比べて低いことを確認。
- ・2017年7月に、水中ROV(水中遊泳式遠隔調査装置)を用いて、ベデスタル内の調査を実施。調査で得られた画像データの分析を行い、複数の構造物の損傷や炉内構造物と推定される構造物を確認。
- ・また、調査で得られた映像による3次元復元を実施。復元により、旋回式のプラットホームがレール上から外れ一部が堆積物に埋まっている状況等、構造物の相対的な位置を視覚的に把握することが出来た。



3号機 PCV内部調査実績

様子

設置

堆積

### 3号機 PCV内部調査実績

|                                                                                                      |                         |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| PCV内部<br>調査実績                                                                                        | 1 回目<br>(2015年10月～12月)  | ・映像取得<br>・雰囲気温度、線量測定<br>・水位、水温測定<br>・滞留水の採取<br>・常設監視計器設置 (2015年12月) |
|                                                                                                      | 2 回目 (2017年7月)          | ・映像取得<br>・常設監視計器交換 (2017年8月)                                        |
| PCVからの<br>漏えい箇所                                                                                      | ・主蒸気配管ベローズ部 (2014年5月確認) |                                                                     |
| ミュオン測定による燃料デブリ位置評価<br>もともと燃料が存在していた炉心域に大きな塊は存在しないこと、原子炉圧力容器底部に一部燃料デブリが存在している可能性があることを評価。(2017年5月～9月) |                         |                                                                     |

参考資料 5/6  
2025年10月30日  
廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合  
事務局会議

[illegible]

## 現在の姿

### 瓦礫等の保管状況

現在の保管量  
約**50万**m<sup>3</sup>  
(2024年3月時点)

瓦礫類（可燃物）・伐採木・使用済保護衣

屋外集積

伐採木一時保管槽

容器保管

汚染土（0.005～1mSv毎時）

屋外集積

容器保管

瓦礫類（金属・コンクリート等）

1mSv毎時超  
容器保管

覆土式  
一時保管施設

固体廃棄物貯蔵庫

0.005～1mSv毎時

屋外集積

容器保管

シート養生

0.005mSv毎時未満

容器収納  
(除染済のタンク片)

屋外集積

### 水処理二次廃棄物の保管状況

使用済吸着塔一時保管施設

当面10年程度  
の予測  
約**69万**m<sup>3</sup>  
(※2)

約25万m<sup>3</sup>

約7万m<sup>3</sup>

約5万m<sup>3</sup>

約15万m<sup>3</sup>

約16万m<sup>3</sup>

約7,600基

### 焼却処理

焼却炉前処理設備  
(2027年度以降竣工予定)

破碎装置 例

雑固体廃棄物焼却設備

増設雑固体廃棄物焼却設備

瓦礫類と同様に固体廃棄物貯蔵庫にて保管・管理

### 減容処理

減容処理設備

コンクリート破碎機

金属切断機

### 溶融処理

溶融設備  
(検討中)

アーク炉 例

処理方策等は今後検討

### 10年後の姿

約**29万**m<sup>3</sup>

### 保管・管理

固体廃棄物貯蔵庫  
(保管容量約25万m<sup>3</sup>)

既設固体廃棄物貯蔵庫  
第1～8棟（既設）  
第9棟（2018年2月運用開始）  
第10棟（2024年8月運用開始）

増設固体廃棄物貯蔵庫  
第11棟  
(2027年度以降 竣工予定)

廃棄物発生量の予測結果より、  
2031年頃に固体廃棄物貯蔵庫  
の保管容量：約25万m<sup>3</sup>に  
到達する見込みであるため、  
固体廃棄物貯蔵庫の追設等について  
検討を進める

再利用を検討

使用済吸着塔一時保管施設

大型廃棄物保管庫

(2025年度竣工予定)

本体工事状況


(※1) 焼却処理、減容処理、溶融処理、再利用が困難な場合は、処理をせずに直接固体廃棄物貯蔵庫にて保管  
(※2) 数値は端数処理により、1万m<sup>3</sup>未満で四捨五入しているため、内訳の合計値と整合しない場合がある  
(※3) 2028年度末時点では、約24万m<sup>3</sup>の廃棄物を固体廃棄物貯蔵庫に保管する予測となっている

凡例   ： 新增設する設備・施設

- 屋内保管への集約および屋外保管の解消により、敷地境界の線量は低減する見通しです。
- 焼却設備の排ガスや敷地境界の線量を計測し、ホームページ等にて公表しています。

作業員の被ばく線量管理を確実に実施しながら長期に亘って要員を確保。また、現場のニーズを把握しながら継続的に作業環境や労働条件を改善

発電所全体の放射線量低減・汚染拡大防止については、これまでガレキ撤去や表土除去、フェーシングを行うことで構内の放射線量を低減するとともに、環境改善が進んだ範囲をグリーンゾーンとして、身体的負担の少ない一般作業服と使い捨て式防塵マスクで作業できるよう運用の改善も図ってまいりました。

| 2011年（平成23年）                                                            | 2012年（平成24年）                                                                                           | 2013年（平成25年）                                                                                                        | 2014年（平成26年）                                                                                                       | 2015年（平成27年）                                                                                                                                                                    | 2016年（平成28年）                                                                                                       | 2017年（平成29年）                                                                                                            | 2018年（平成30年）                                                                                                                                          | 2019年（平成31年/令和元年）                                                                                                                 | 2020年（令和2年）                                                                                                                           | 2021年（令和3年） | 2022年（令和4年）                                                                                                                                                                                  | 2023年（令和5年）                                                                                                                  | 2024年（令和6年）～ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▼ 2011年3月12日より、空气中放射性物質濃度の上昇を受けて、免震重要棟・休憩所を除く福島第一原子力発電所構内全域で全面マスク着用を指示。 |                                                                                                        | ▼ 2013年5月～、全面マスク着用省略エリアを順次拡大。                                                                                       | ▼ 2013年6月、福島第一原子力発電所正門付近の入退域管理施設運用を開始。これまでJヴィレッジで実施していた汚染検査・除染、防護装備の着脱及び線量計の配布回収を実施。                               | ▼ 福島第一構内で働く作業員の方が、現場状況を正確に把握しながら作業できるよう、2015年1月までに合計86台の線量率モニタを設置。これにより、作業する場所の線量率を、その場でリアルタイムに確認可能となった。                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ▼ 2018年11月より、1～4号機を眺望できる西側高台エリアにおいて、お越し頂いたままの服装で視察可能になった。                                                                         |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |
|                                                                         |  <div>入退域管理施設が観</div> |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |  <div>フェーシング（2017年4月13日撮影）</div> |  <div>フェーシング（2017年4月13日撮影）</div>     |                                                                                                                                                       |  <div>福島県知事による福島第一原子力発電所のご視察（2018年11月1日）</div> |  <div>岸田総理（当時）による福島第一原子力発電所のご視察（2021年10月17日）</div> |             |  <div>石破総理による福島第一原子力発電所のご視察（2024年12月14日）<br/>（左）1～4号機を俯瞰できる高台で廃炉の状況をご覧いただいている様子<br/>（右）激励をいただいている様子</div> |                                                                                                                              |              |
|                                                                         |                                                                                                        |  <div>大型休憩所建設中（2014年9月30日撮影）</div> |  <div>入退域管理棟（2014年11月7日撮影）</div> | ▼ 2015年3月、福島給食センター開所<br>▼ 作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置し、2015年5月より運用を開始。大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務作業が出来るスペースや集合して作業前の安全確認が実施できるスペースを設けている。大型休憩所内において、2016年3月にコンビニエンスストアが開店、4月よりシャワー室が利用可能となった。 |                                                                                                                    |  <div>一般作業服での移動風景（2016年1月7日撮影）</div> | ▼ 2017年2月、新事務本館に隣接した協力企業棟を運用開始。<br>▼ 2017年5月、救急搬送用ヘリポートを福島第一原子力発電所敷地内に設置し、運用開始。従来の運用（双葉郡山海岸又は福島第二にてドクターヘリに乗り継ぎ）に比べ、外部医療機関の処置が必要な重症者の対応が速やかに出来るようになった。 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             | ＜構内主要道路の走行サーベ結果＞<br>昨年度と比較すると、1～4号機東側（図中黒破線箇所）の道路において線量率の低下を確認した。当該エリアは、防潮堤設置工事他により、線量が低減したものと考えられる。                                                                                         |                                                                                                                              |              |
|                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |  <div>2023年度 第4四半期<br/>(2024.2 測定)</div>                                                                 |  <div>2024年度 第4四半期<br/>(2025.3 測定)</div> |              |
|                                                                         |                                                                                                        | ▼ 2013年5月、1～4号機周辺・タンクエリア・ガレキ保管エリアを除くエリアについて、全面マスク着用を省略できるエリアに設定。                                                    |                                                                                                                    | ▼ 2015年5月、全面マスク着用を不要とするエリアを構内の約90%まで拡大。                                                                                                                                         | ▼ 2016年3月、放射線防護装備の適正化福島第一原子力発電所敷地内の環境線量低減対策の進捗を踏まえて、1～4号機建屋周辺等の汚染の高いエリアとそれ以外のエリアを区分し、各区分に応じた防護装備の適正化の運用を限定的に開始。    |                                                                                                                         | ▼ 2017年3月、Gゾーンエリアを拡大（敷地全体の95%まで拡大）。                                                                                                                   | ▼ 2018年5月、構内の約96%のエリアで一般作業服と使い捨て防じんマスクなどの軽装備で作業可能。                                                                                |                                                                                                                                       |             | ▼ 2021年8月、1～4号機周辺防護区域外（5・6号機建屋内を除く）のGゾーンにおける軽作業にてDS2マスクを不要とする運用を開始。                                                                                                                          |                                                                                                                              |              |
|                                                                         |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                       |             |                                                                                                         |                                                                                                                              |              |
|                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |              |

