


1 / 2

分野名	廃炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月	10月					11月			12月			1月			2月			3月			4月以降			備 考
					28		5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
固体廃棄物の保管管理、 処理・処分計画	●放射能濃度の評価と管理	3. 固体廃棄物の性状把握	(実 績) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析 (予 定) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析	検討・設計																									
					計画に基づいたサンプリングの実施																				(採取継続)				
					汚染水分析・水処理二次廃棄物分析																				(分析継続)				
					瓦礫類分析																				(2026年2月完了予定)				
	●分析施設	処理・処分計画	4. 分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第1棟	(実 績) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む) (予 定) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)	現場作業																							
							放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)																				(分析継続)		
			JAEA分析・研究施設第2棟	(実 績/予 定) ・設置工事	現場作業	設置工事																				(設置工事継続)			
			総合分析施設	(実 績/予 定) ・設計検討(基本設計)	検討・設計	設計検討(基本設計)																							

・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中
・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている
リスト：<https://clads.jaea.go.jp/jp/rd/tech-info.html>
検索：<https://frandl-db.jaea.go.jp/FRAandLI/>

・2020年5月20日 実施計画変更認可申請
・2024年12月11日 実施計画一部補正提出
・2024年12月18日 実施計画変更認可
・2025年3月25日 事前了解
・2025年8月8日 実施計画変更認可申請(仕様変更)

廃炉中長期実行プラン2025

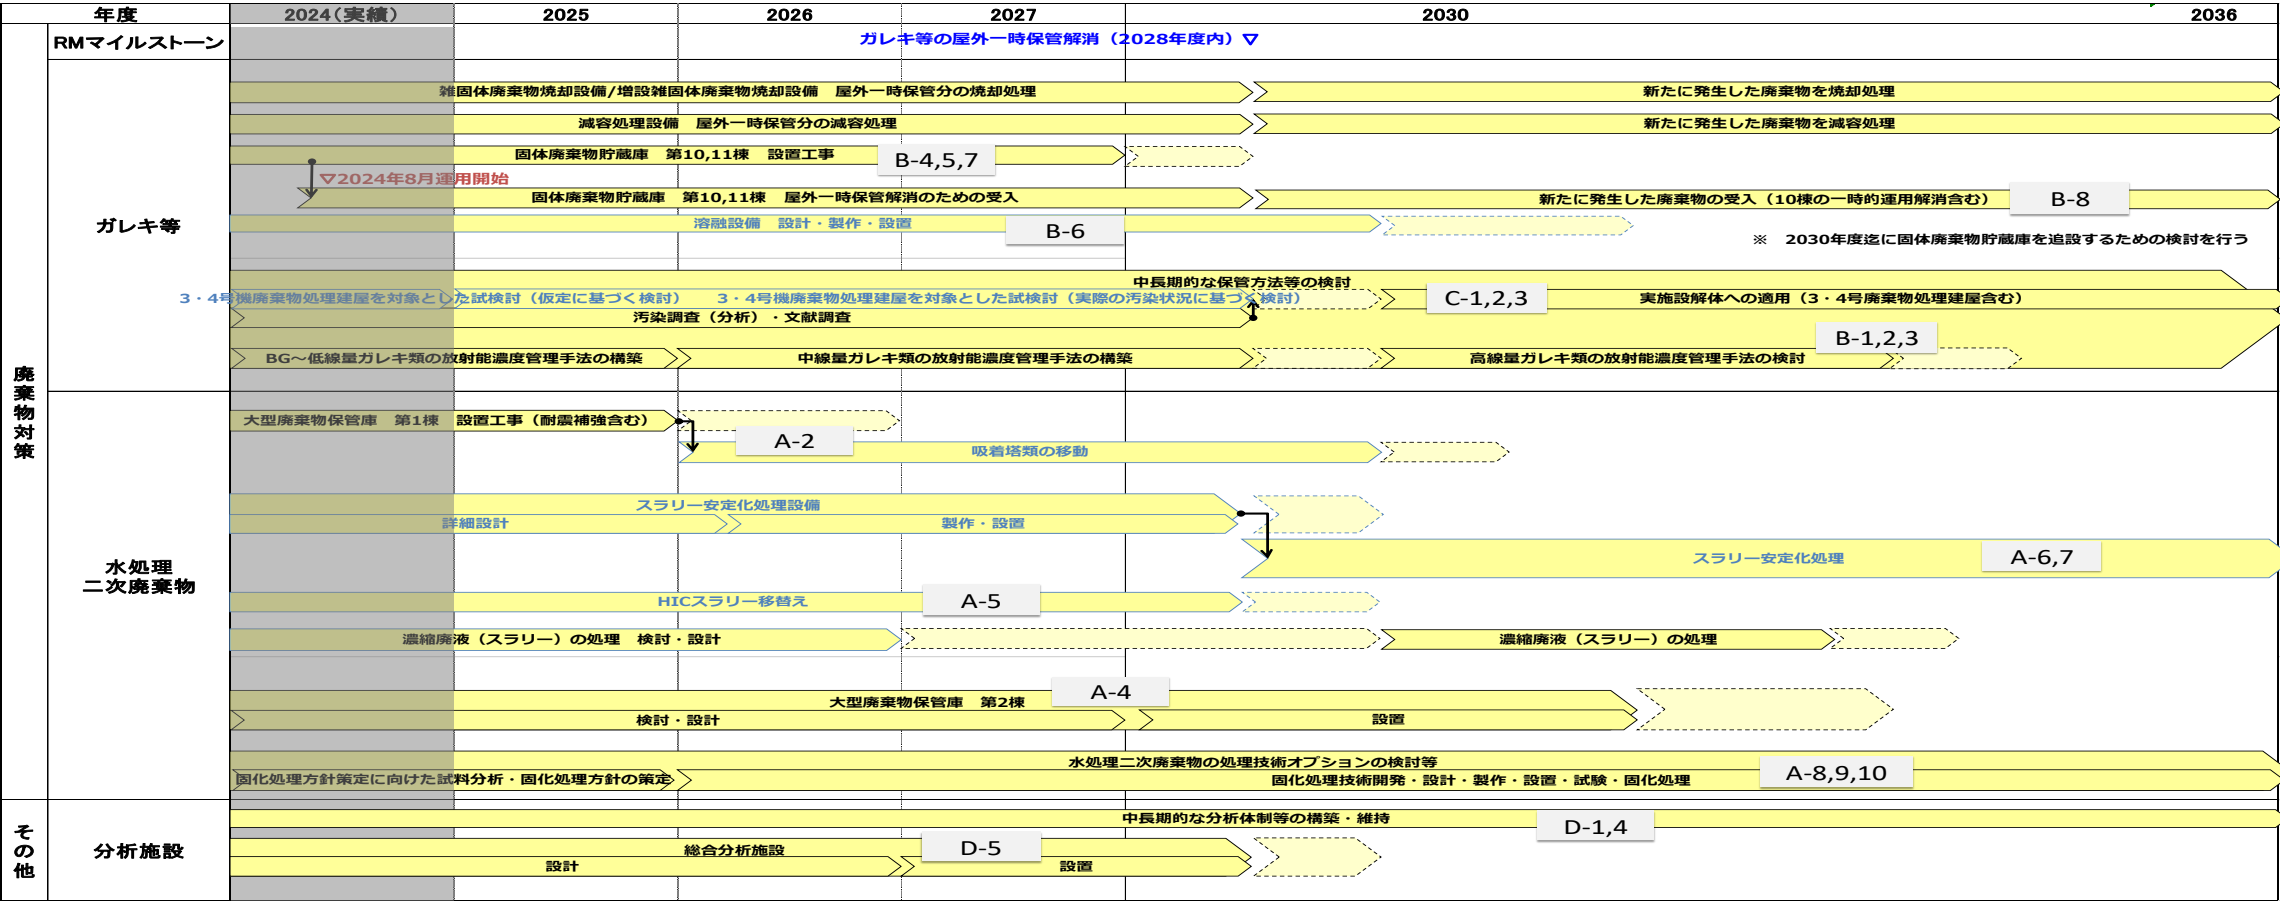

＜凡例＞

作業の期間

変更が見込まれる期間

工程間の関連

追加した工程

変更/具体化した工程

実施を取り止めた工程

リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
