


汚染水対策スケジュール（1/2）

分野 別	汚染水 対策 分野	対象設備・ 作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月						11月						12月			1月		2月		3月		4月		5月以降	備 考			
				1	5	12	19	26		1	2	9	16	23	30		6	13	20		3	10	17	24		7			14	21	28
●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 （実績） ・1～4号機滞留水移送装置運転 （予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業																										（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）	
		【α核種除去設備検討】	設計・工事																										（2027年度工事完了予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）	
		【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討																												
		【滞留水一時貯留設備】	設計・工事																										（2026年度工事完了予定）	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）	
		【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト工費の検討】	容器封入作業 詳細設計・工事																												容器封入作業 実績模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業に係る実施計画変更申請（2025年11月18日認可） 容器封入作業の暫手期間は1年程度の遅れとなる見込みであるが、現在精査中。 集積作業開始（2025年3月26日）
●汚染水発生量を 50～70m3/日程度に 抑制(2028年度末)	浄化設備	【施設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【建設多核種除去設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業																										（継続運転）	処理水及びタンクのインバース状況に応じて適宜運転または処理停止 施設多核種除去設備 前処理設備改造に係る実施計画変更申請（2022年4月28日認可） 使用前検査終了証受領 2024年5月31日 濃縮減量の試験的先行処理実施中 前処理設備改造後のHOT試験を実施中	
		【サブドレン浄化設備】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業																										（継続運転）		
		【地下水バイパス設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業																										（継続運転）		
		【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績） ・処理運転 （予定） ・処理運転	現場作業																										（継続運転）		
		【RO-3】 【建屋内FO 循環設備】 （実績） ・運転 （予定） ・運転	現場作業																										（継続運転）		
	陸側排水壁	（実績） ・維持管理運転 （予定） ・維持管理運転	現場作業																										（継続運転）		
	フェーシング（陸側排水壁内エリア）	【本土屋内フェーシング（全6万㎡）】 ・2号機建屋西側 ・1/2号機東側	現場作業																											2号機建屋西側、1/2号機東側	
	1～4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） ・5箇所の調査実施（2025年度） ・2025年5月 調査開始 ・2025年6月 調査完了	現場作業																											2025年5月1日：2025年度調査開始 2025年6月30日：2025年度調査完了	
	建屋間ギャップ漏れ止水対策	（実績・予定） ・3号機：6箇所(2025年度) 〃	現場作業																											【今年度】 2026年3月：完了予定	2024年7月16日準備工事開始 （2025年度：6箇所/6箇所完了予定）
	●タンク関連	タンク解体	H4エリアNo.5タンクからの漏れ対策	現場作業																										（継続実施）	
タンク解体			【Eエリアフランジタンク解体工事】 （実績） ・解体基盤 48基/49基 ・Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収（スラッジ含む）完了 （予定） ・Eエリアフランジタンク解体工事 （タンク内洗浄・排水）：49基解体予定 →Eエリアフランジタンク（D1）内の残水回収	現場作業																										（2025年度タンク解体完了予定） D1タンク以外に解体完了済み	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について（実施計画変更認可） 2024年7月17日：D2タンク解体完了 2025年1月9日：EエリアD1タンク内のスラッジ回収作業開始 2025年3月21日：タンク内でのスラッジ回収作業開始 2025年11月17日：D1タンク内スラッジ回収完了
			【J8/J9エリアタンク解体工事】 （実績） ・J9エリアタンク解体基盤 12基/12基 （予定） ・J8エリアタンク解体工事	現場作業																											2025年2月3日：実施計画認可 2025年2月14日：解体作業開始 2025年9月3日：J9エリアタンク解体完了 2025年11月20日：J8エリアアウトサービス
			【横置きタンク解体工事】 （実績） ・解体基盤 10基/367基 （予定） ・横置きタンク解体工事	現場作業																											横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 2024年10月10日未使用タンクの搬入実施 2024年11月：未使用タンクから除染解体試験開始 10基/28基 未使用タンク解体完了 2025年2月3日に発生した火災トラブルにより退避作業中断中。（再開時期未定） 6月12日 火災発生原因と対策の方向性について公表。
●自然災害対策	津波対策	〇サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定）ろ過水タンク西側型集水設備工事実施（完了） 地盤改良（完了） 集水設備設置（10基）（完了） 移送設備設置	現場作業																										実施期間延長中	2023年10月20日 サブドレン集水設備及び地下水ドレン設備の津波対策に伴うT.P.33.5m層への移設について（実施計画変更申請）→ 2024年11月1日 変更申請認可 2025年3月17日～19日 使用前検査一部受検完了（高台集水タンク） 2025年6月25日 施設撤去作業完了 8.5m層受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸	

廃炉中長期実行プラン2025

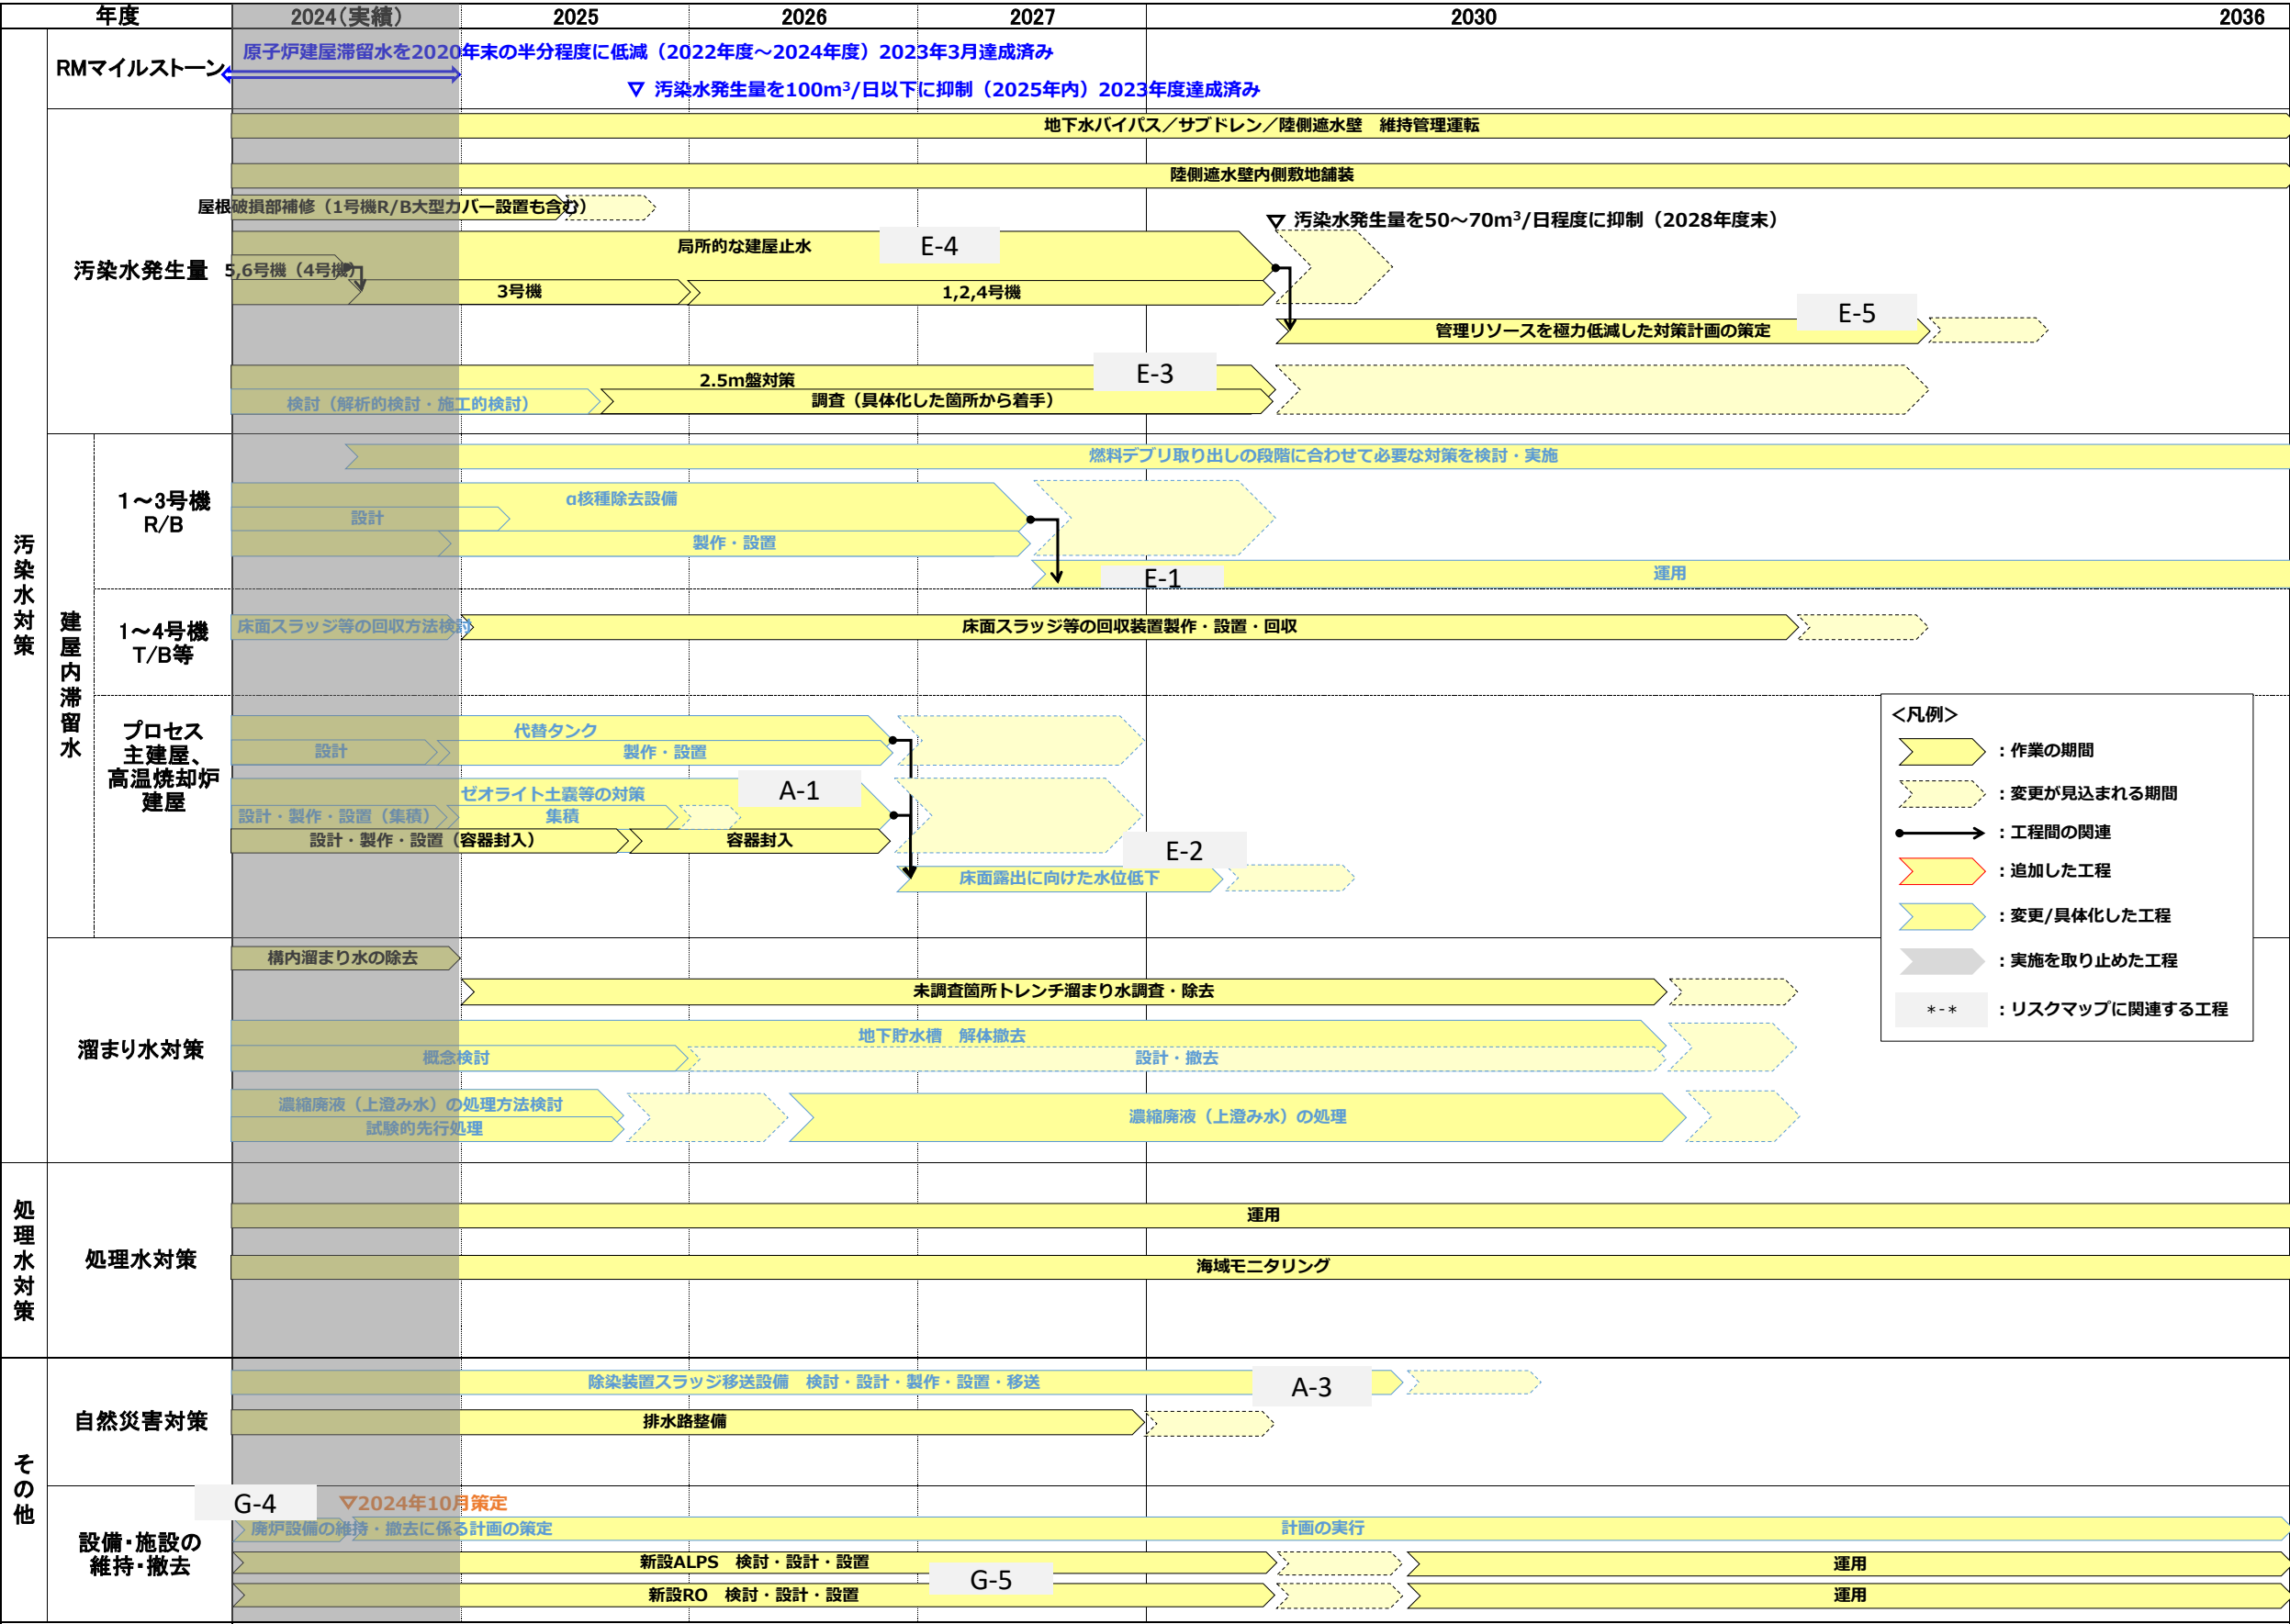

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
