



分野	燃料デブリ取り出し準備	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月										11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月以降	備 考	
					20	27	28	29	30	31	1	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
●初号機の燃料デブリ取り出しの開始 ●取り出し規模の更なる拡大（1/3号機） ●段階的な取り出し規模の拡大（2号機）	原子炉建屋内環境改善	原子炉建屋内の環境改善	1号	(実 績) ○建屋内環境改善（継続） (予 定) ○建屋内環境改善（継続） ○RCW出口ヘッダ配管穿孔・ガスバージ	現場作業																										建屋内環境改善 ・RCW出口ヘッダ配管穿孔（1箇所目）'25/03/06～'25/03/13 ・RCW出口ヘッダ配管穿孔（2箇所目）'25/03/18～'25/03/23 ・RCW出口ヘッダ配管ガスバージ'25/03/28～'25/05/14 ・RCW出口ヘッダ配管機械穿孔'25/05/15 ・RCW出口ヘッダ配管内調査'25/05/16				
			2号	(実 績) なし (予 定) ○建屋内環境改善（継続）	現場作業																											建屋内環境改善 ・R/B大物搬入口2階遮へい設置 '21/11/29～'22/1/10 ・1階西側通路MCC撤去 ・22/1/11～'22/2/25 ・2階北側エリア除染'23/4/10～'23/10/13 ・原子炉系計装配管の線量低減'23/8/30～'23/9/26			
			3号	(実 績) ○建屋内環境改善（継続） (予 定) ○建屋内環境改善（継続） ○圧力抑制室内滞留ガスバージ ○X-6ベネトレーション前室調査 ○パーソナルエアロック室内調査	検討・設計																											建屋内環境改善 ・圧力抑制室内滞留ガスバージ '23/10/25～'24/10/29 ・X-6ベネ前室調査準備作業'24/10/29～'24/11/13 ・X-6ベネ前室調査穿孔作業'24/11/14～'24/12/3 ・X-6ベネ前室の調査'24/12/4～'24/12/26 ・パーソナルエアロック室内調査'25/08/19～'25/09/19			
		格納容器内水循環システムの構築	1号	(実 績) なし (予 定) 圧力抑制室内包水のサンプリング	現場作業																											圧力抑制室内包水のサンプリング ・原子炉冷却材浄化系停止弁開放（モックアップ）'22/11/1～'23/7/4 ・'23/7/18～'23/10/31 ・圧力抑制室底部確認、圧力抑制室内包水サンプリング '23/11/15～'23/11/17 ・PCV (S/C) 水位計設置 '23/12/5～'24/1/18 ・常設監視計器取替 '23/12/8～'24/2/1			
			2号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																														
			3号	(実 績) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水质改善（継続） (予 定) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水质改善（継続）	現場作業	圧力抑制室内滞留ガスバージ															(継続実施)	・PCV (S/C) 水位計設置 '24/2/21～'24/4/24													
		燃料デブリの取り出し	共通		(実 績) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続） (予 定) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続）	検討・設計																											(継続実施)		
																																			(継続実施)
																																			(継続実施)
																																		(継続実施)	
																																		(継続実施)	
																																		(継続実施)	
	1号	(実 績) ○原子炉格納容器内部調査（継続） ○1/2号機SGTS配管撤去（継続） (予 定) ○原子炉格納容器内部調査（継続） ○1/2号機SGTS配管撤去（継続）	現場作業																												OPCV内部調査 PCV内部調査に係る実施計画変更申請('18/7/25) →補正申請('19/1/18) →認可('19/3/1) 【主要工程】 PCV内部気中調査 ・ベテスタル外側 '24/2/28 ・ベテスタル内側 '24/3/14 O1/2号機SGTS配管撤去 1/2号機SGTS配管撤去(その1)に係る実施計画変更申請('21/3/12) → 認可('21/8/26) 【主要工程】 ・1/2号機SGTS配管切断時ダスト飛散対策（ウレタン注入） '21/9/8～'21/9/26 ・1/2号機SGTS配管切断 '22/5/23～'23/5月中旬 ・1/2号機SGTS配管切断（残り分）M/U'23/1/29～'23/3/3 ・1/2号機SGTS配管切断（残り分配管①～⑧）'23/4/18～'23/7/14 ・1/2号機SGTS配管切断（残り分配管⑨）については実施時期調整中。				
			検討・設計	PCV内部調査 ロボットアームの性能確認試験・モックアップ・訓練（国内）																												PCV内部調査に係る実施計画変更申請('18/7/25) →補正申請('20/9/9) 認可('21/2/4) ・試験的取り出し作業（内部調査・デブリ採取）の善手としては2023年度後半目途に実施する計画。 ・PCV内部調査装置投入に向けた作業'20/10/20～ ・X-6ベネ内堆積物調査（接触調査：'20/10/28、3Dスキニング調査：'20/10/30） ・常設監視計器取外し'20/11/10～ ・X-53ベネ調査'21/6/29 ・X-53ベネ孔径拡大作業'21/9/13～'21/10/14 ・隔壁部屋設置作業'21/11/15～'23/4/14 ・ハッチ開放作業'23/6/19～'23/10/13 ・堆積物除去作業'24/1/10～'24/5/13 ・X-6ベネ接続構造・接続管設置'24/5/27～'24/6/26 ・テレスコ式装置設置作業'24/7/19～'24/8/16 ・テレスコ式装置による試験的取り出し'24/9/10～'24/11/7 ・グローブボックス作業'24/11/7～'24/11/8 ・橋外輸送'24/11/12 ・テレスコ式装置による2回目の試験的取り出し'25/4/15～'25/4/23 ・グローブボックス作業'25/4/23～'24 ・橋外輸送'25/4/25			
			現場作業	PCV内部調査 PCV内部調査装置投入に向けた作業																												(時期調整中)			
2号																													(時期調整中)						

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
分野名	鹿炉中長期実行プラン2025 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月	11月					12月			1月			2月			3月			4月			5月以降	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				(実 績) (予 定) ○原子炉格納容器内部調査	現場作業	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					現場作業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

- 凡 例
- ： 検討業務・設計業務・準備作業
 - ： 現場作業予定
 - ： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合
 - ： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
 - ： 工程調整中のもの

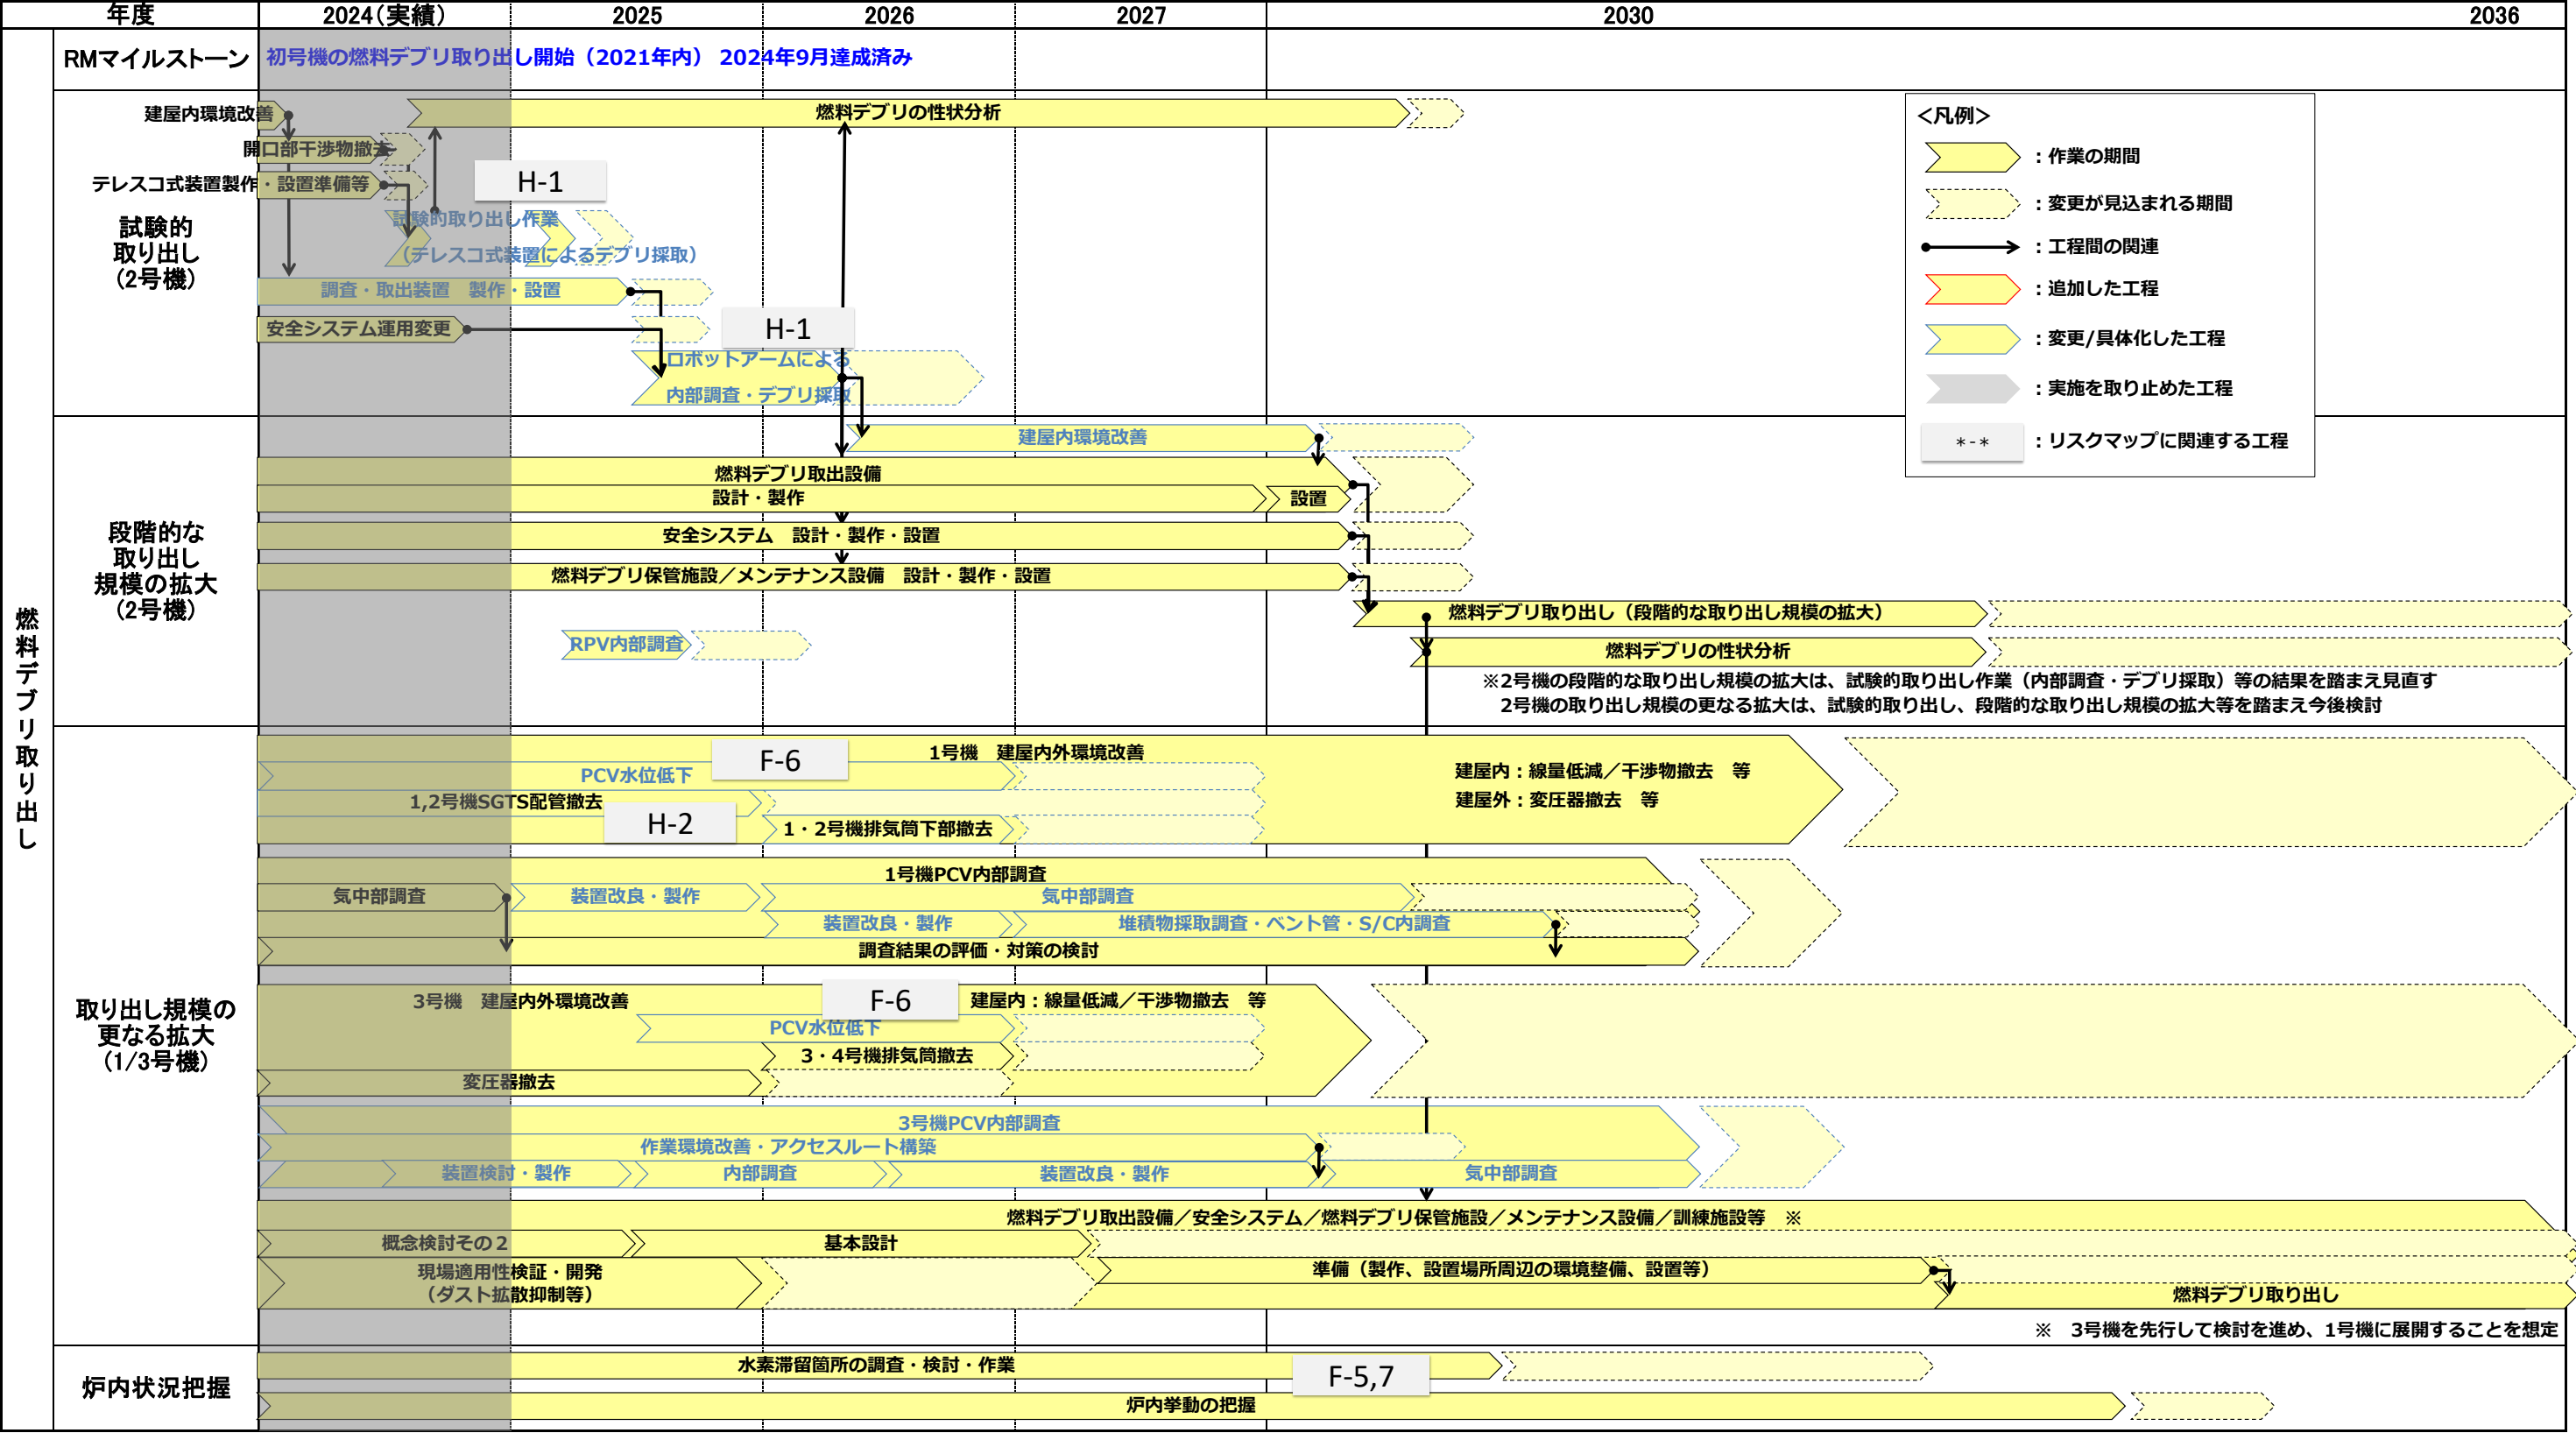

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更/具体化した工程
- 実施を取り止めた工程
- *** : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
