


放射性廃棄物処理・処分 スケジュール

分野名	概略	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月以降			備考
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
●ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）	1. 保管適正化の推進	雑固体廃棄物焼却設備	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>処理運転 (A・B系)</li> <li>機電設備点検 (A・B・共通系)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>処理運転 (A・B系)</li> <li>機電設備点検 (A・B・共通系)</li> <li>焼却炉内清掃 (A系)</li> </ul>	<p>【A系】</p> <p>機電設備点検</p> <p>【B系】</p> <p>機電設備点検</p> <p>【共通系】</p>	<p>処理運転</p> <p>機電設備点検</p>	<p>処理運転</p> <p>機電設備点検</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<p>機電設備点検</p> <p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A系は12月19日から機電設備点検により停止、4月3日より処理運転再開</li> <li>B系は2月7日から機電設備点検により停止、4月10日より処理運転再開</li> <li>共通の機電設備点検は3月27日に完了</li> <li>6月中旬よりA系の機電設備点検を予定</li> <li>10月中旬よりA系の炉内清掃を予定</li> <li>6月下旬よりB系の機電設備点検を予定</li> <li>6月下旬より共通系の機電設備点検を予定</li> </ul>		
		増設雑固体廃棄物焼却設備	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機械・電気・計装設備点検</li> <li>復旧工事</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機械・電気・計装設備点検</li> <li>復旧工事</li> <li>再発防止対策工事</li> </ul>	<p>機械・電気・計装設備点検</p> <p>復旧工事</p> <p>再発防止対策工事</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>機械・電気・計装設備点検を実施中</li> <li>施設の復旧工事を2025年3月より開始</li> <li>機械・電気設備の更新工事及び廃棄物貯留ピットコンクリート健全性調査結果を踏まえた同所所の補修は、2026年4月に完了</li> <li>その後の再発防止対策工事を踏まえ、運転再開は2026年8月を予定</li> <li>2026年3月末より再発防止対策工事(ピット容量低減、監視設備、散水設備等)を実施中</li> </ul>	
		減容処理設備	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>処理運転</li> <li>機械設備点検</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>処理運転</li> <li>機械設備点検</li> <li>電源二重化工事</li> </ul>	<p>処理運転</p> <p>機械設備点検</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026年4月13日～24日 機械設備点検のため処理運転停止予定。</li> <li>2026年7月 電源二重化工事のため処理運転停止予定。(工程調整中)</li> </ul>	
		除染装置 (AREVA) スラッシュ	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スラッシュ対処方法検討</li> <li>建屋内線量低減</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スラッシュ対処方法検討</li> <li>建屋内線量低減</li> </ul>	<p>スラッシュ対処方法検討</p> <p>建屋内線量低減</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃スラッシュ回収施設の耐震評価を実施中。また、具体的な設備の製造・据付に向けた検討・設計業務を引き続き実施中。</li> <li>プロセス主建屋内の線量低減を実施中</li> <li>津波による廃スラッシュ流出リスク低減を目的としたプロセス主建屋内の貯槽D開口部閉止作業は2026年3月16日に完了。</li> </ul>	
		固体廃棄物貯蔵庫第11棟	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> <li>準備工事 (山留・掘削工事)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> <li>準備工事 (山留・掘削工事)</li> <li>建屋工事</li> </ul>	<p>設計検討</p> <p>準備工事 (山留・掘削工事)</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2025年8月8日 実施計画変更申請</li> <li>2025年10月6日 準備工事 (山留・掘削工事) 着手</li> </ul>	
●水処理二次廃棄物	2. 保管適正化の推進のための設備設置	大型廃棄物保管庫第一棟	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> <li>建屋補強工事</li> <li>機電設備設置工事</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> <li>機電設備設置工事</li> <li>吸着塔架台据付</li> </ul>	<p>設計検討 (吸着塔架台)</p> <p>建屋補強工事 (準備工事、地盤改良含む)</p> <p>機電設備設置工事</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2024年7月19日 実施計画変更認可 (建屋補強)</li> <li>2025年10月31日 実施計画変更申請 (使用済吸着塔架台の設置)</li> </ul>		
		大型廃棄物保管庫第二棟	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計検討</li> </ul>	<p>設計検討 (建屋、機電)</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計実施中、2027年度実施計画申請・着工、2031～2032年度運用開始を目標とする</li> </ul>		
		スラリー安定化処理設備	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安定化処理設備の設計方針検討</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安定化処理設備の詳細設計検討</li> <li>現地工事</li> </ul>	<p>安定化処理設備の設計検討</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<p>最新工程反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建屋の構造強度が成立する機器配置と建屋形状の見直しに時間を要したことや建屋設計が他の階層B+クラスの実績を踏まえると、想定よりも時間を要することが確認されたため、工程の見直しを行った。</li> <li>現地工事 (2030年度以降完了予定)</li> </ul>	

分野名	目標工程	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	3月		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月以降			備考		
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		下	
●放射能濃度の評価と管理	3. 固体廃棄物の性状把握	(実績) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析  (予定) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析	核種・設計																							(採取継続)  (分析継続)  (分析継続)	・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中 ・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている リスト：https://clads.jaea.go.jp/rd/tech-info.html 様条：https://frandl-db.jaea.go.jp/FRANDL/		
			現場作業	計画に基づいたサンプリングの実施																									
			現場作業	汚染水分析・水処理二次廃棄物分析																									
			現場作業	瓦礫類分析																									
●分析施設	4. 分析・研究施設の設置	(実績) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)  (予定) ・放射性物質を用いた分析作業 (分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)	現場作業																							(分析継続)			
			現場作業	設置工事																									
			核種・設計	設計検討(基本設計)																									
		総合分析施設(廃棄物分析)	(実績/予定) ・設計検討(基本設計)																							(設置工事継続)	・2020年5月20日 実施計画変更認可申請 ・2024年12月11日 実施計画一部補正提出 ・2024年12月18日 実施計画変更認可 ・2025年3月25日 事前了解 ・2025年8月8日 実施計画変更認可申請(仕様変更) ・2026年4月9日 実施計画変更認可		

廃炉中長期実行プラン2026

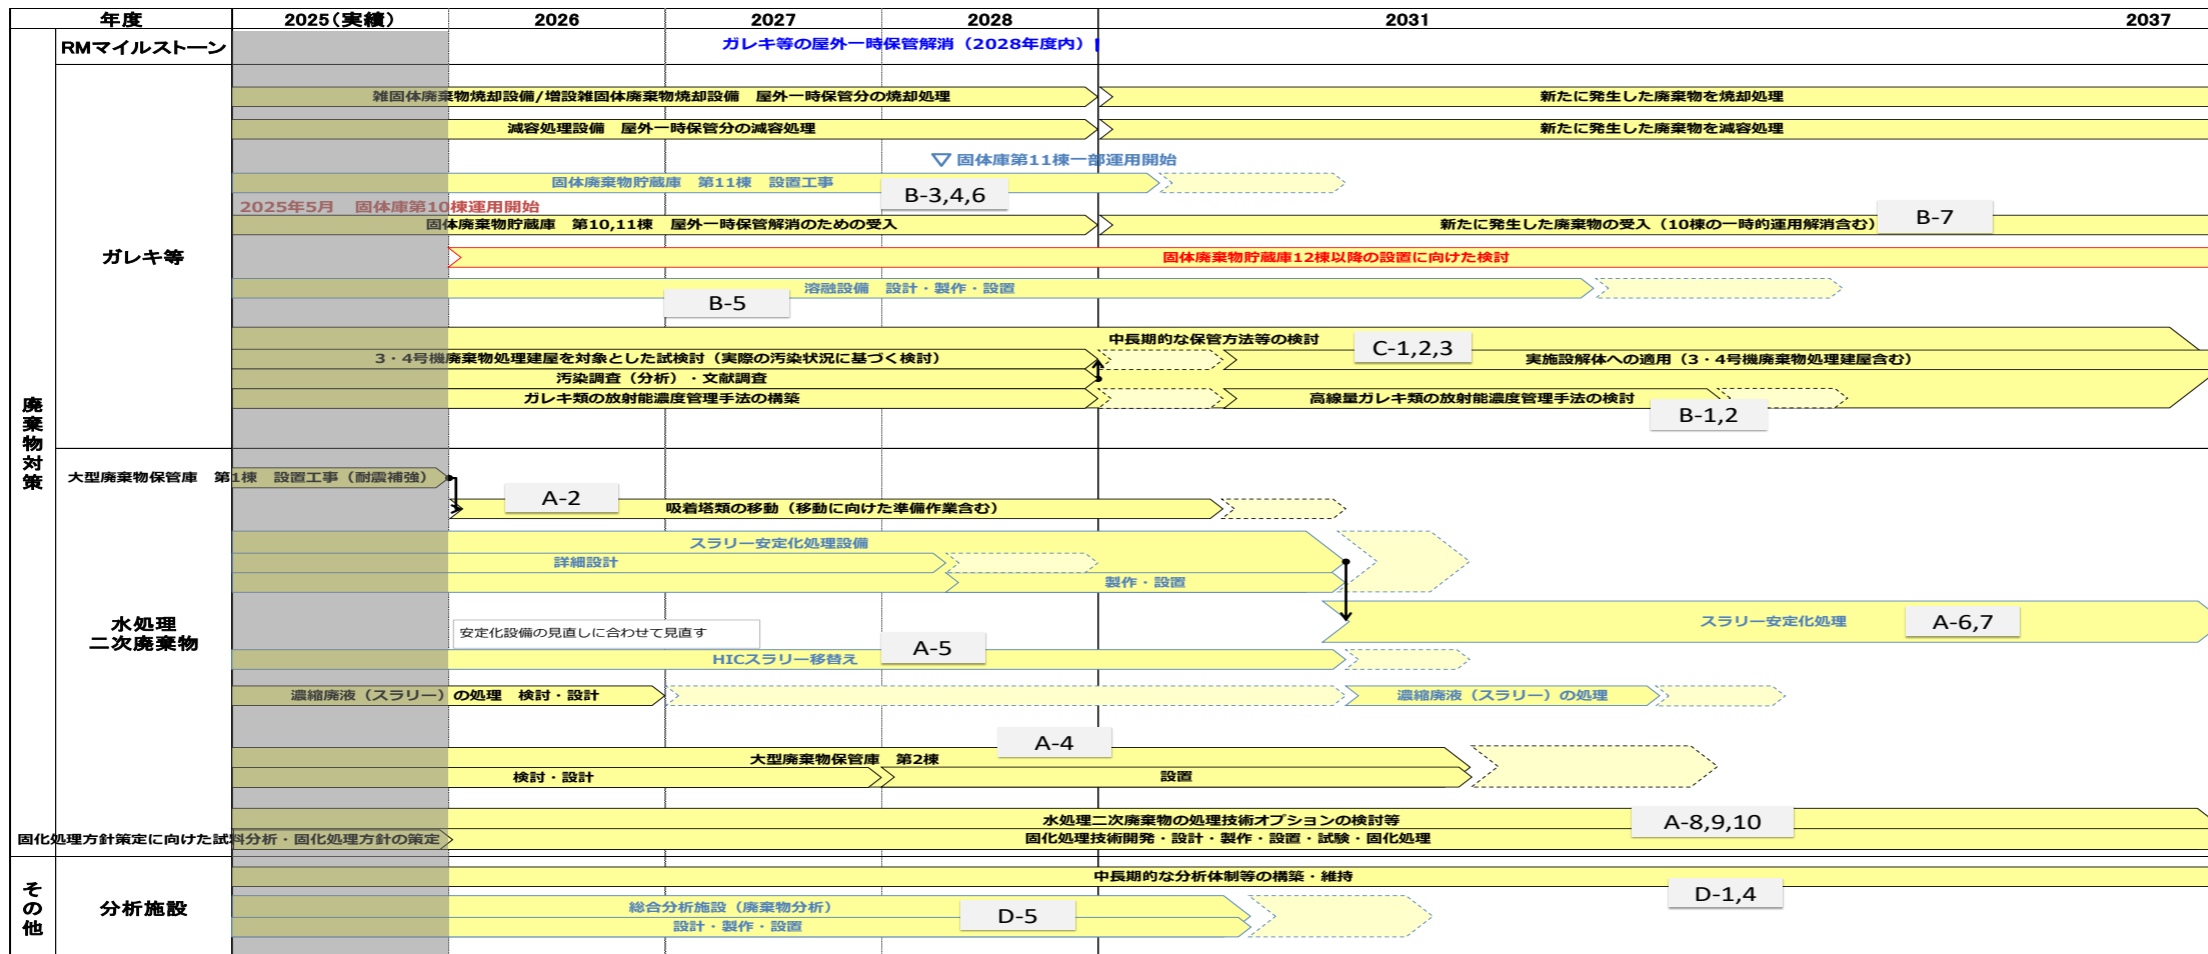

<凡例>

- 黄色の矢印：作業の期間
- 点線の矢印：変更が見込まれる期間
- 黒い矢印：工程間の関連
- 赤い矢印：追加した工程
- 緑色の矢印：変更/具体化した工程
- 灰色の矢印：実施を取り止めた工程
- \*\*\*：リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
