


# 福島第一原子力発電所 取水電源ケーブルトレンチの調査実施について


< 参考資料 >  
平成25年7月17日  
東京電力株式会社

## 【1・2号機取水口間の護岸地盤改良工事の進捗状況】

- 7月8日より地盤改良を開始し、現在、8班の地盤改良機により実施中  
(作業時間：19時～翌7時)
- 7月17日朝の段階で、海側38本完了（海側117本、山側114本：合計231本予定）
- 今後、準備が整い次第、地盤改良機を10班に増強する予定

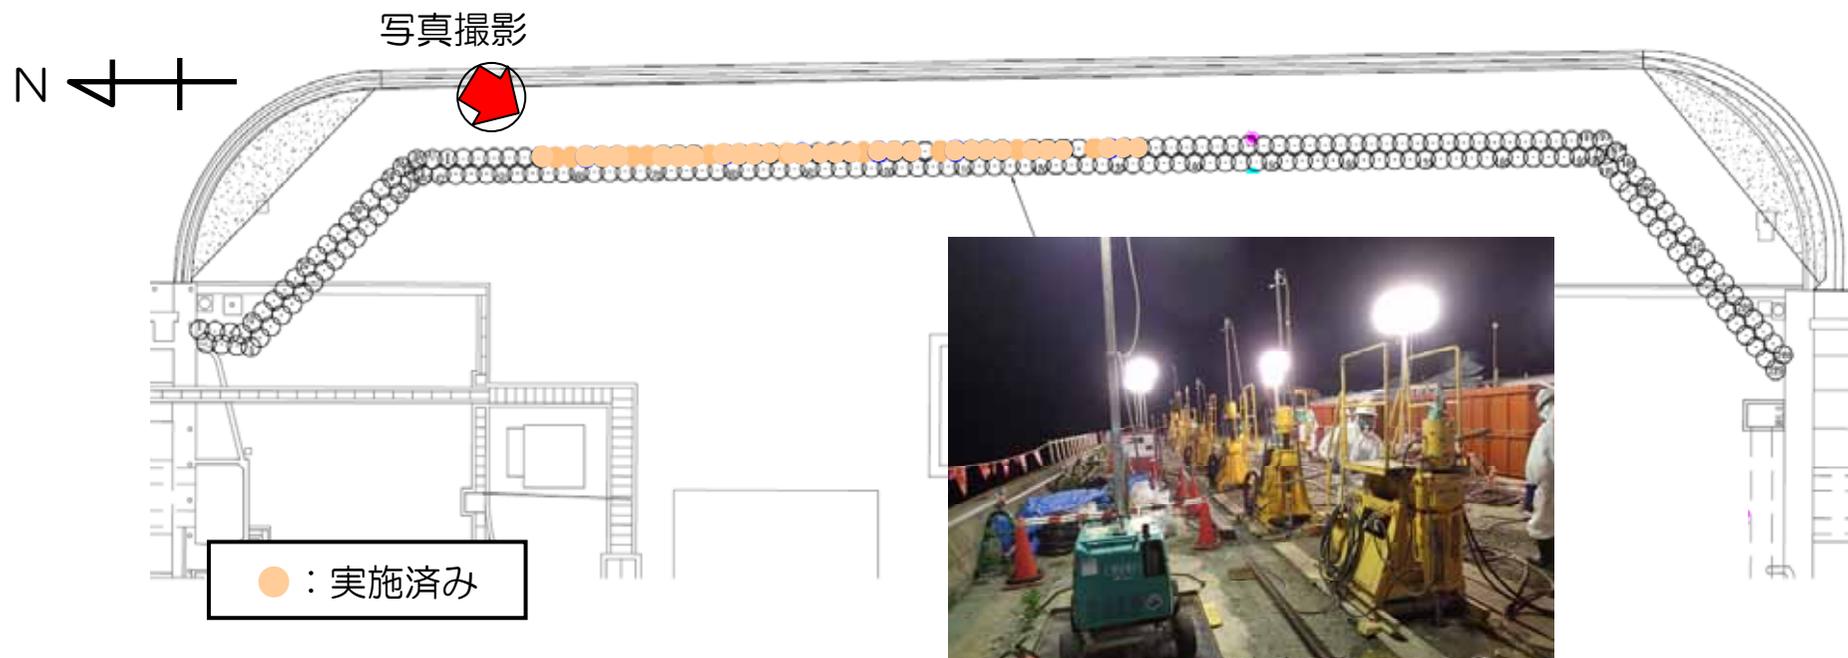

# 【取水電源ケーブルトレンチの調査実施】

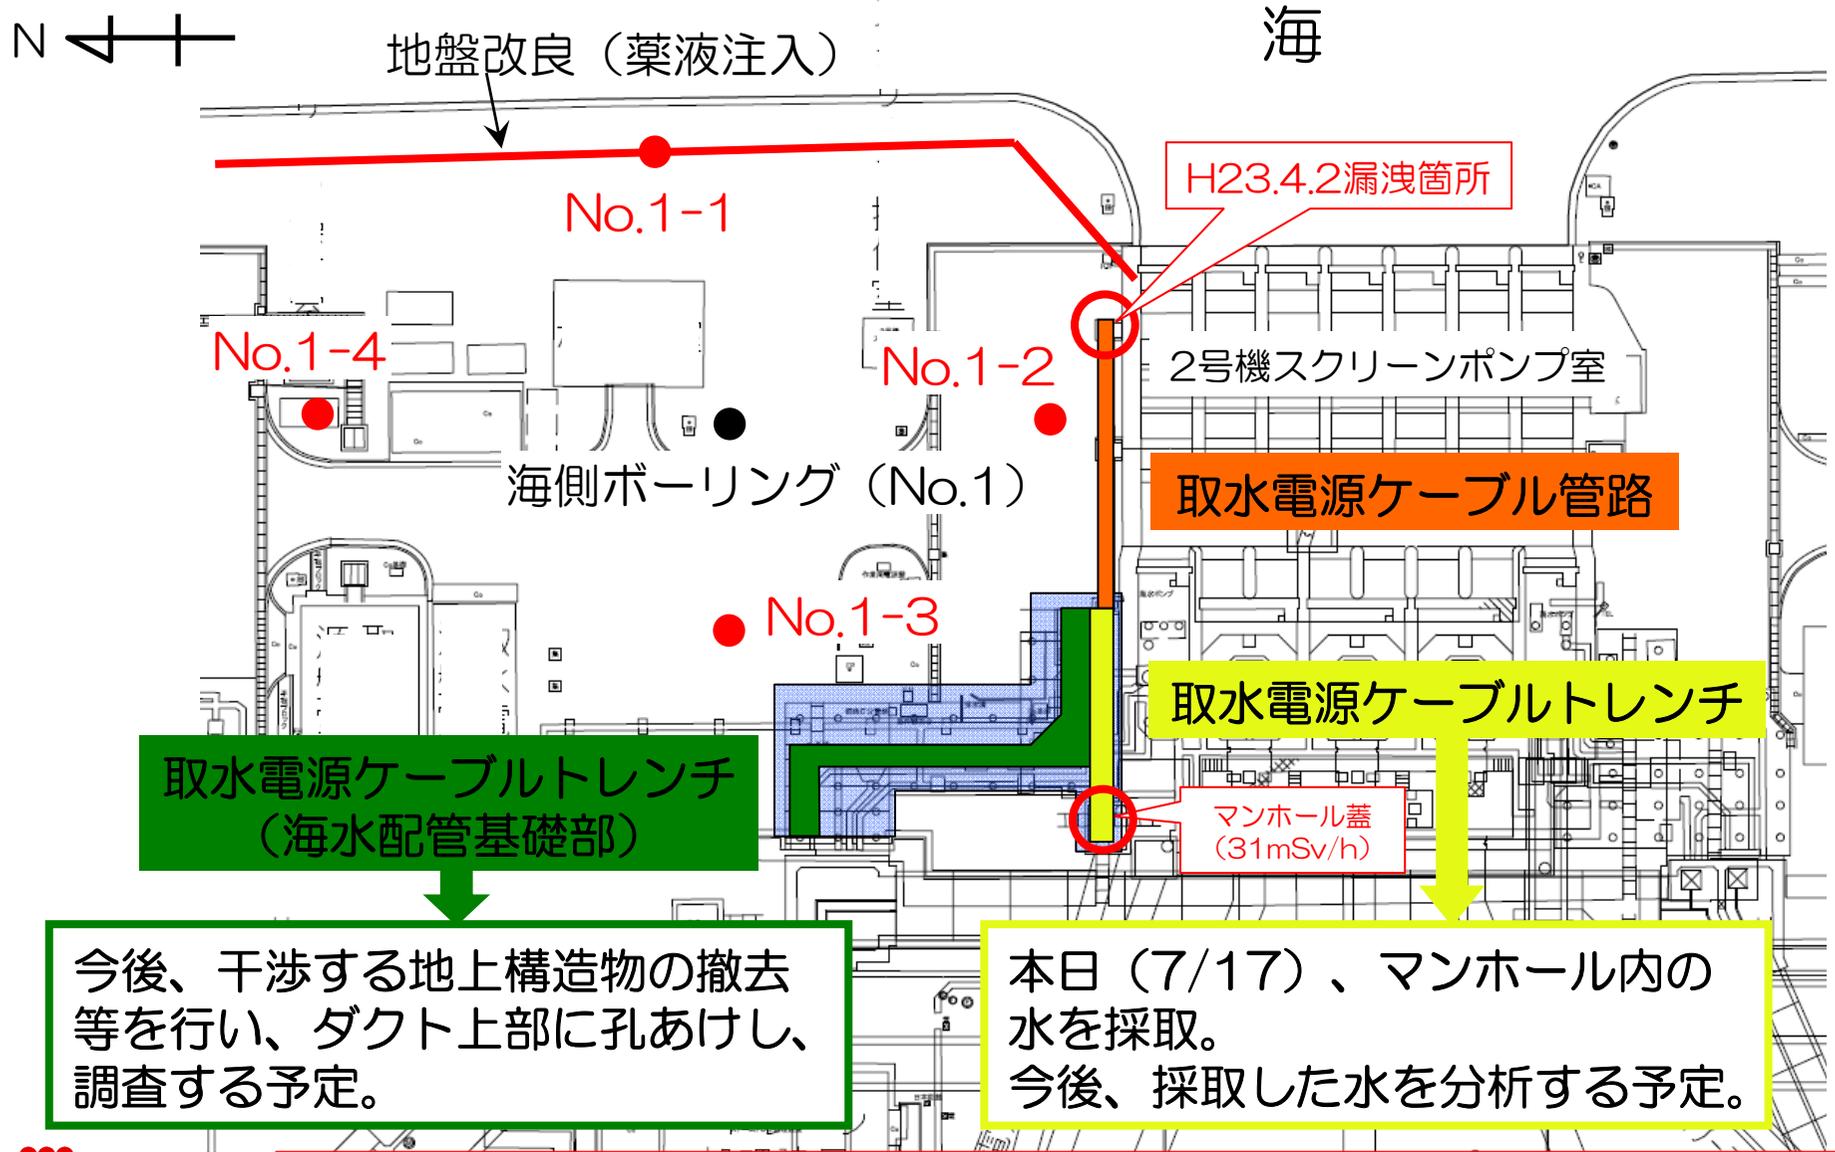

今後、干渉する地上構造物の撤去等を行い、ダクト上部に孔あけし、調査する予定。

本日 (7/17)、マンホール内の水を採取。今後、採取した水を分析する予定。
