


原子炉建屋内への格納容器ガス管理システム配管設置作業の実施

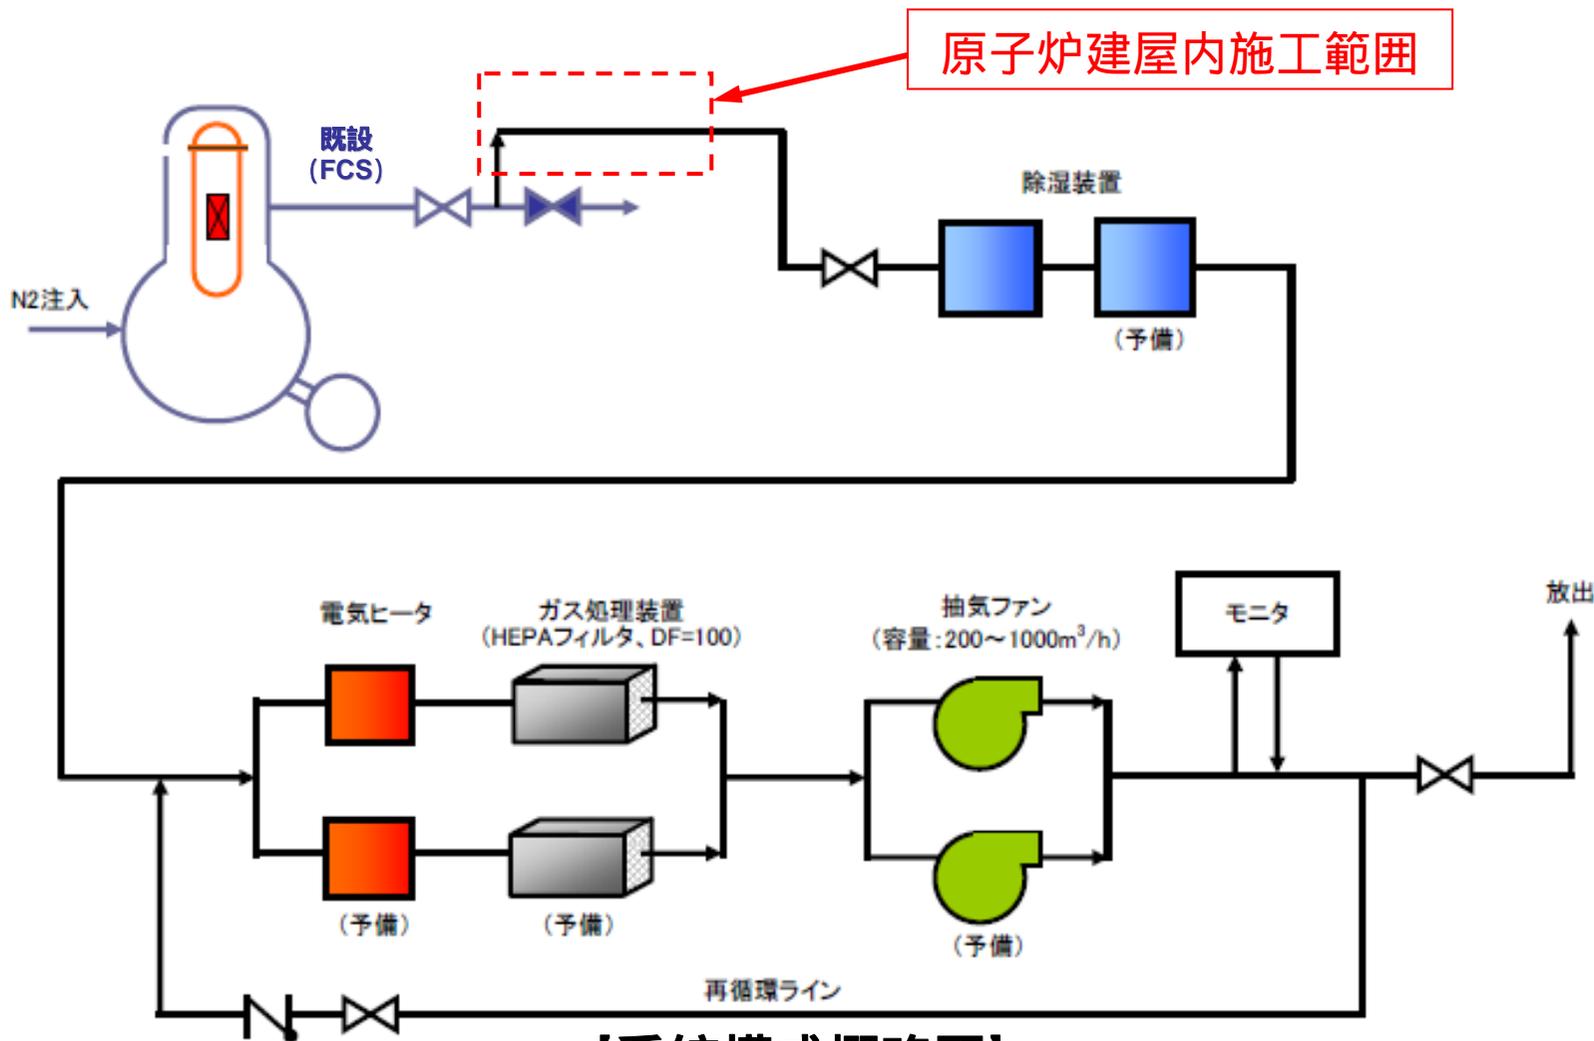

【系統構成概略図】

作業内容について

遠隔操作の無人荷揚台車にて、グレーチング架台までホース・ヘッダ等を運搬。格納容器ハッチ前の高線量エリアへのアクセスを避け、ホースの空中敷設により遮へい距離を確保する。

原子炉建屋北東部にワイヤ巻取り用のウィンチとウィンチ固定用の仮設架台を設置。
本設グレーチング架台にワイヤ端を固定。
可燃性ガス濃度制御系（FCS）テストタップに仮設ライン（ヘッダ、ホース等）を接続。
ウィンチでワイヤを巻き取り、ワイヤに吊るしてあるホースの自重を受ける。

