

福島第一原子力発電所 港湾内海底土被覆工事の状況





< 参考資料 >
平成24年 5月16日
東京電力株式会社

〔 1 ~ 4号機側被覆作業 〕

3月14日 1層目被覆作業開始
3月29日 1層目被覆作業完了
4月5日 2層目被覆作業開始
5月11日 2層目被覆作業完了

〔 5 , 6号機側被覆作業 〕

5月16日 シルトフェンス設置完了
5月17日 被覆作業開始予定
6月末 被覆作業完了予定

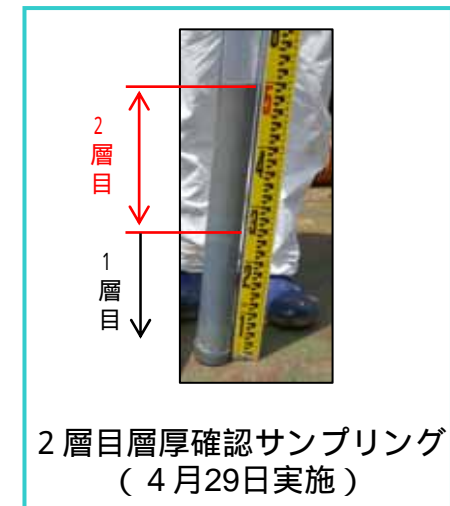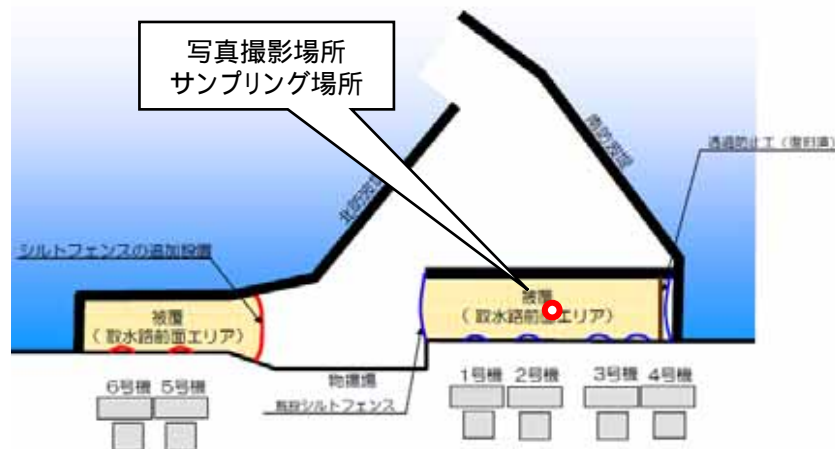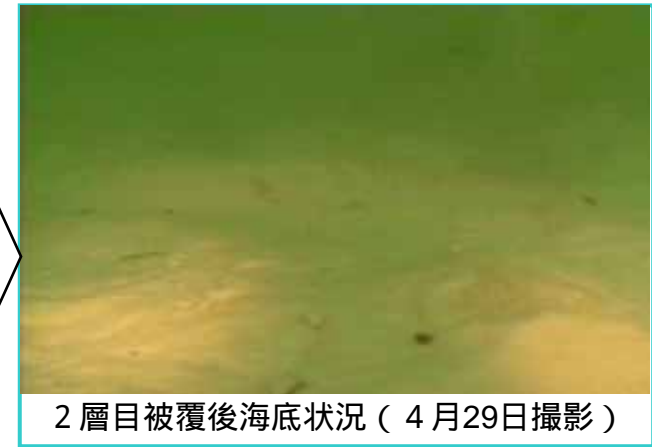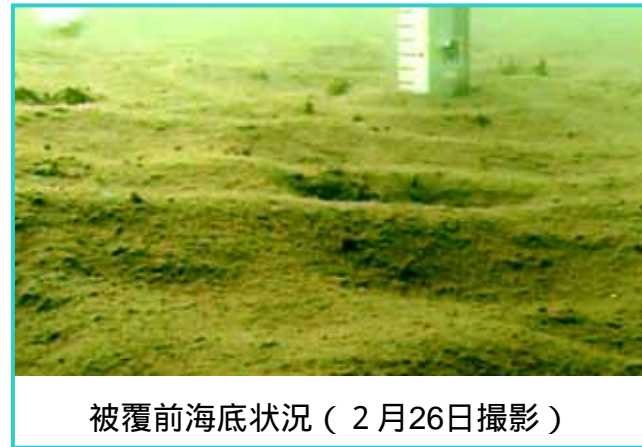

1層目は確実に海底面を覆っていることを確認
2層目は確実に1層目を覆い、所要の層厚が確保されていることを確認
