


福島第一原子力発電所 ゼオライト土嚢等集積作業の進捗状況

＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 2 5 年 1 0 月 9 日
東 京 電 力 ホールディングス株 式 会 社
福 島 第 一 廃 炉 推 進 カ ン パ ニ ー

- 高温焼却炉建屋のゼオライト土嚢等集積作業に向け、8月29日から同建屋地下階の干渉物移動作業を実施してきました。破損したロッカーと作業足場の他、事前に20個程度の軽量の干渉物があることを確認しており、このうち14個の移動を10月3日までに完了しています。
- 残る軽量の干渉物はゼオライト等に埋もれており、視認性が悪く、容易に移動できないことを確認しました。そのため、今後のゼオライト土嚢等の集積作業の中で、周辺の視認性を確保のうえ干渉物も移動していくこととしました。これらの作業のモックアップ訓練を実施し、準備を進めてまいります。
- なお、現場は高線量かつ暗くて狭い、厳しい環境下であるため、モックアップ訓練を含め、干渉物移動および今後の集積作業の知見を回収作業等に反映していくなど、現場の状況に柔軟に対応しつつ、「安全最優先」で着実に作業を進めてまいります。

: ゼオライト土嚢の列
 : 残っている干渉物（破損したロッカー、ダクト、蛍光灯カバー等）
 : ゼオライト土嚢の列（概ね集積完了）
 : 干渉物（移動済）

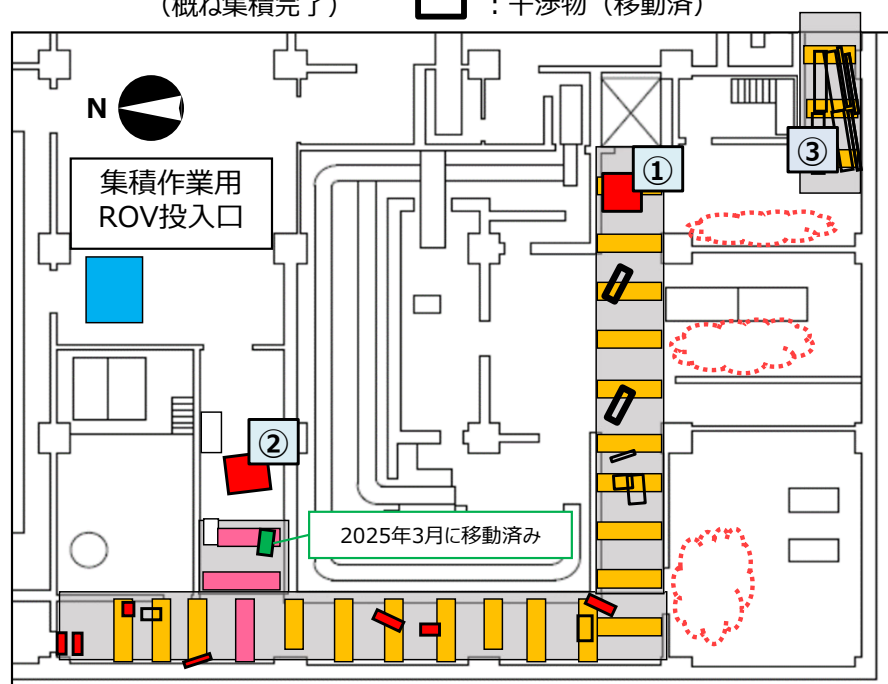


HTI B2F

: 作業エリア

: 干渉物移動先



①作業階段（同様の型を撮影）
上部からフックを引っ掛けて、集積作業開始前に紐で吊り上げる予定

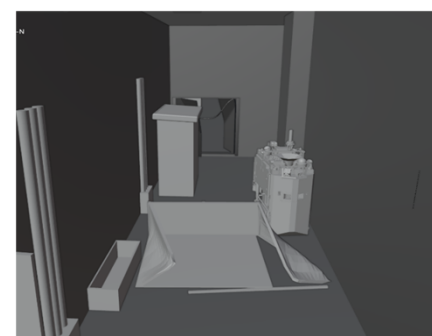

②破損したロッカー
水位の調整により上下方向での回避予定



③SROVで干渉物をつかむ様子（足場材）

