



地下水位の挙動について（1-2号機間：10月5日～11月5日）

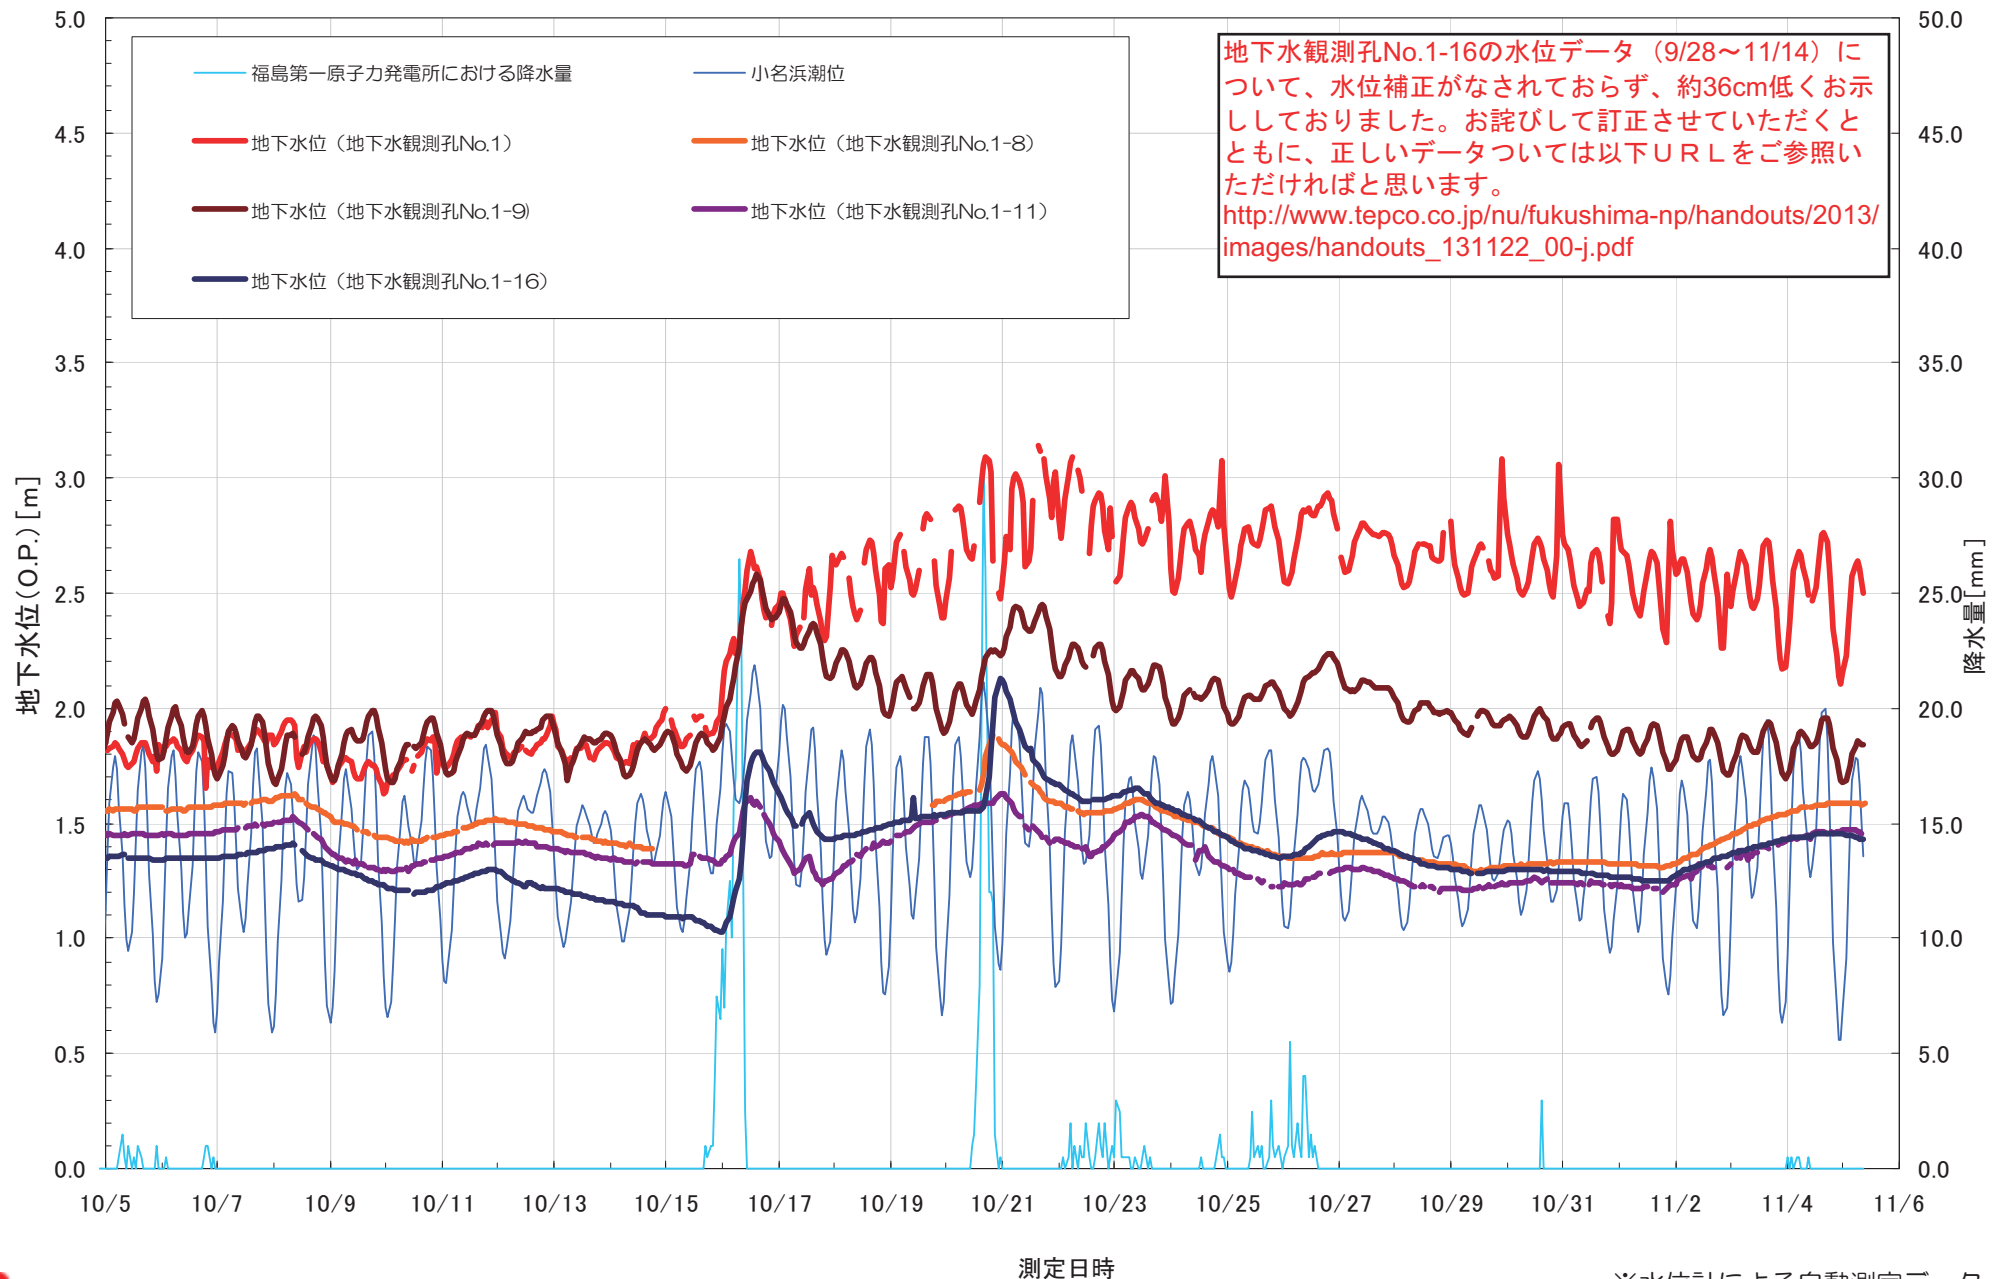


1-2号機間地盤改良工事の進捗状況（11月6日朝時点）

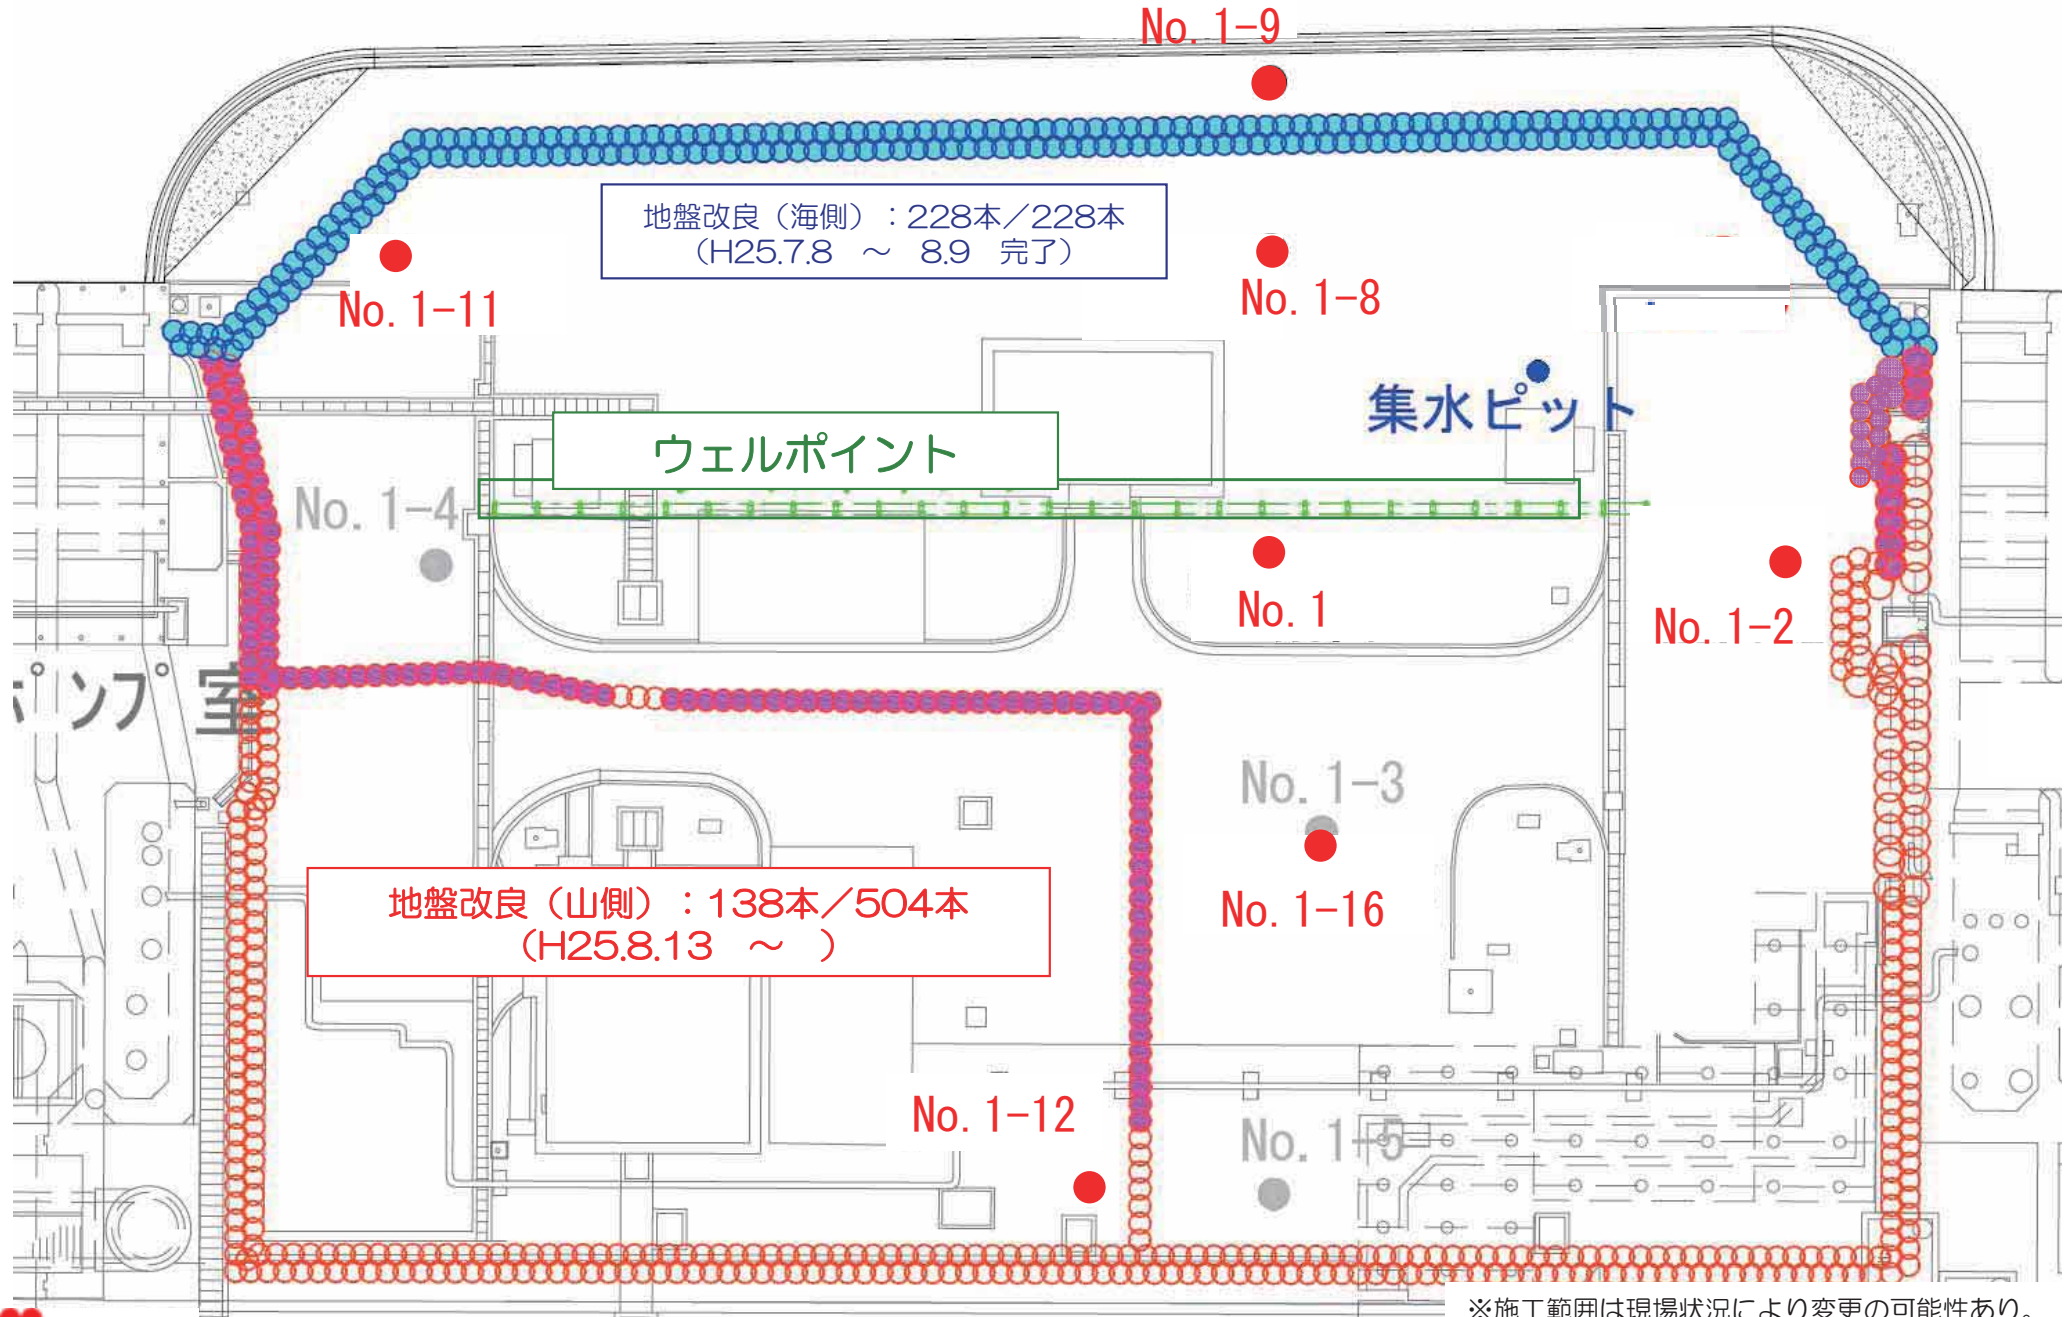


※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。

地下水位の挙動（2-3号機間：10月5日～11月5日）

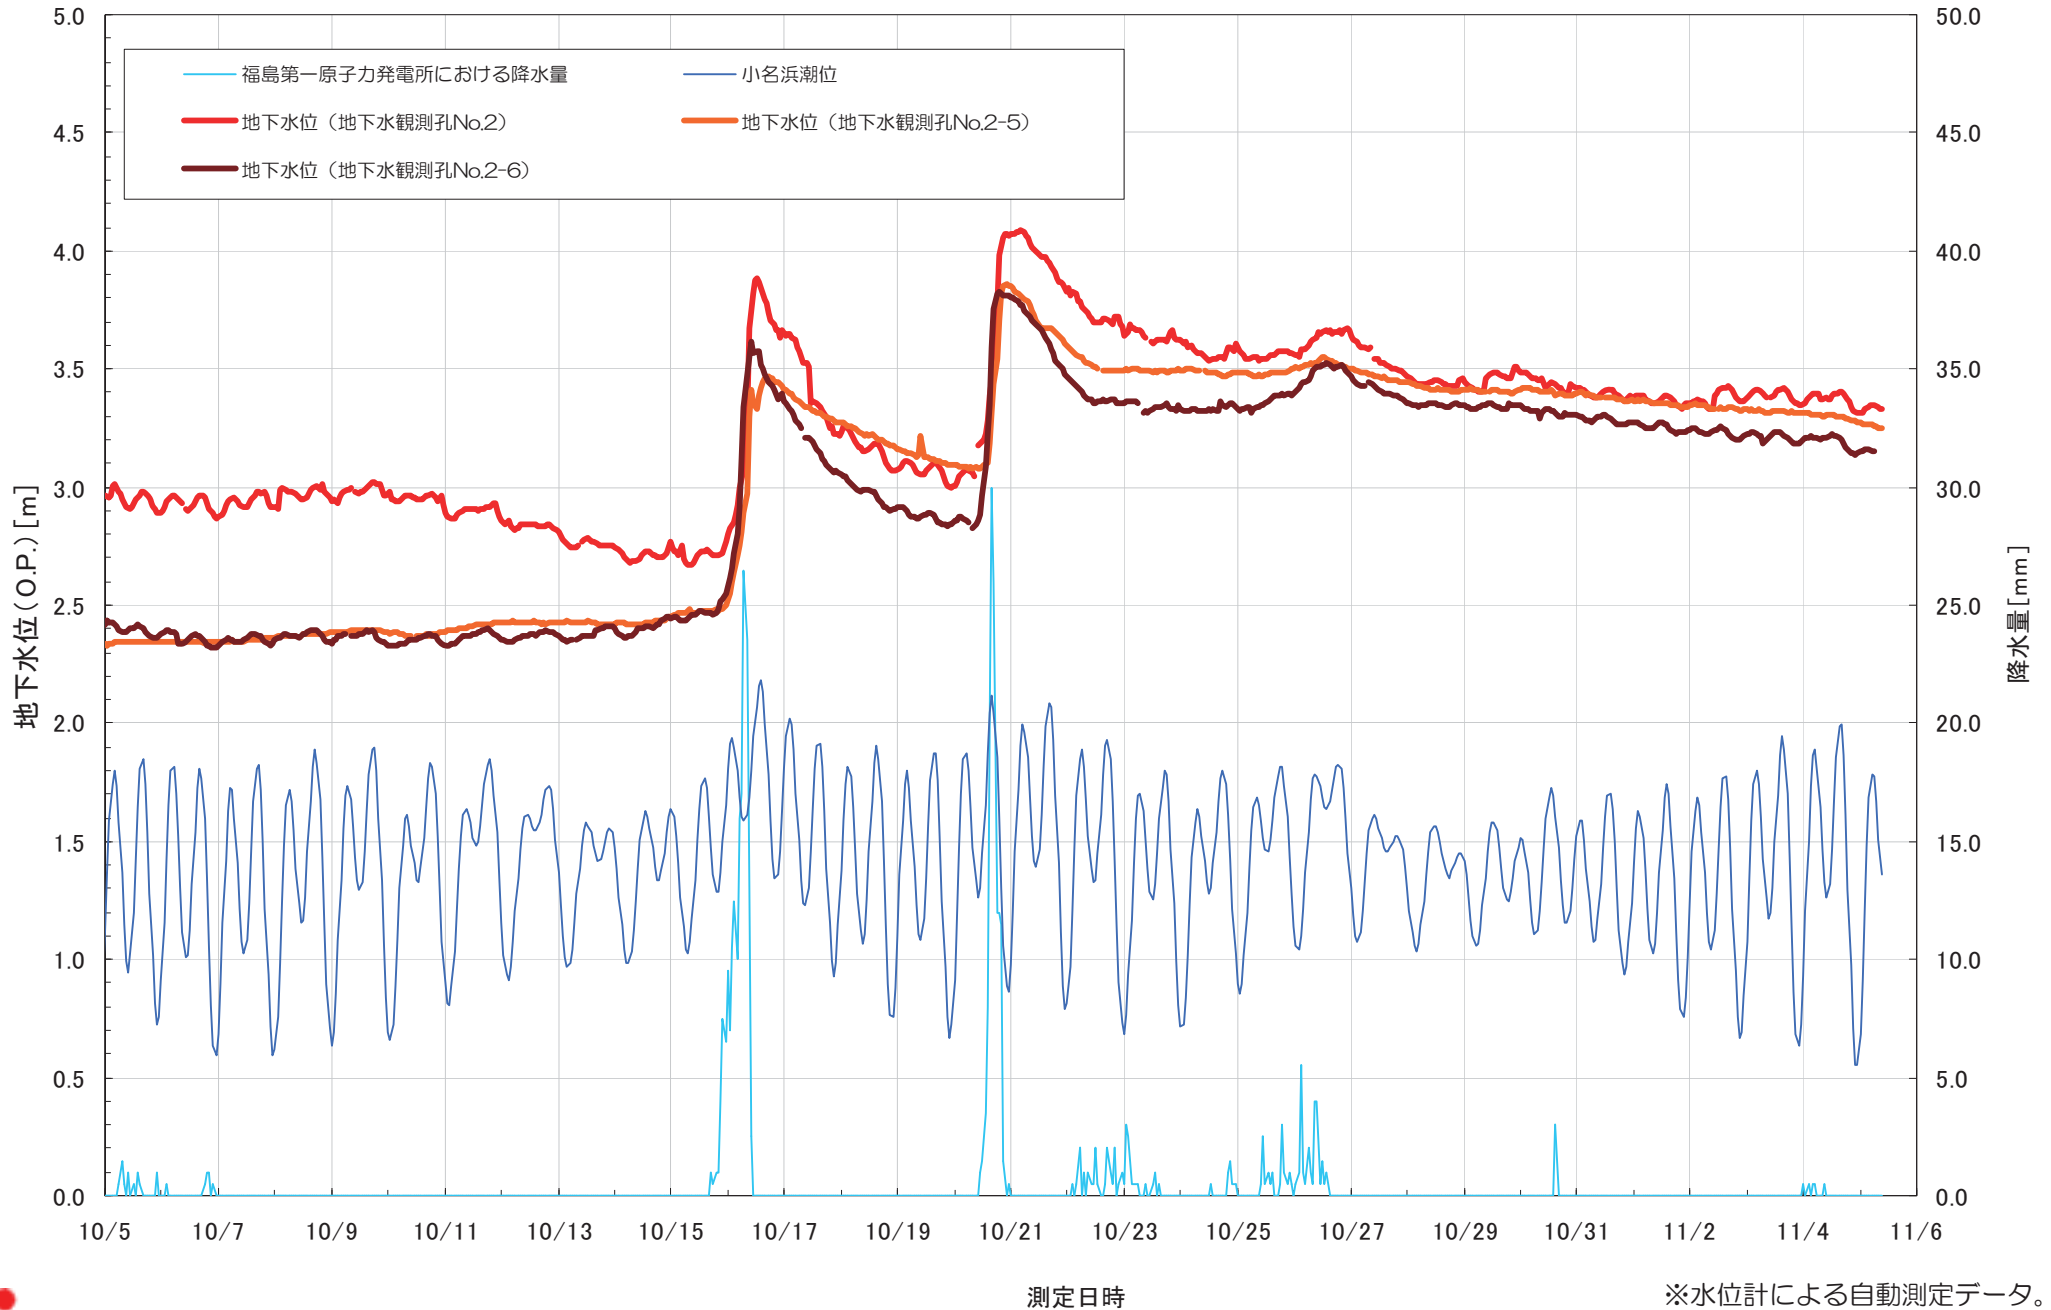


2-3号機間地盤改良工事の進捗状況（11月6日朝時点）

地盤改良（海側）：203本／249本
(H25.8.29 ~)

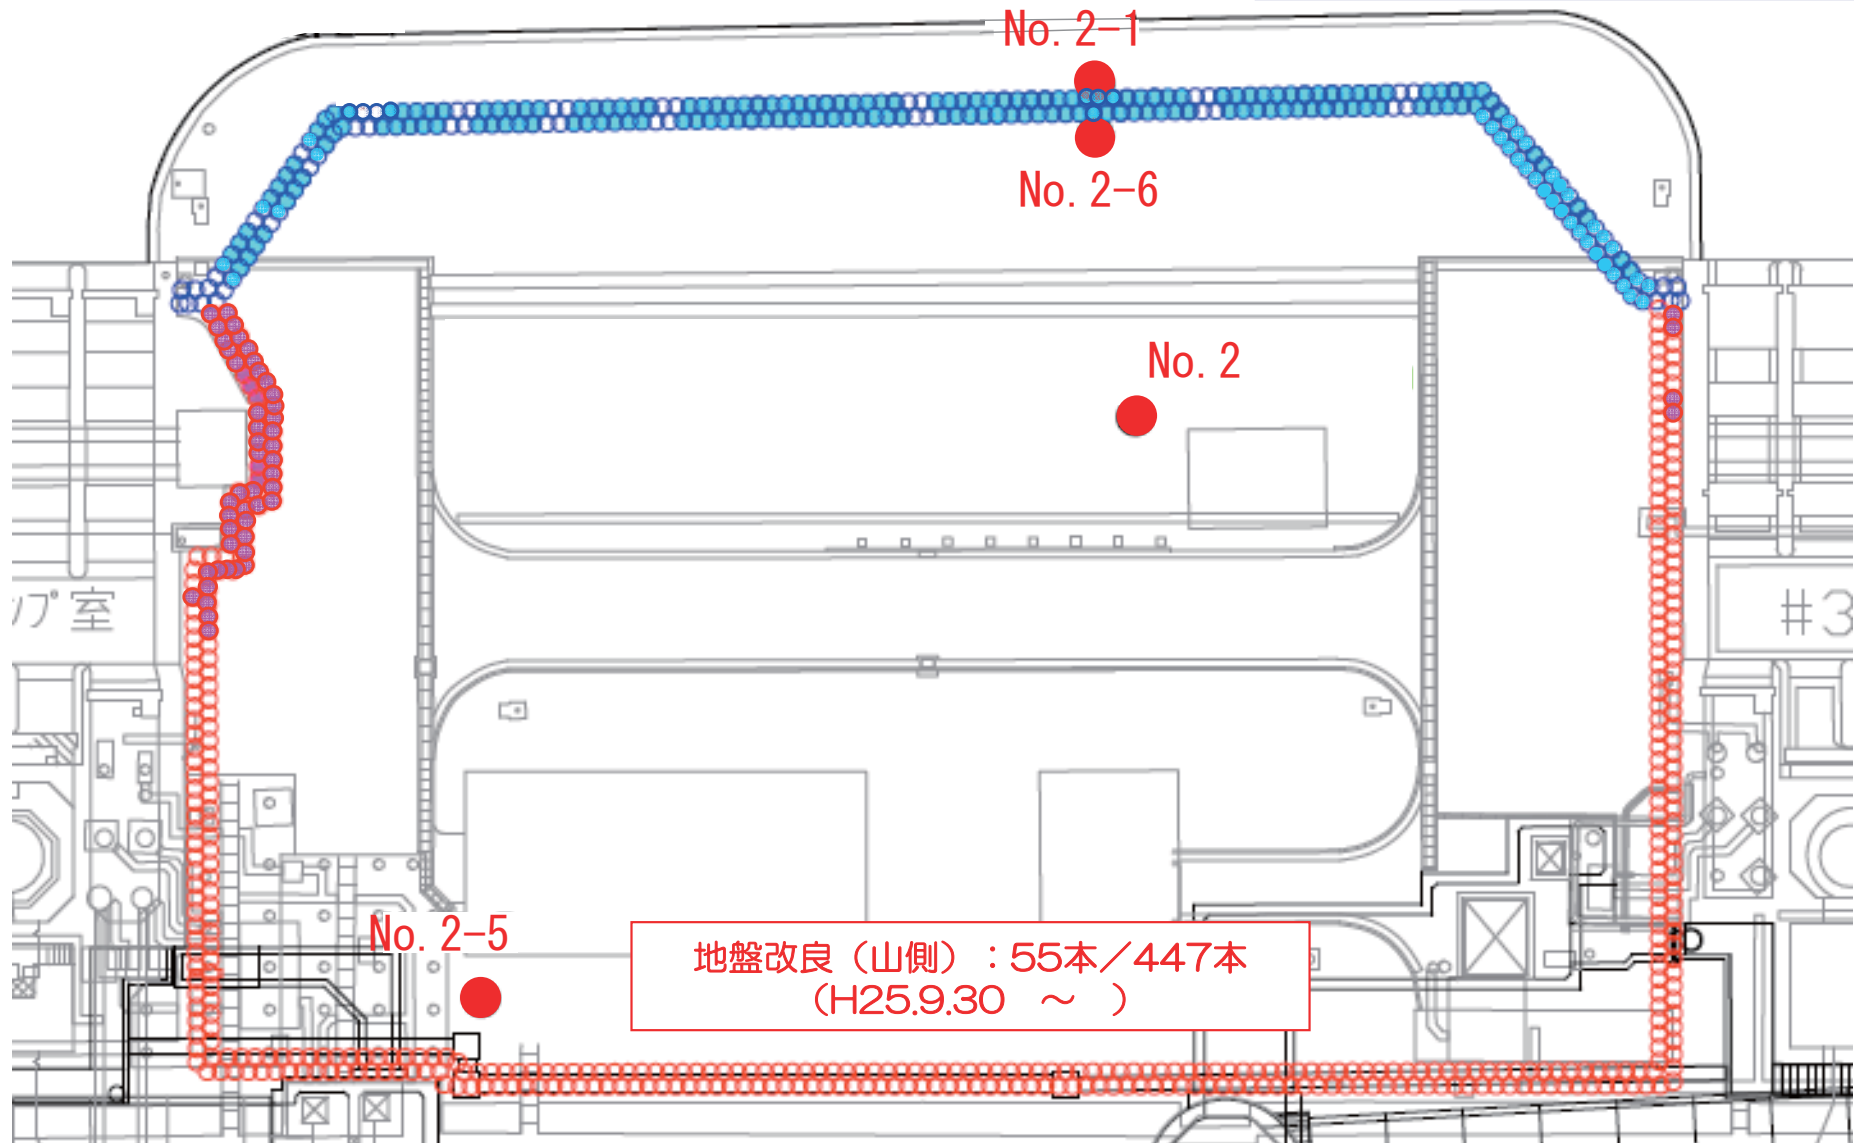

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。


地下水位の挙動（3-4号機間：10月5日～11月5日）

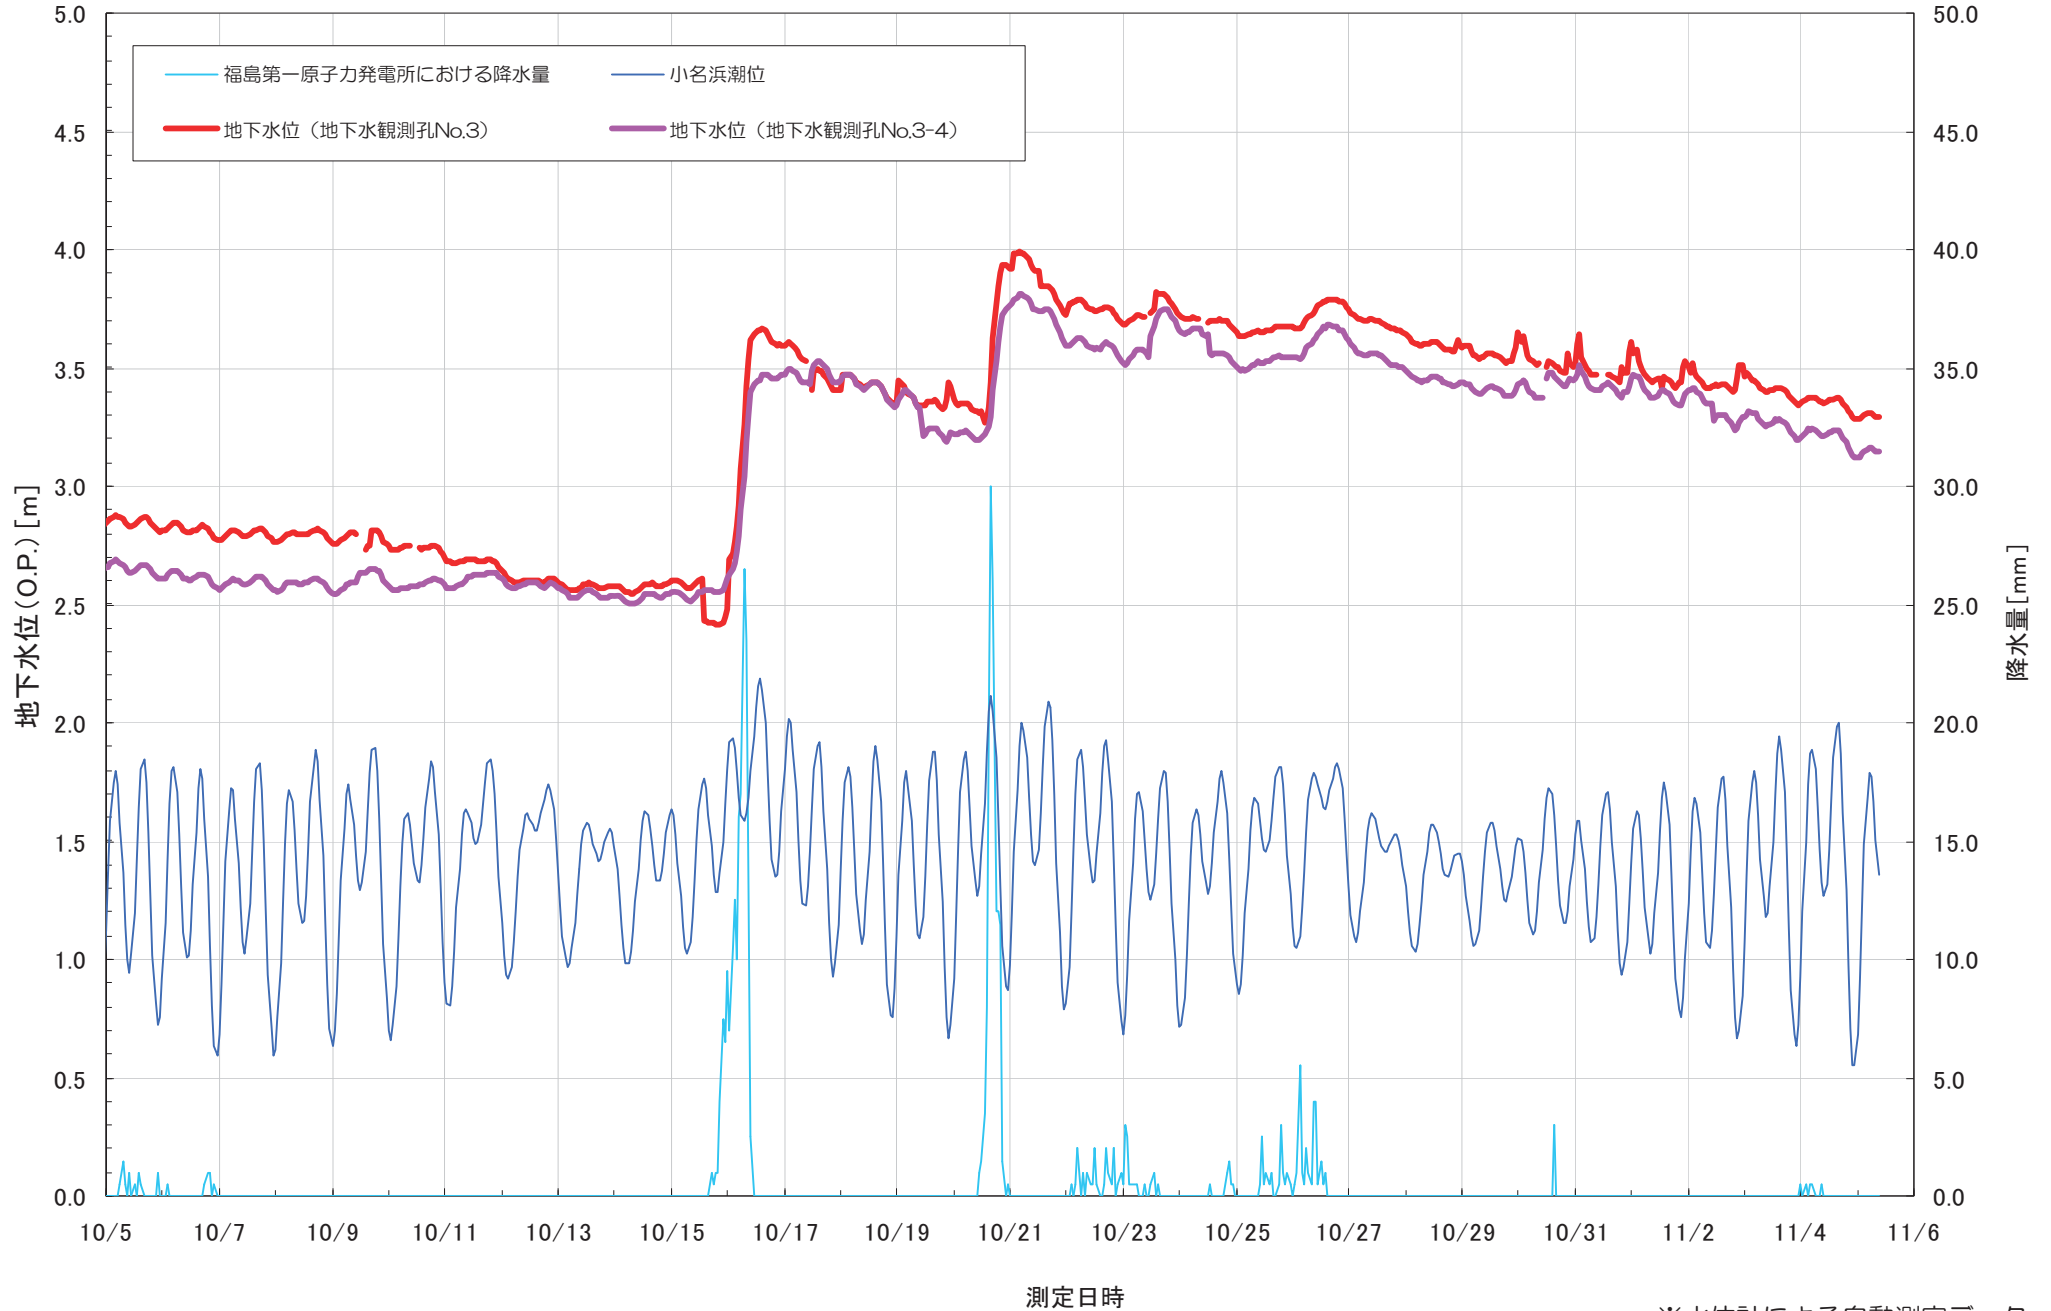

3-4号機間地盤改良工事の進捗状況（11月6日朝時点）

地盤改良（海側）：30本／132本
（H25.8.23 ~ ）

地盤改良（山側）：14本／273本
（H25.10.19 ~ ）

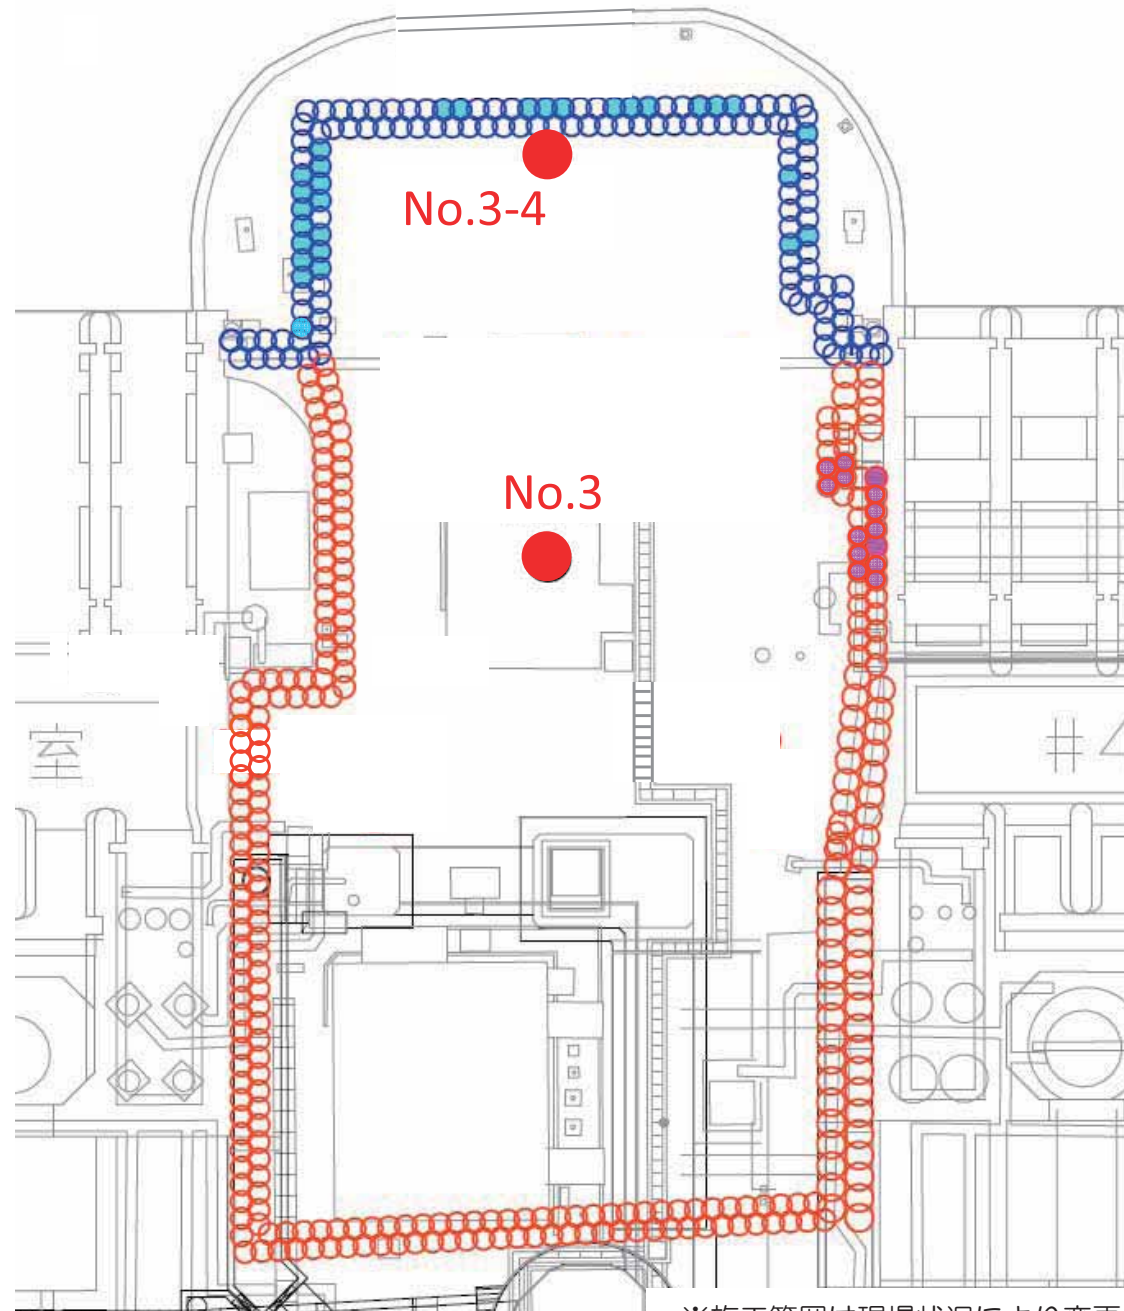

※施工範囲は現場状況により変更の可能性あり。
