


福島第一原子力発電所 1/2号機排気筒解体に向けた調整状況について

< 参 考 資 料 >
2019年7月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

【路盤整備の進捗状況について】

6月5日から実施している路盤整備作業が、本日、完了しました。今後、7月下旬頃からの解体作業開始に向けて解体装置が排気筒頂部に設置可能か確認し、最終動作確認作業を進めてまいります。

【現場状況】

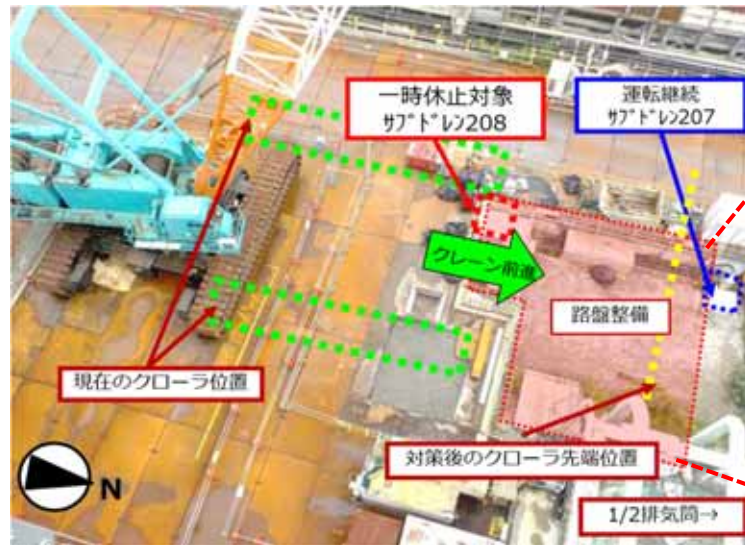

<路盤整備前>



<路盤整備後>



① 碎石敷き込み



② 整地



③ 補強鋼材設置



④ 敷鉄板設置
