


福島第一原子力発電所4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事の完了について

平成25年1月8日より着手していた4号機燃料取り出し用カバーの鉄骨建方が、本日5月29日に終了しました。

今後、準備ができ次第、燃料取り出しへ向けた天井クレーン上架作業を開始する予定です。
(平成25年6月初旬予定)

(イメージ図)

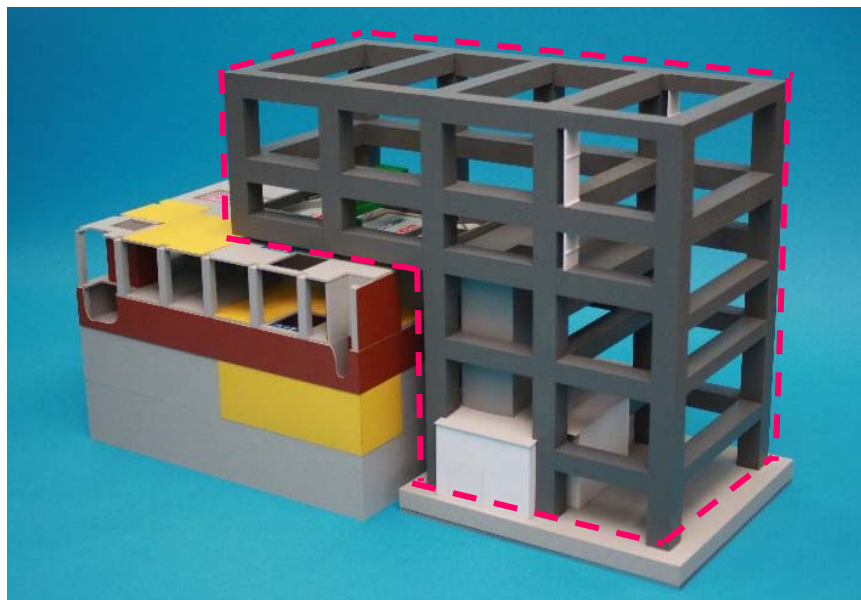

燃料取り出し用カバー鉄骨建方の完成（赤枠）

<鉄骨建方作業>


- 作業日：平成25年1月8日～5月29日
- 部材数：柱 38本、梁 49本（計87本）



燃料取り出し用カバー（平成25年5月29日現在）

※ 鉄骨建方工事と併行して、設置可能な東西および南面の外壁パネルの設置も行っております。

4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事〔平成25年1月8日～5月29日〕

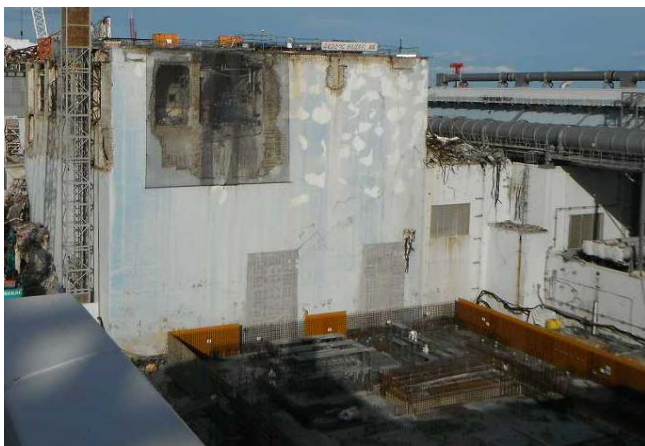

① 鉄骨建方 着工前（平成24年12月18日）



② 第1節部分の完了（平成25年1月14日）



③ 第3節部分の完了（平成25年3月13日）



④ 原子炉建屋上部を除く鉄骨建方部分の完了
（平成25年4月10日）



⑤ 鉄骨建方の完了（平成25年5月29日）



燃料取り出し用カバー〔完成イメージ〕

画像提供：東京電力株式会社

今後、燃料取扱機や天井クレーンをカバー内へ設置するための準備作業をすすめていきます。

以上
