

# 福島第一原子力発電所 4号機 燃料取り出し用カバー外壁・屋根の外装パネルの設置完了について

< 参考配布 >  
平成25年7月22日  
東京電力株式会社

4号機の燃料取り出し用カバーについて、平成25年4月1日から外壁と屋根の外装パネルの設置作業を行っていましたが、7月20日に最後の屋根パネルを設置し、本設置作業について全て完了しました。

なお、カバー内に設置する天井クレーンや燃料取扱機については、7月13日に全てカバー内へ吊り込みを完了し、現在組み立て作業中です。今後、燃料取り出しに向けて、カバーへの受電作業や天井クレーン等の作動確認を組み立て作業と並行して行っていく予定です。




外壁・屋根パネル設置完了（7月20日）



燃料取り出し用カバー完成イメージ（模型）

画像提供：東京電力株式会社

# 福島第一原子力発電所 4号機 燃料取り出し用カバーの進捗状況〔現在までのまとめ〕

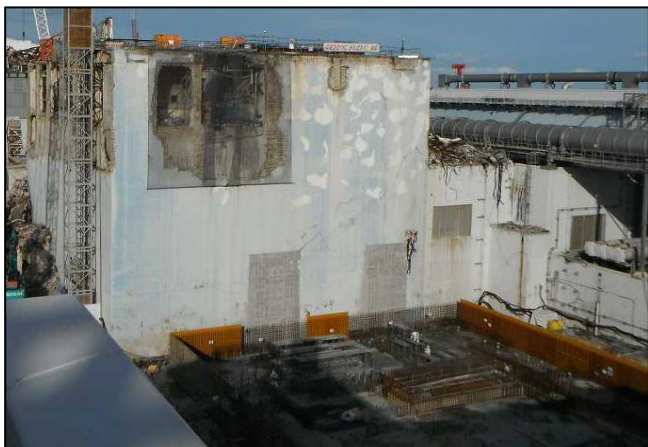

①鉄骨建方着手前  
(平成24年12月18日)



②第一節 鉄骨建方完了  
(平成25年1月14日)




③原子炉建屋上部を除く鉄骨建方完了  
(平成25年4月10日)



④鉄骨建方完了  
(平成25年5月29日)



⑤外壁・屋根パネル設置完了  
(平成25年7月20日)

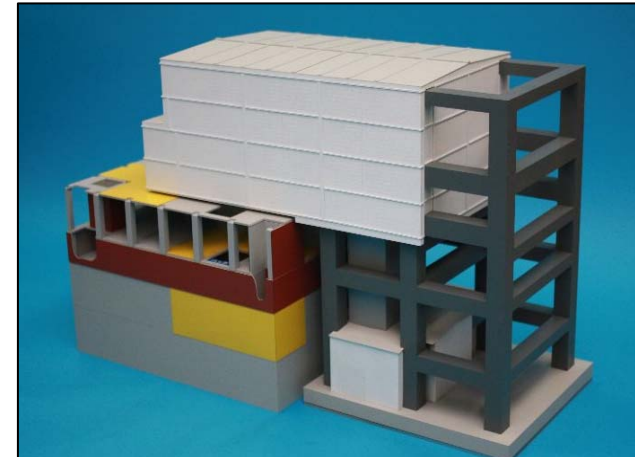

燃料取り出し用カバー完成イメージ (模型)

画像提供：東京電力株式会社
