


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		5月					6月					7月					8月			9月			備考
			26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討																						
			現場作業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化																						
労働環境改善	人身安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	検討・設計	情報共有、安全施策の検討・評価																						
			現場作業	熱中症予防対策の実施(4~10月)																						
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施	検討・設計	健康相談受付																						
			現場作業	【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、2019年度検査案内準備(退職者及び協力企業作業員)																						
労働環境改善	健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	検討・設計	1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整																						
			現場作業	1F救急医療室9月までの医師確保完了 新規追加																						
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽ ▽作業員の確保状況調査依頼																						
			現場作業	作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計 作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計																						
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	6 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																						
			現場作業																							

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定					5月					6月					7月					8月		9月		備考
			26	2	9	16	23	30	7	14	下	上	中	下	前	後											

労働環境改善

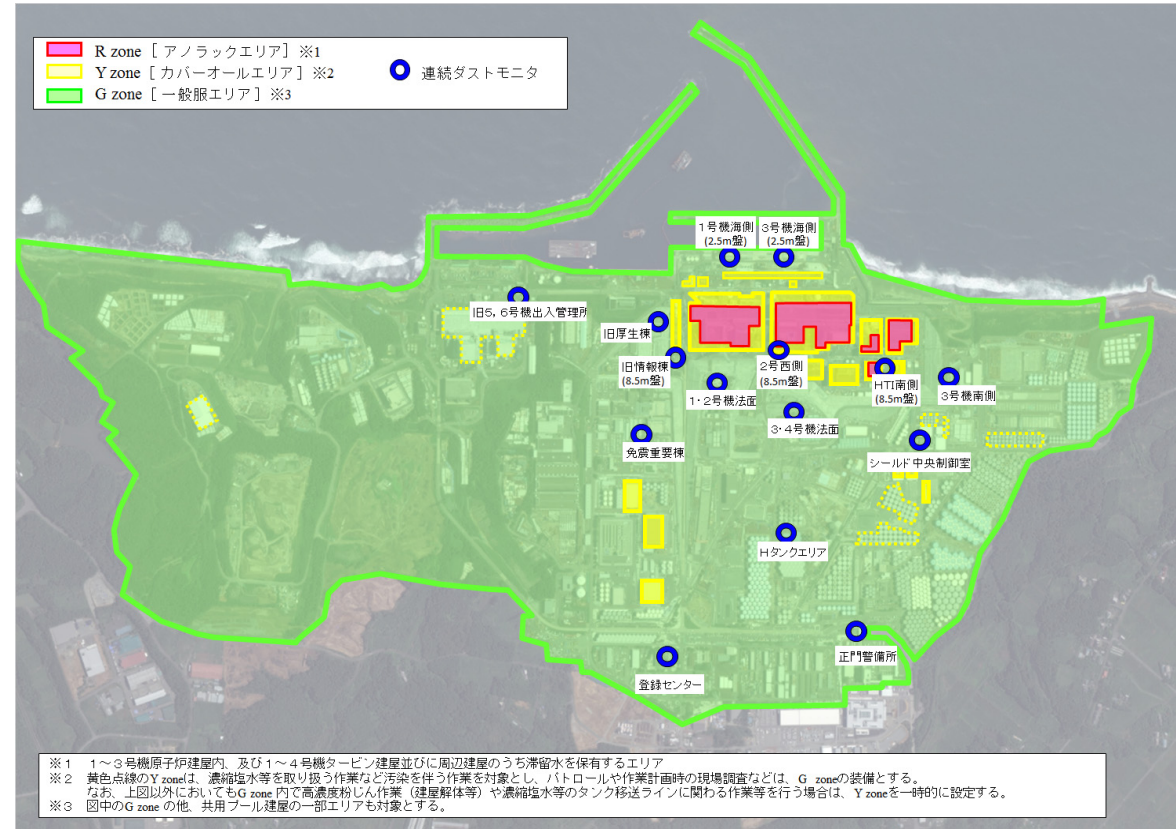

管理対象区域の運用区分 レイアウト
