

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年11月27日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

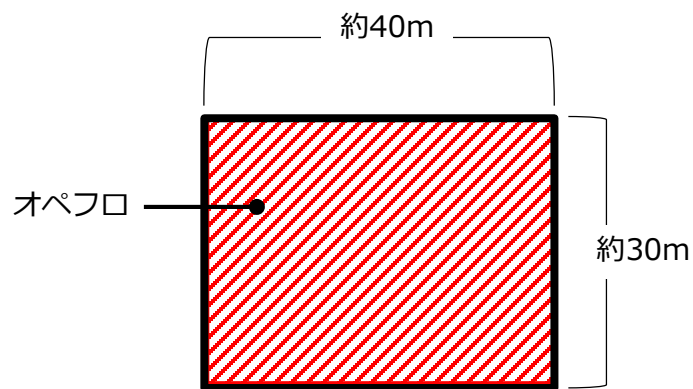
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

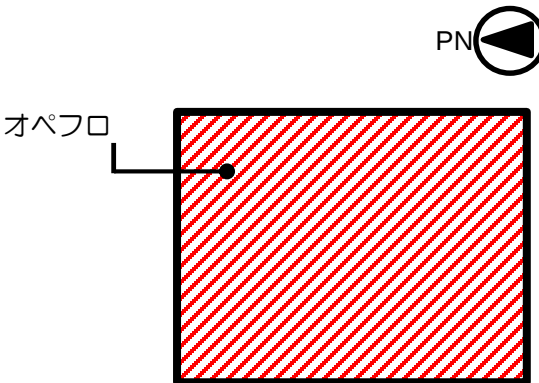
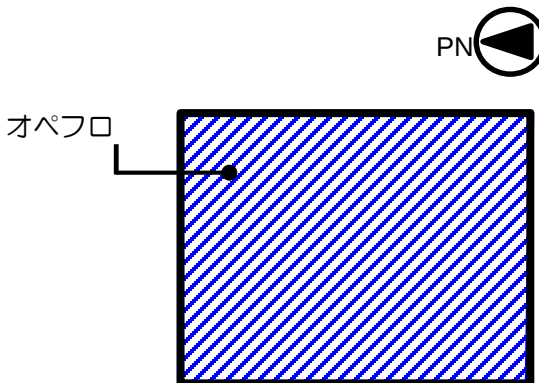
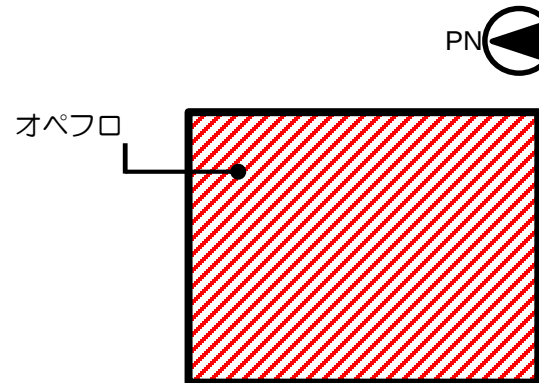


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（11月）	実績（11月）	計画（12月）
完了予定日：11月 22日 	完了日：11月 17日 	完了予定日：12月 9日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年11月26日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

10月	金	19（日）	20（月）	21（火）	22（水）	23（木）	24（金）	25（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	○
	散布実施	－	－	－	－	－	－	○
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.27E-05（最大）	6.64E-05（最大）	1.01E-04（最大）	9.54E-05（最大）	9.00E-05（最大）	1.01E-04（最大）	8.49E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	土	26（日）	27（月）	28（火）	29（水）	30（木）	31（金）	1（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	○
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.94E-05（最大）	8.40E-05（最大）	7.34E-05（最大）	6.28E-05（最大）	7.59E-05（最大）	9.70E-05（最大）	1.13E-04（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
11月	日	2（日）	3（月）	4（火）	5（水）	6（木）	7（金）	8（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	9.44E-05（最大）	7.07E-05（最大）	5.23E-05（最大）	8.11E-05（最大）	5.64E-05（最大）	6.81E-05（最大）	6.81E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	月	9（日）	10（月）	11（火）	12（水）	13（木）	14（金）	15（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	6.28E-05（最大）	9.44E-05（最大）	8.14E-05（最大）	7.86E-05（最大）	5.92E-05（最大）	8.38E-05（最大）	7.07E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	火	16（日）	17（月）	18（火）	19（水）	20（木）	21（金）	22（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	○
	散布実施	－	○	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	6.29E-05（最大）	7.98E-05（最大）	6.28E-05（最大）	6.80E-05（最大）	4.74E-05（最大）	7.32E-05（最大）	8.38E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	水	23（日）	24（月）	25（火）	26（水）	27（木）	28（金）	29（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	7.86E-05（最大）	9.42E-05（最大）	8.39E-05（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年11月26日時点
