


燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	燃料デブリ取り出し準備	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	7月							8月					9月			10月			11月			12月			1月			2月以降	備 考			
					26	27	28	29	30	31	1	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
原子炉中長期実行プラン2026 目標工程	原子炉建屋内環境改善	原子炉建屋内の環境改善	1号	(実 績) ○建屋内環境改善（継続） (予 定) ○建屋内環境改善（継続） ○RCW線量低減	現場作業																													建屋内環境改善 ・RCW出口ヘッダ配管穿孔（1箇所目）'25/03/06～'25/03/13 ・RCW出口ヘッダ配管穿孔（2箇所目）'25/03/18～'25/03/23 ・RCW出口ヘッダ配管ガスバージ'25/03/28～'25/05/14 ・RCW出口ヘッダ配管機械穿孔'25/05/15 ・RCW出口ヘッダ配管内調査'25/05/16 ・RCW-Hx水抜き準備作業'26/5/11～'26/6/15 ・RCW-Hx水抜き作業開始'26/6/16～		
			2号	(実 績) なし (予 定) ○建屋内環境改善（継続）		現場作業																													建屋内環境改善 ・R/B大物搬入口2階進へい設置 '21/11/29～'22/1/10 ・1階西側通路MCC撤去 '22/1/11～'22/2/25 ・2階北側エリア除染'23/4/10～'23/10/13 ・原子炉系計装配管の線量低減'23/8/30～'23/9/26	
			3号	(実 績) ○建屋内環境改善（継続） ○圧力抑制室内滞留ガスバージ ○X-6ベネトレーション前室調査 ○パーソナルエアロック室内調査 (予 定) ○建屋内環境改善（継続）			検討・設計																													建屋内環境改善 ・圧力抑制室内滞留ガスバージ '23/10/25～'26/02/12 ・X-6ベネ前室調査準備作業'24/10/29～'24/11/13 ・X-6ベネ前室調査穿孔作業'24/11/14～'24/12/3 ・X-6ベネ前室の調査'24/12/4～'24/12/26 ・パーソナルエアロック室内調査'25/08/19～'25/09/19
		格納容器内水循環システムの構築	1号	(実 績) 圧力抑制室内包水のサンプリング (予 定) なし	現場作業																														圧力抑制室内包水のサンプリング ・原子炉冷却材浄化系逆止弁開放（モックアップ）'22/11/1～'23/7/4）'23/7/18～'23/10/31 ・圧力抑制室底部確認、圧力抑制室内包水サンプリング'23/11/15～'23/11/17 ・PCV（S/C）水位計設置 '23/12/5～'24/1/18 ・常設監視計器取替 '23/12/8～'24/2/1	
			2号	(実 績) なし (予 定) なし		現場作業																														
			3号	(実 績) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水质改善（継続） (予 定) ○原子炉格納容器水位低下（継続） ○圧力抑制室内包水の水质改善（継続）			現場作業	(継続実施)																											・3号機格納容器内取水設備による圧力抑制室内包水の水质改善開始 '22/10/3～ ・PCV（S/C）水位計設置 '24/2/21～'24/4/24	
		燃料デブリ	燃料デブリの取り出し準備	共通	(実 績) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続） (予 定) ○【研究開発】格納容器内部詳細調査技術の開発（継続） ○【研究開発】圧力容器内部調査技術の開発（継続） ○燃料デブリ取出設備 概念検討（継続）	検討・設計																													(継続実施)	
																																(継続実施)				
																																(継続実施)				
						現場作業																												(継続実施)		
																																(継続実施)				
																																(継続実施)				
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
																																	(継続実施)			
					現場作業																												(継続実施)			
																																	(継続実施)			
						</																														

凡 例

	： 検討業務・設計業務・準備作業
	： 現場作業予定
	： 機器の運転継続のみで、現場作業（工事）がない場合
	： 記載以降も作業や検討が継続する場合は、端を矢印で記載
	： 工程調整中のもの

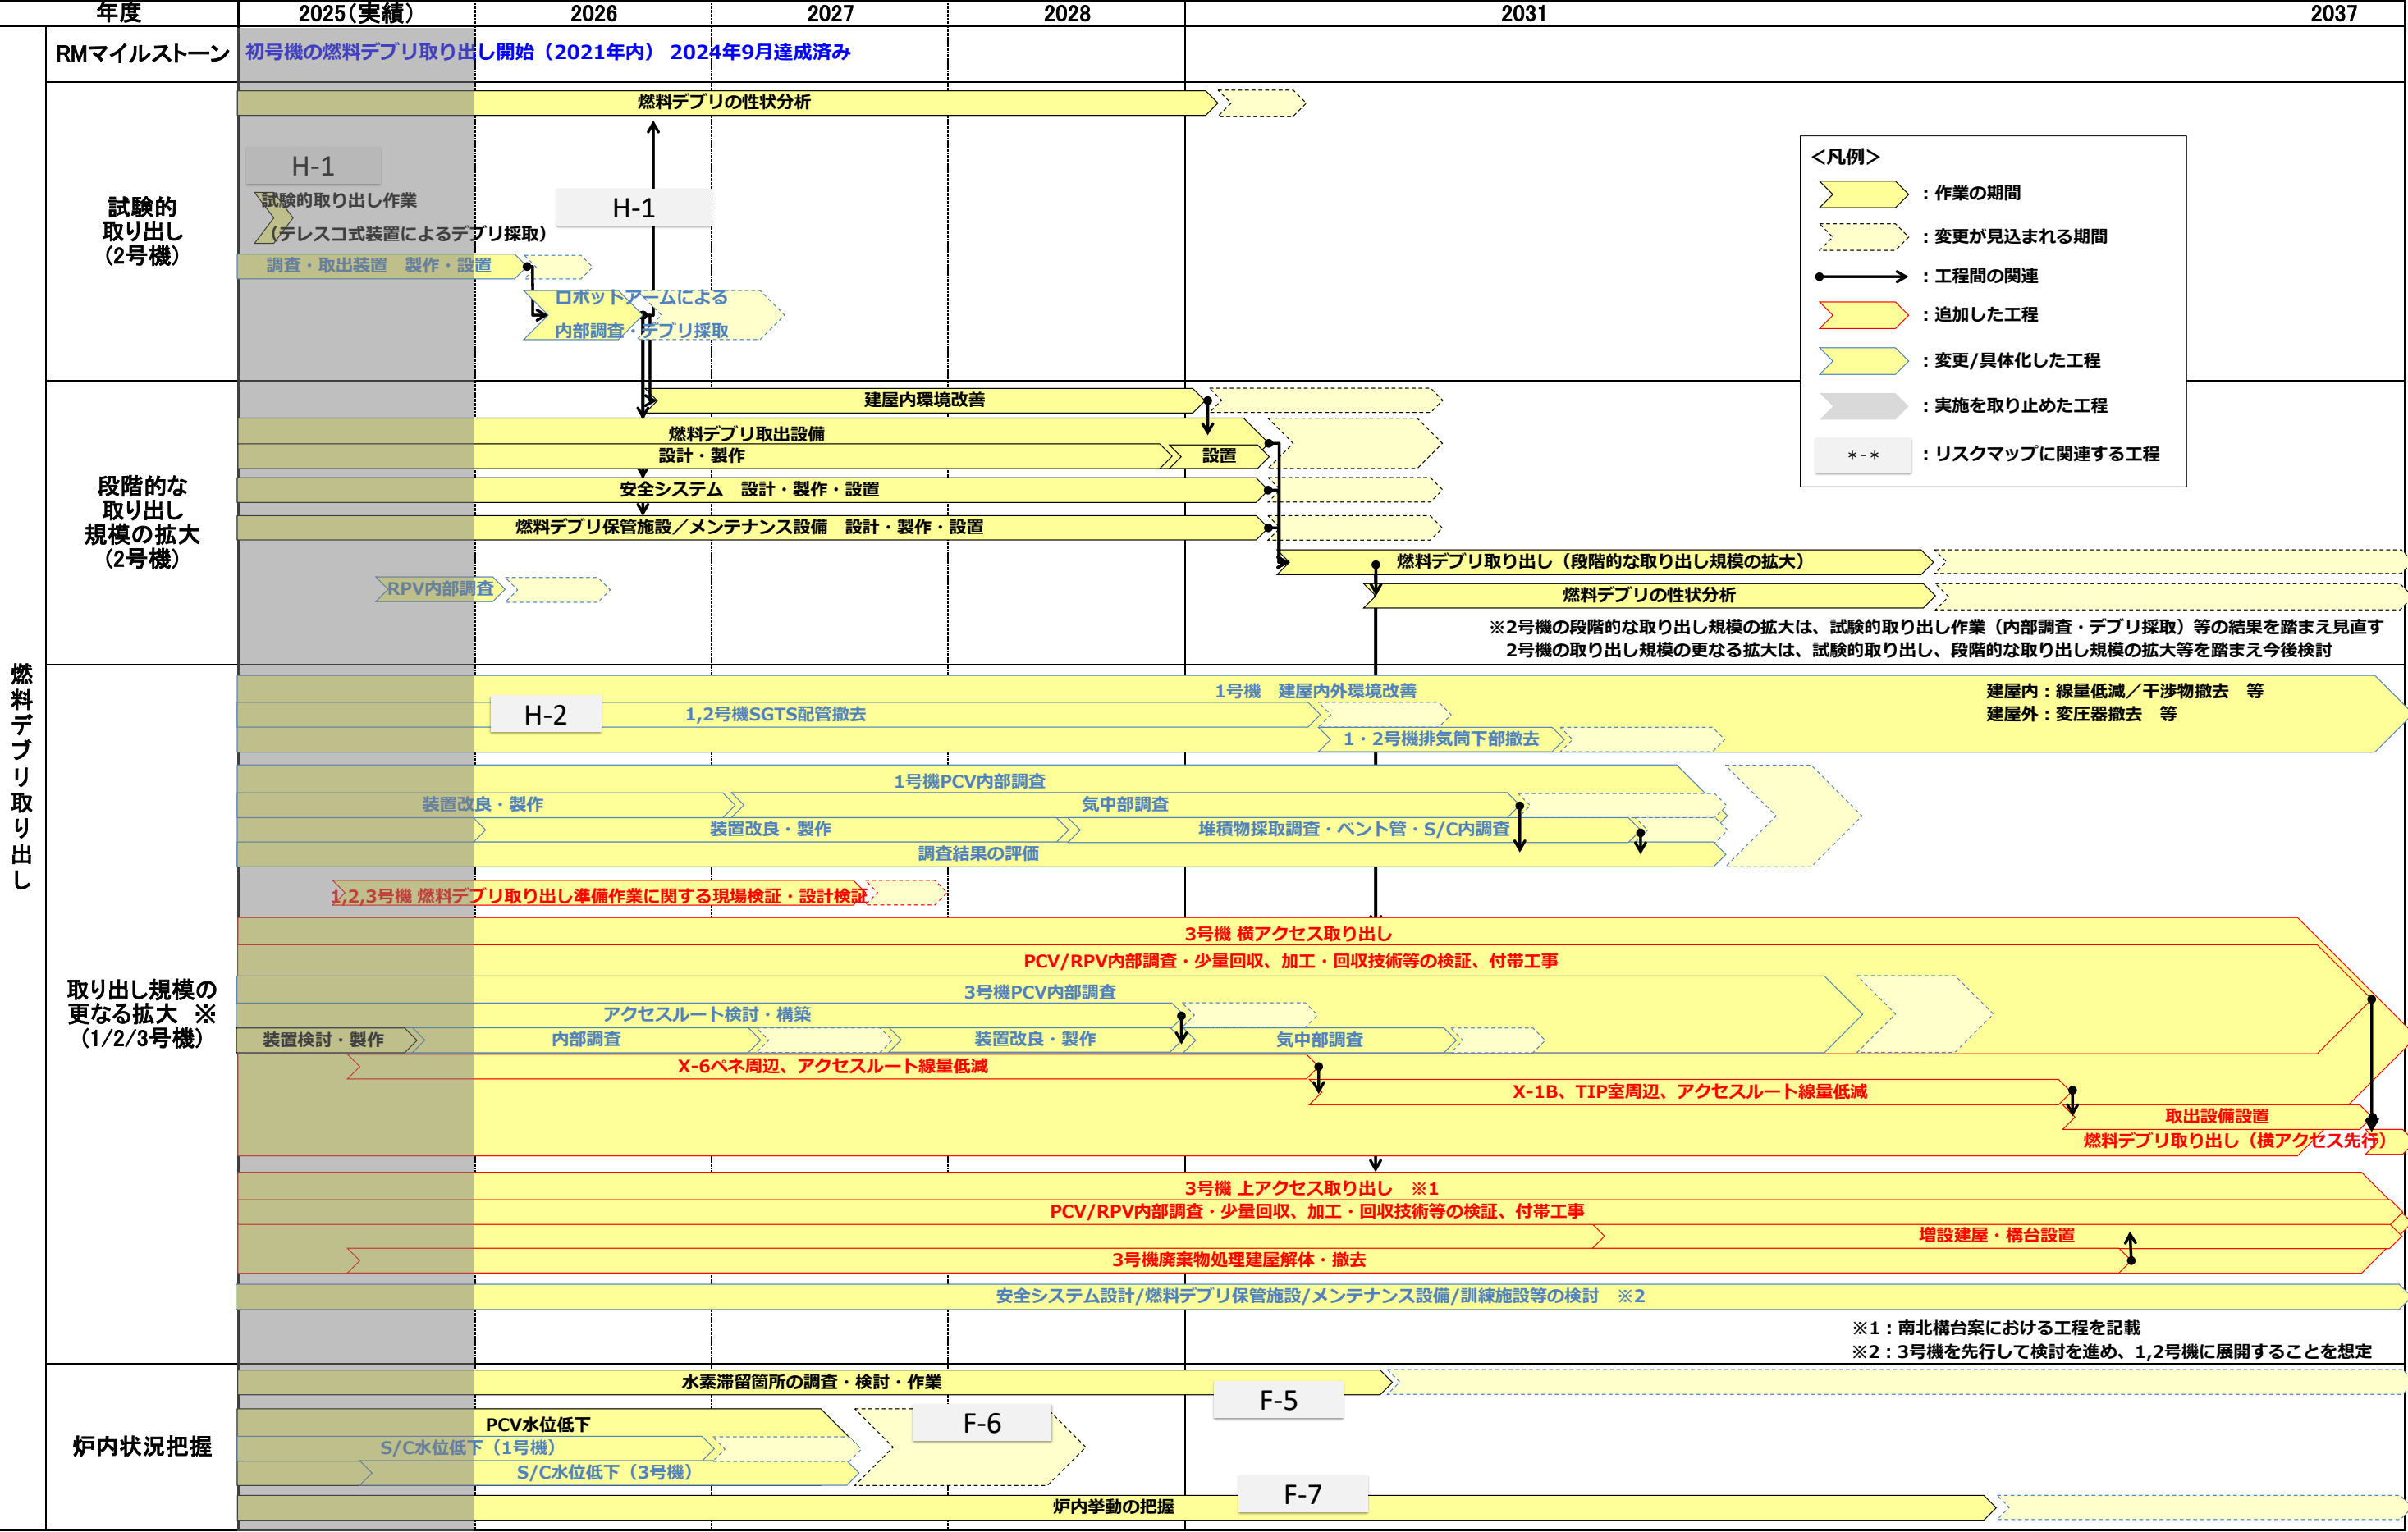

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
