

福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー 屋根パネルの取り外し完了について

< 参考資料 >
2015年10月5日
東京電力株式会社

本日、1号機建屋カバーの屋根パネル（6枚目）の取り外しを行い、全ての屋根パネルの取り外しが完了しました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタや敷地境界に設置してあるモニタリングポストに有意な変動はありませんでした。

今後、飛散防止剤散布・ガレキ状況調査等を行った後、散水設備設置に支障となる鉄骨撤去を行っていきます。

作業時間

7時7分頃：屋根パネル（6枚目）


（作業開始）

7時40分頃：屋根パネル取り外し

8時10分頃：屋根パネル仮置き

（取り外し完了）

屋根パネル取り外し状況

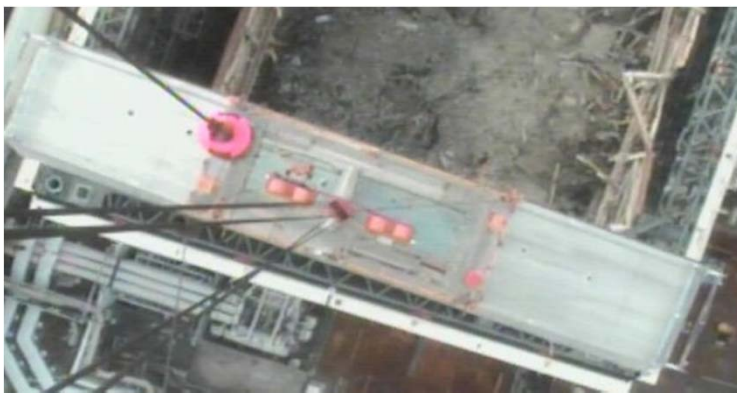

クレーンから撮影



建屋付近から撮影



建屋付近から撮影
