



## 福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋地下階の 滞留水水位・温度測定結果について

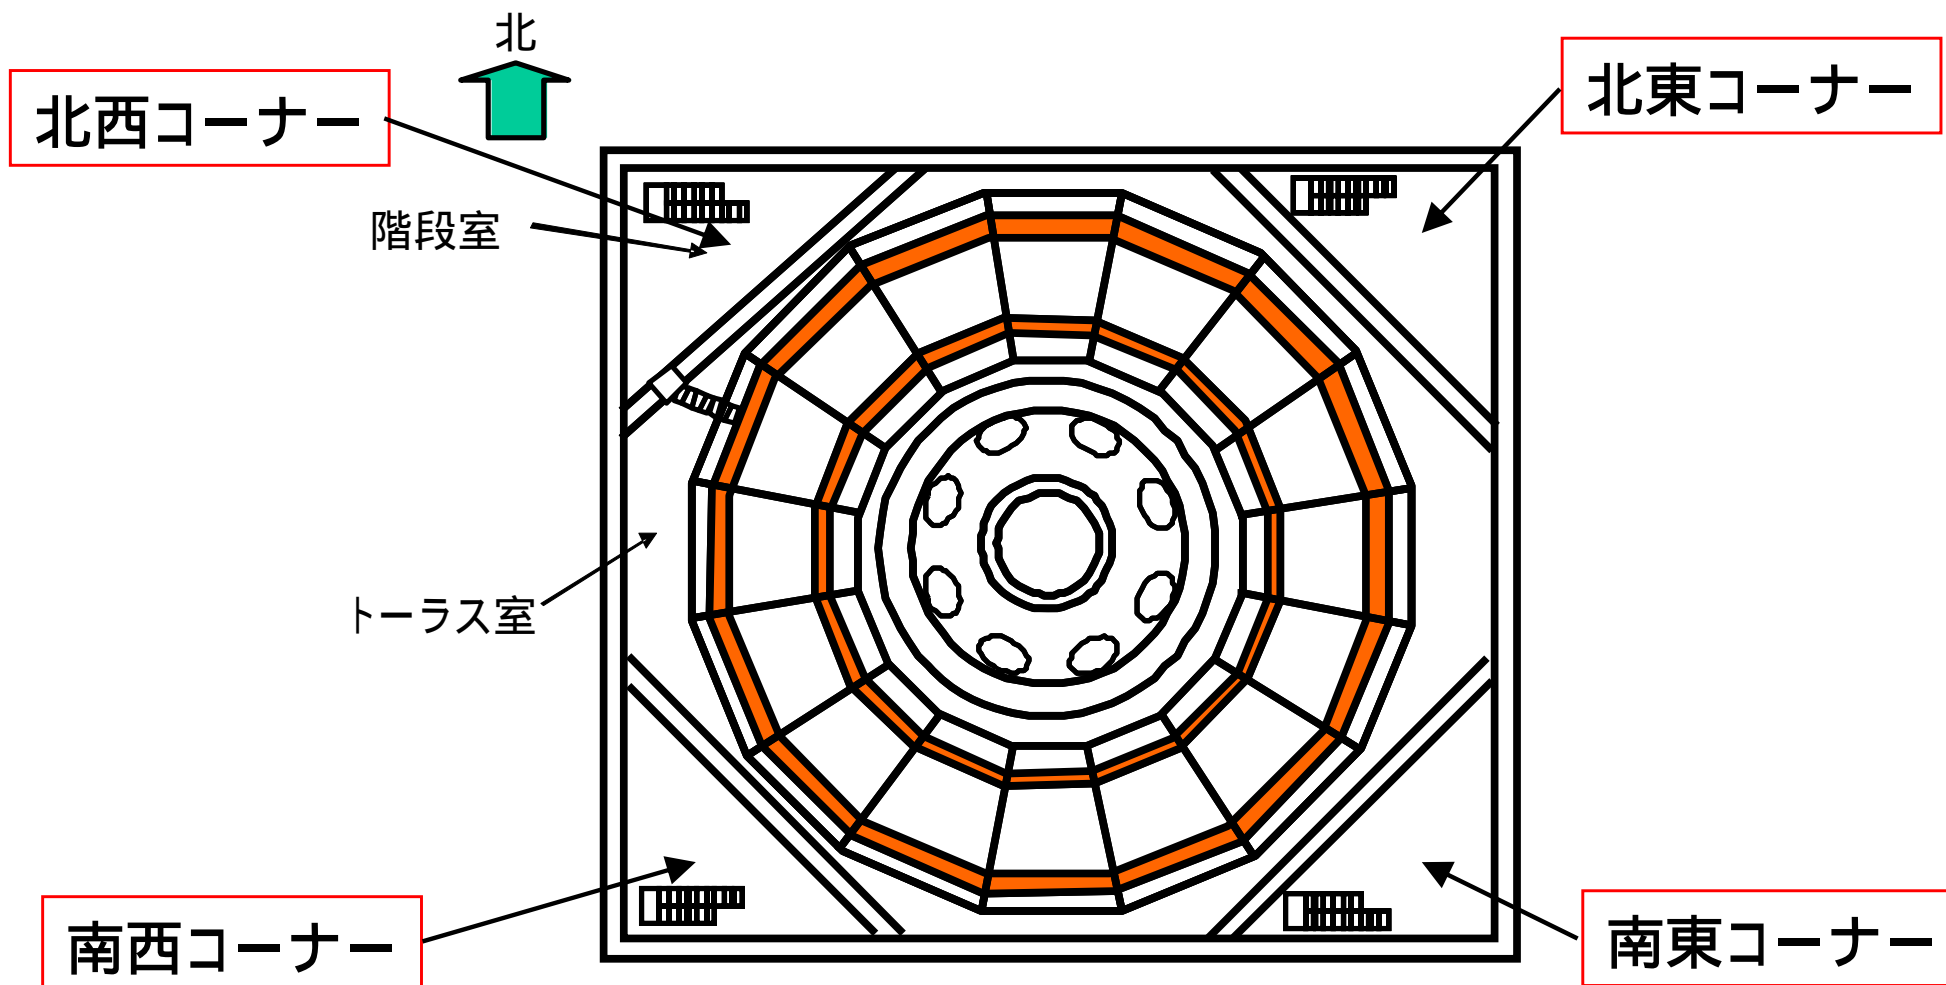

原子炉建屋中地下階

: 測定箇所

# 測定結果 (H24.6.28実施)

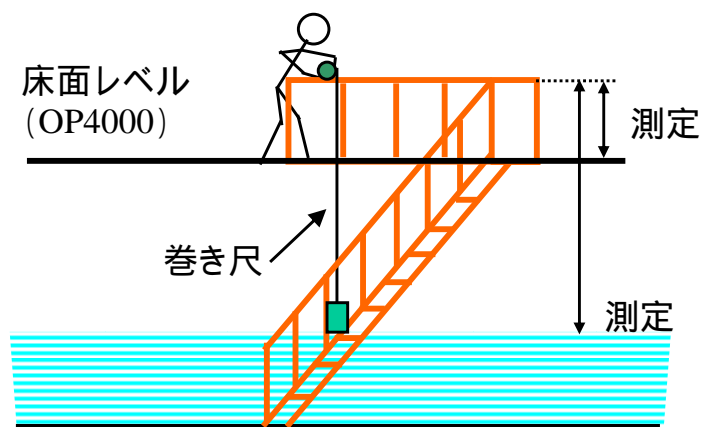

**水位測定**

	場所	水位
水位測定結果	北東コーナー	OP 3160 mm
	北西コーナー	OP 3170 mm
	南東コーナー	OP 3190 mm
	南西コーナー	OP 3050 mm

	場所	温度
温度測定結果	北東コーナー	31.4
	北西コーナー	32.1
	南東コーナー	30.3
	南西コーナー	30.2

被ばく線量 (直営作業)

\* 計画線量: 8.70 mSv

\* 実績線量: 4.02 mSv (最大)
