


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

<参考資料>

2019年4月8日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

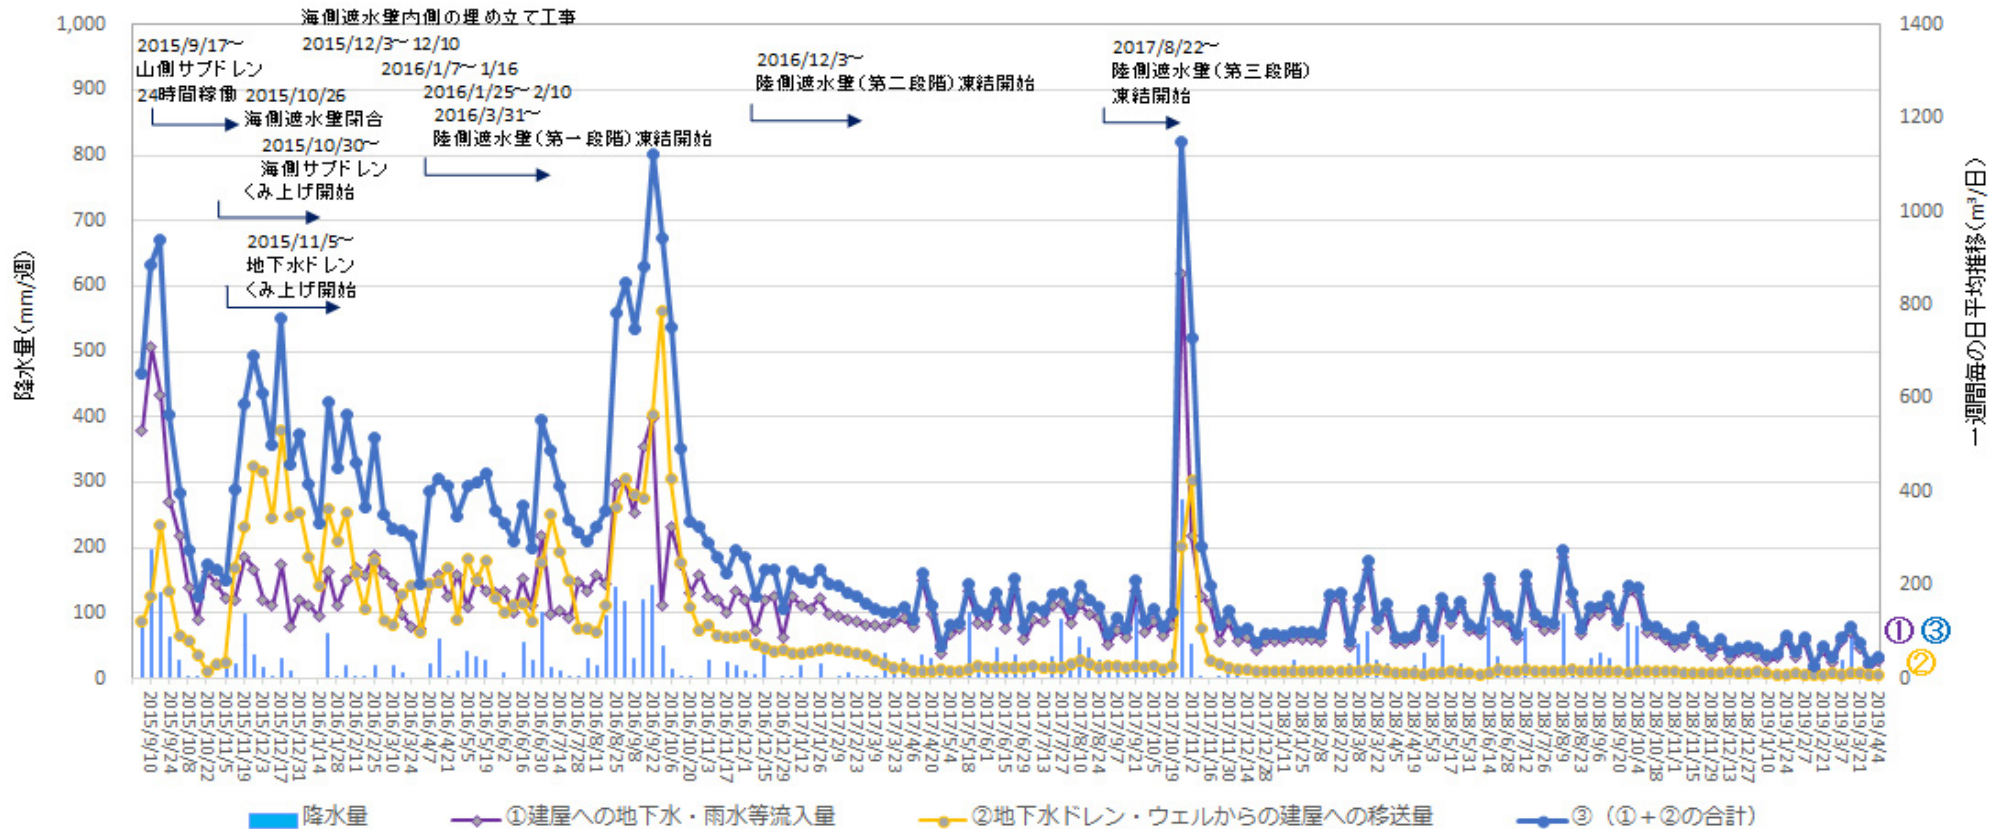

地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2019年3月28日 ~ 2019年4月3日)

[m³/日]

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計(α)
3月28日~	0	0	0	0
4月3日				

(参考)改修ウェル, ウェルポイント				(参考)タービン 建屋への移送 量[(α)+(β)]
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
9	0	0	9	9

①建屋への地下水・雨水等流入量 : 37m³/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 9m³/日, ③(①+②の合計): 46m³/日, 降水量: 6mm/週
 なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。
