

# 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移


<参考資料>

2022年6月6日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

※グラフは至近16ヶ月程度の期間

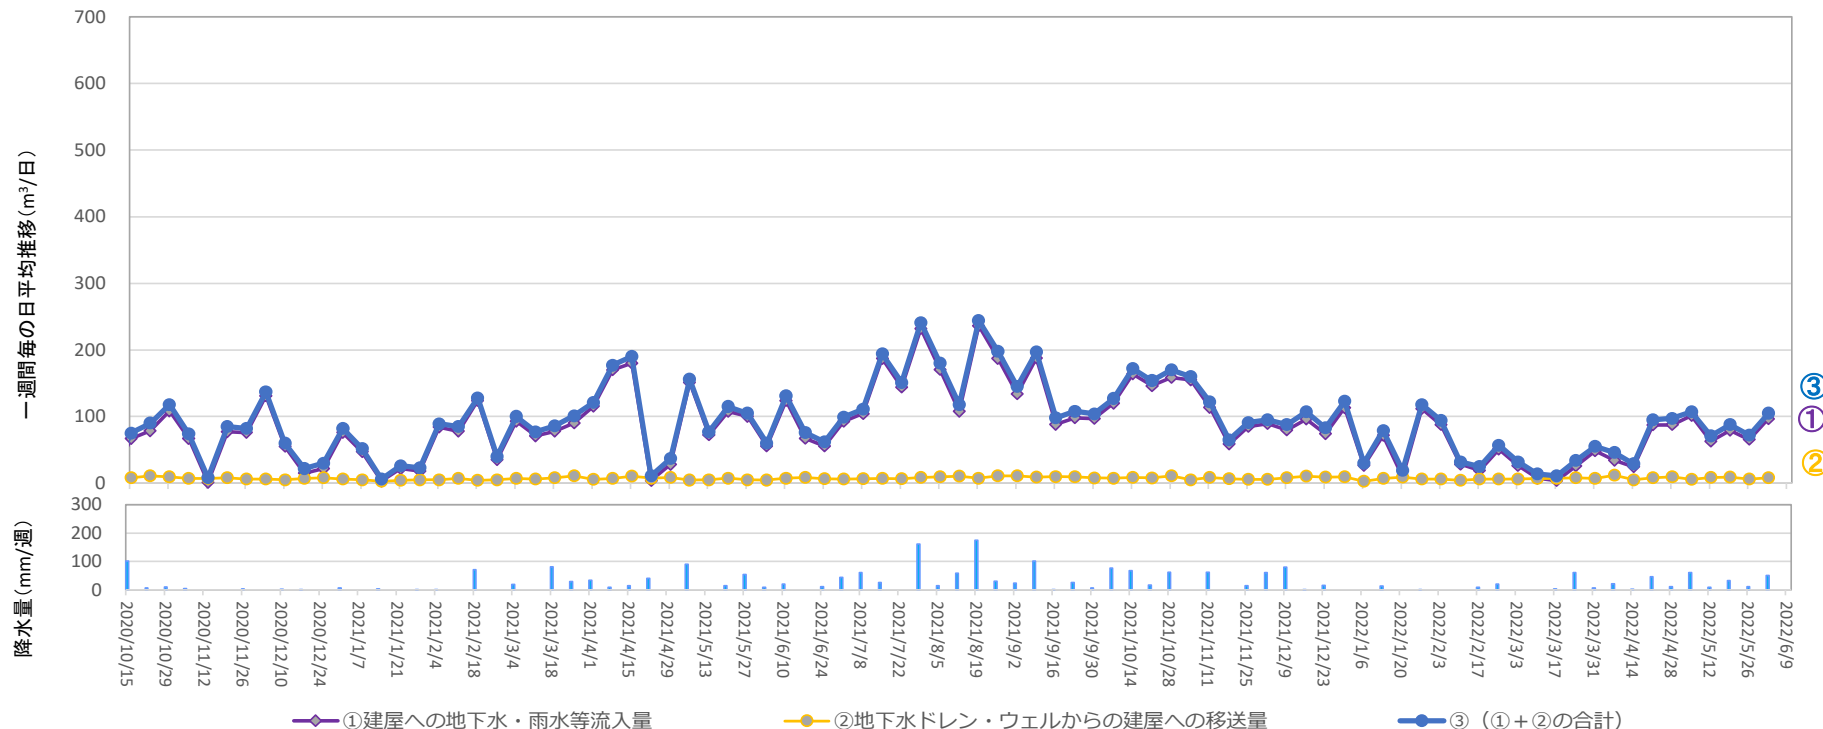

## 地下水ドレンからタービン建屋への移送量

( 2022年5月26日 ~ 2022年6月1日 )

[m<sup>3</sup>/日]

日付	地下水ドレン中継タンク			
	A	B	C	合計(α)
5月26日~ 6月1日	0	0	0	0

(参考)改修ウエル, ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
8	0	0	8	8

①建屋への地下水・雨水等流入量 :97m<sup>3</sup>/日, ②地下水ドレン・ウエルからの建屋への移送量8m<sup>3</sup>/日, ③(①+②の合計):105m<sup>3</sup>/日, 降水量:51.5mm/週  
なお, 合計値は小数点第一位のデータを合計しているため, 個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

