


建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

＜参考資料＞
2025年10月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

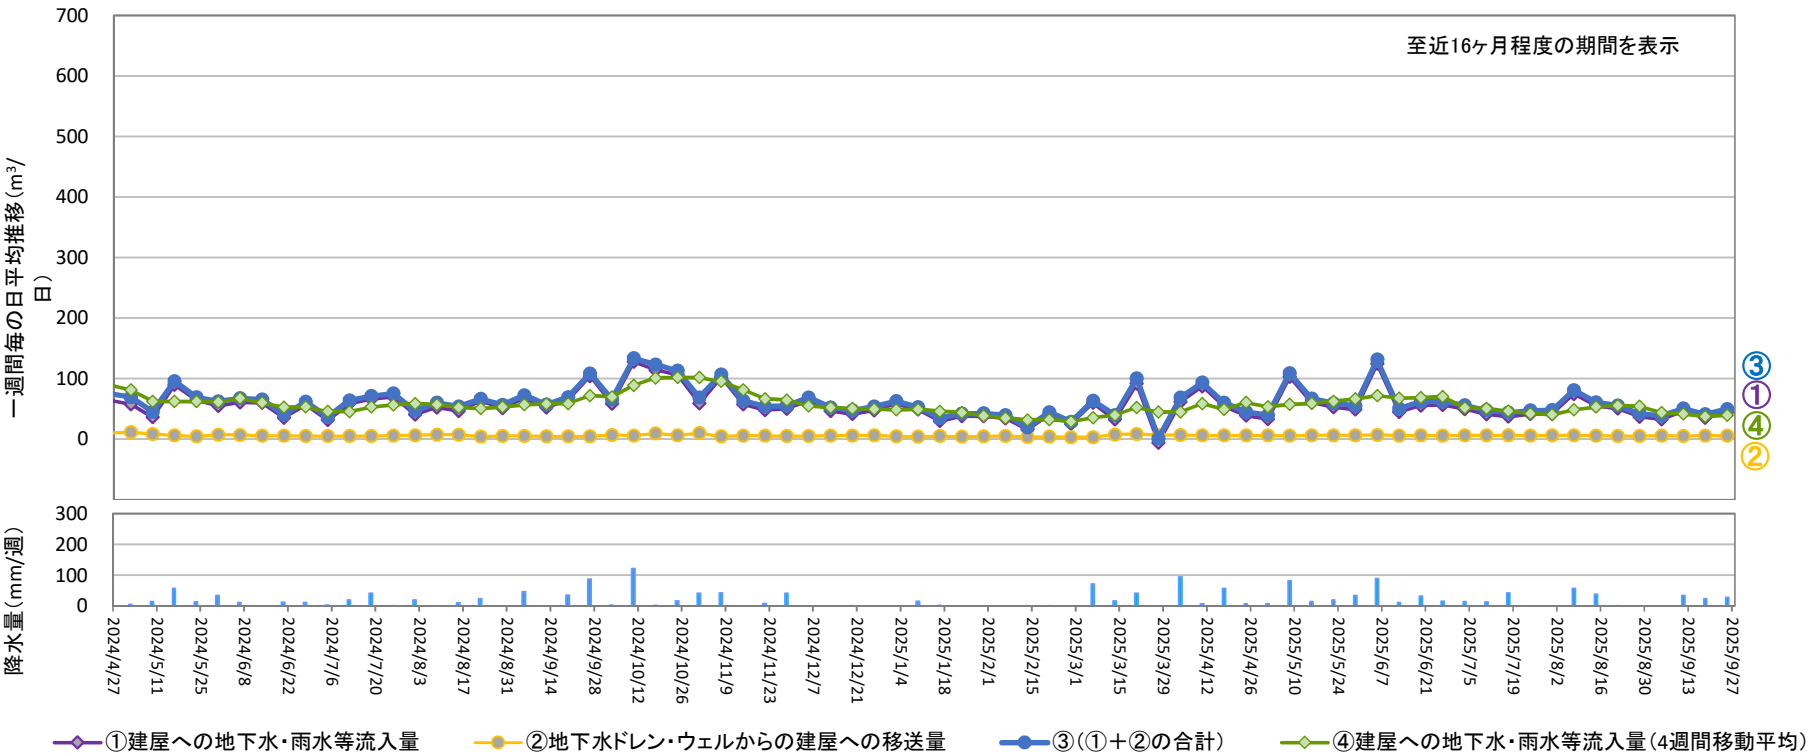

地下水ドレンからタービン建屋への移送量 (2025年9月18日 ～ 2025年9月24日) [m³／日]

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウェル、ウェルポイント				(参考)タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
9月18日～ 9月24日	0	0	0	0	6	0	0	6	6

①建屋への地下水・雨水等流入量： 44 m3/日, ②地下水ドレン・ウェルからの建屋への移送量: 6m3/日, ③(①+②の合計): 50m3/日, 降水量: 27.0mm/週
なお、合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。
※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。
(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均: 39 m3/日

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

