


# 建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

<参考資料>  
 2026年5月22日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー

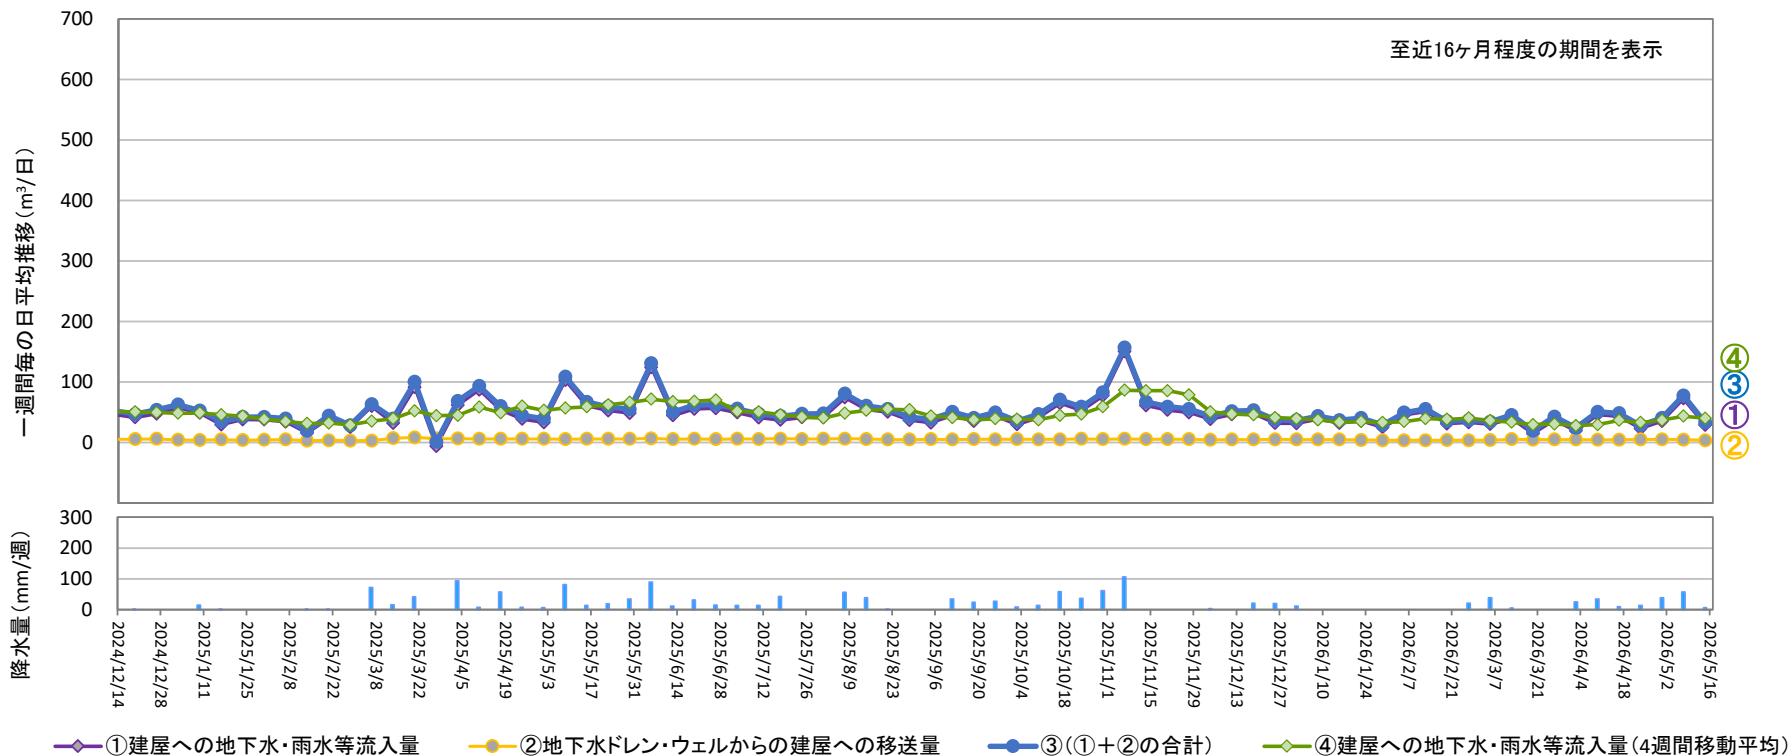

地下水ドレンからタービン建屋への移送量

( 2026年5月7日 ~ 2026年5月13日 )

日付	地下水ドレン中継タンク				(参考)改修ウエル, ウエルポイント				[参考]タービン建屋への移送量 [(α)+(β)]
	A	B	C	合計(α)	1-2号機間	2-3号機間	3-4号機間	合計(β)	
5月7日~	0	0	0	0	4	0	0	4	4
5月13日	0	0	0	0	4	0	0	4	4

①建屋への地下水・雨水等流入量: 29 m<sup>3</sup>/日, ②地下水ドレン・ウエルからの建屋への移送量: 4m<sup>3</sup>/日, ③①+②の合計: 33m<sup>3</sup>/日, 降水量: 6.0mm/週

なお、合計値は小数点第一位のデータを合計しているため、個々のデータを合計した数値と合計値に差異がある場合があります。

※ 2024年4月4日からプロセス主建屋断面積を一部精緻化して①③④を算出。なお、引き続き算出時に不確かさを含むため、マイナスとなる場合があります。

(参考)④建屋への地下水・雨水等流入量の4週間移動平均: 40 m<sup>3</sup>/日

(参考) 評価開始時からの建屋への地下水ドレン移送量・地下水流入量等の推移

