

# 柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動工程について

資料1

2026年2月12日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

## ＜中間停止までのプラント起動曲線＞

(注) 本起動曲線は概要であり、実際の起動曲線とあわない場合もある


- ▼①原子炉を起動し高温・高圧の状況下での原子炉設備の健全性確認や  
原子炉内の蒸気を使用しての注水・冷却系設備の使用前事業者検査を実施

凡例  
— : 復水器真空度  
— : 原子炉圧力  
— : タービン回転速度  
— : 発電機出力

- ▼②タービンへ原子炉内の蒸気を供給し、タービンを起動しての健全性確認を実施

- 発電機本並列<sup>※2</sup>  
(2/16予定)

- ▼④起動の過程における温度・圧力の変化や設備の運転による異常の有無等の健全性確認を実施

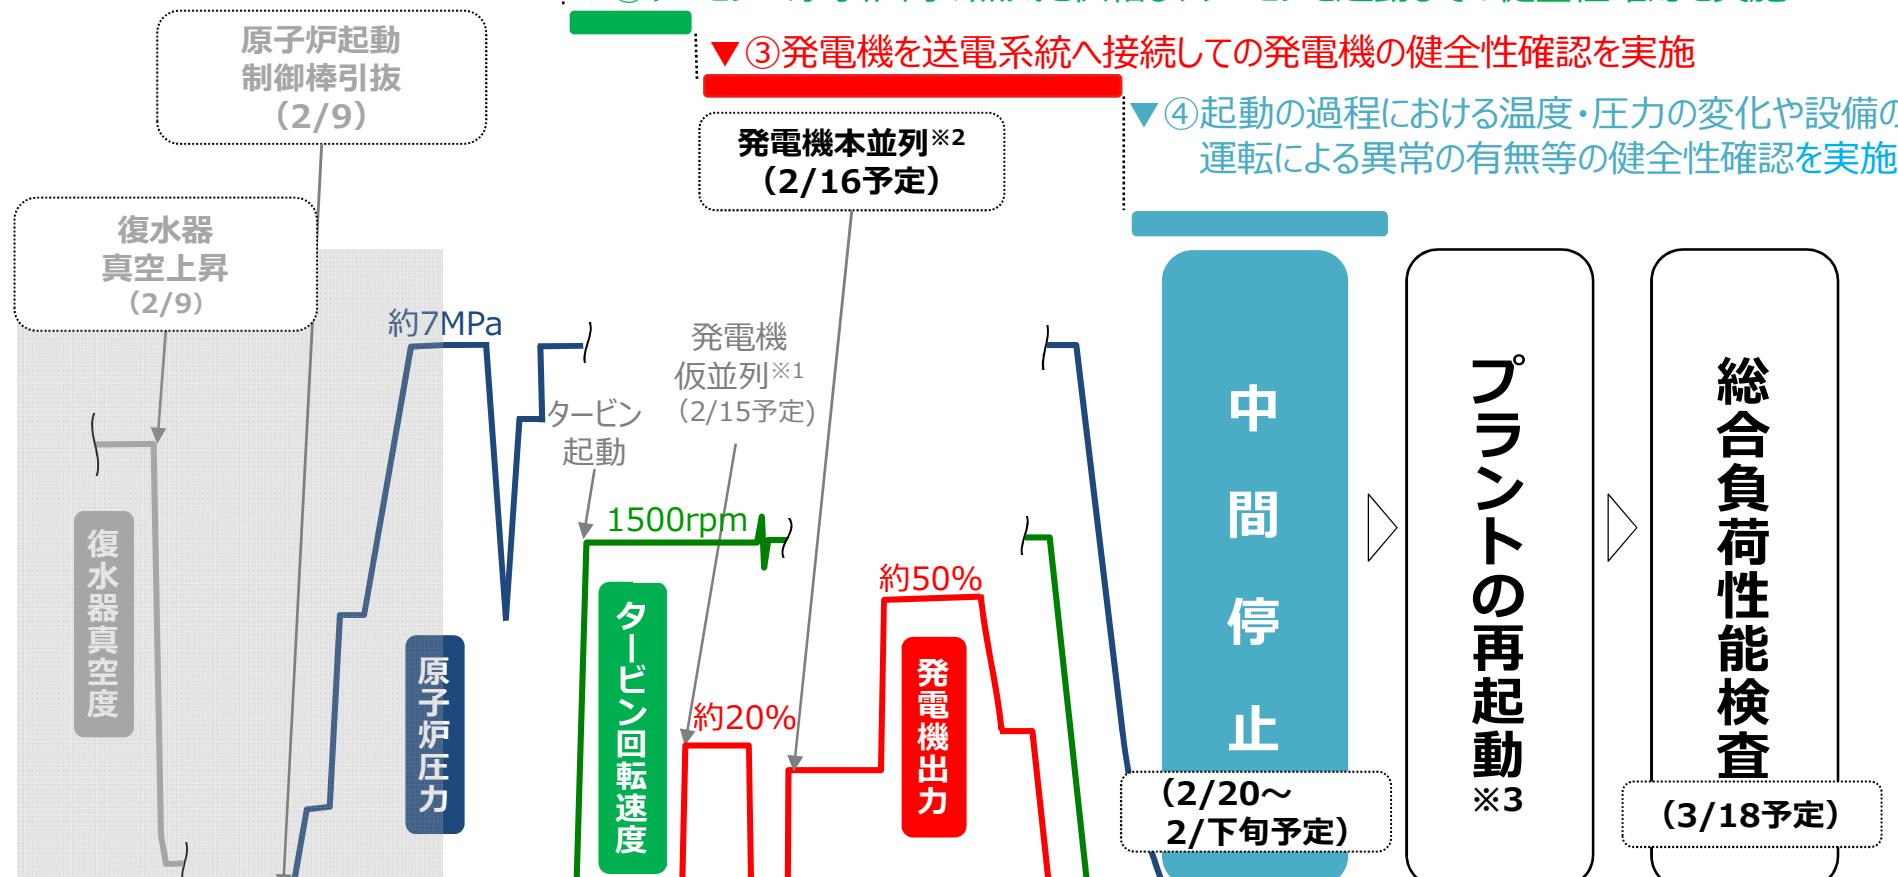

※1:発電機を試験的に送電系統へ接続  
※2:発電機を送電系統へ接続

※3:再度原子炉、タービンを起動、発電機を送電系統へ接続し、発電機出力を定格電気出力の約100%まで上昇させる
