

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋カバー解体 < 支障鉄骨撤去（コンクリート片等の小ガレキの吸引作業）の開始 >

本日、1号機原子炉建屋カバー解体工事において、ダスト飛散抑制対策の一つである散水設備設置に支障となる鉄骨等の撤去に先立ち、コンクリート片等の小ガレキ吸引作業を開始いたしました。

本日の作業は、原子炉建屋既存鉄骨梁上にあるコンクリート片等の小ガレキの吸引作業を行いました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタに有意な変動はありませんでした。

明日以降、コンクリート片等の小ガレキ吸引作業を続け、来月以降、支障鉄骨撤去を実施してまいります。


< 概要 >

作業時間（11月19日）

午前8時16分～午後0時26分



吸引装置全景

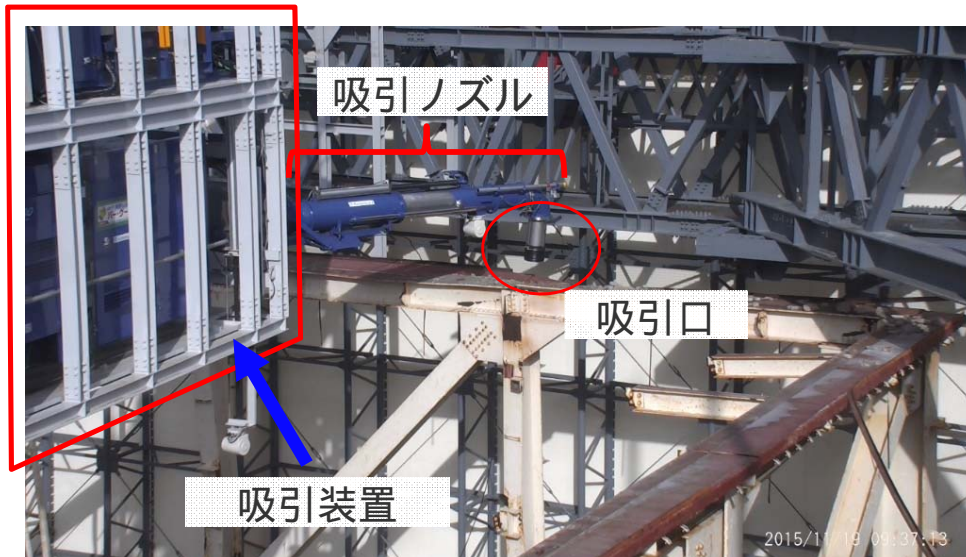

既存鉄骨梁上のコンクリート片等の小ガレキ吸引作業の様子
