

福島第一原子力発電所2号機 原子炉格納容器ガス管理システム設置工事

- [作業内容] 配管・ホース設置および可燃性ガス処理系配管へのホース接続
- [作業時間] 平成23年10月20日 12:01~13:45
- [作業体制] 当社社員 12名 (2人×3班+3名×2班)
- [被ばく線量] 6.43~8.83 mSv

■グレーチング上部作業

A.可燃性ガス処理系配管接続部



B.グレーチングへの
ホース立ち上げ部




■床作業

C. 配管~ホース接続部



D. 配管部

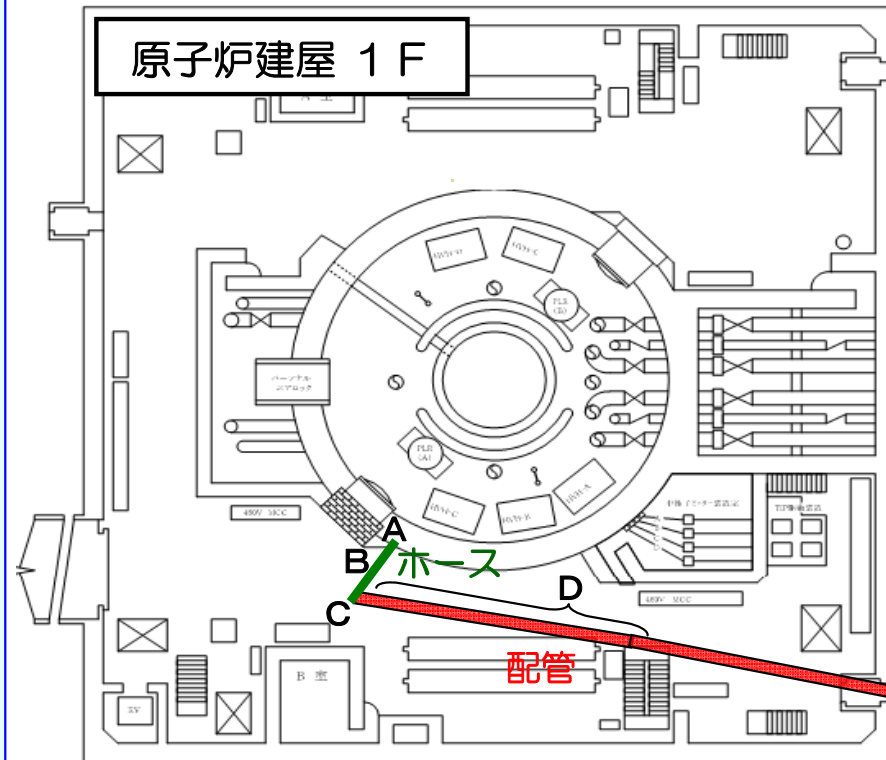

撮影者：東京電力株式会社
撮影日：平成23年10月20日
