



# 福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋地下階の 滞留水水位・温度測定結果について

< 参考資料 >  
平成24年9月20日  
東京電力株式会社

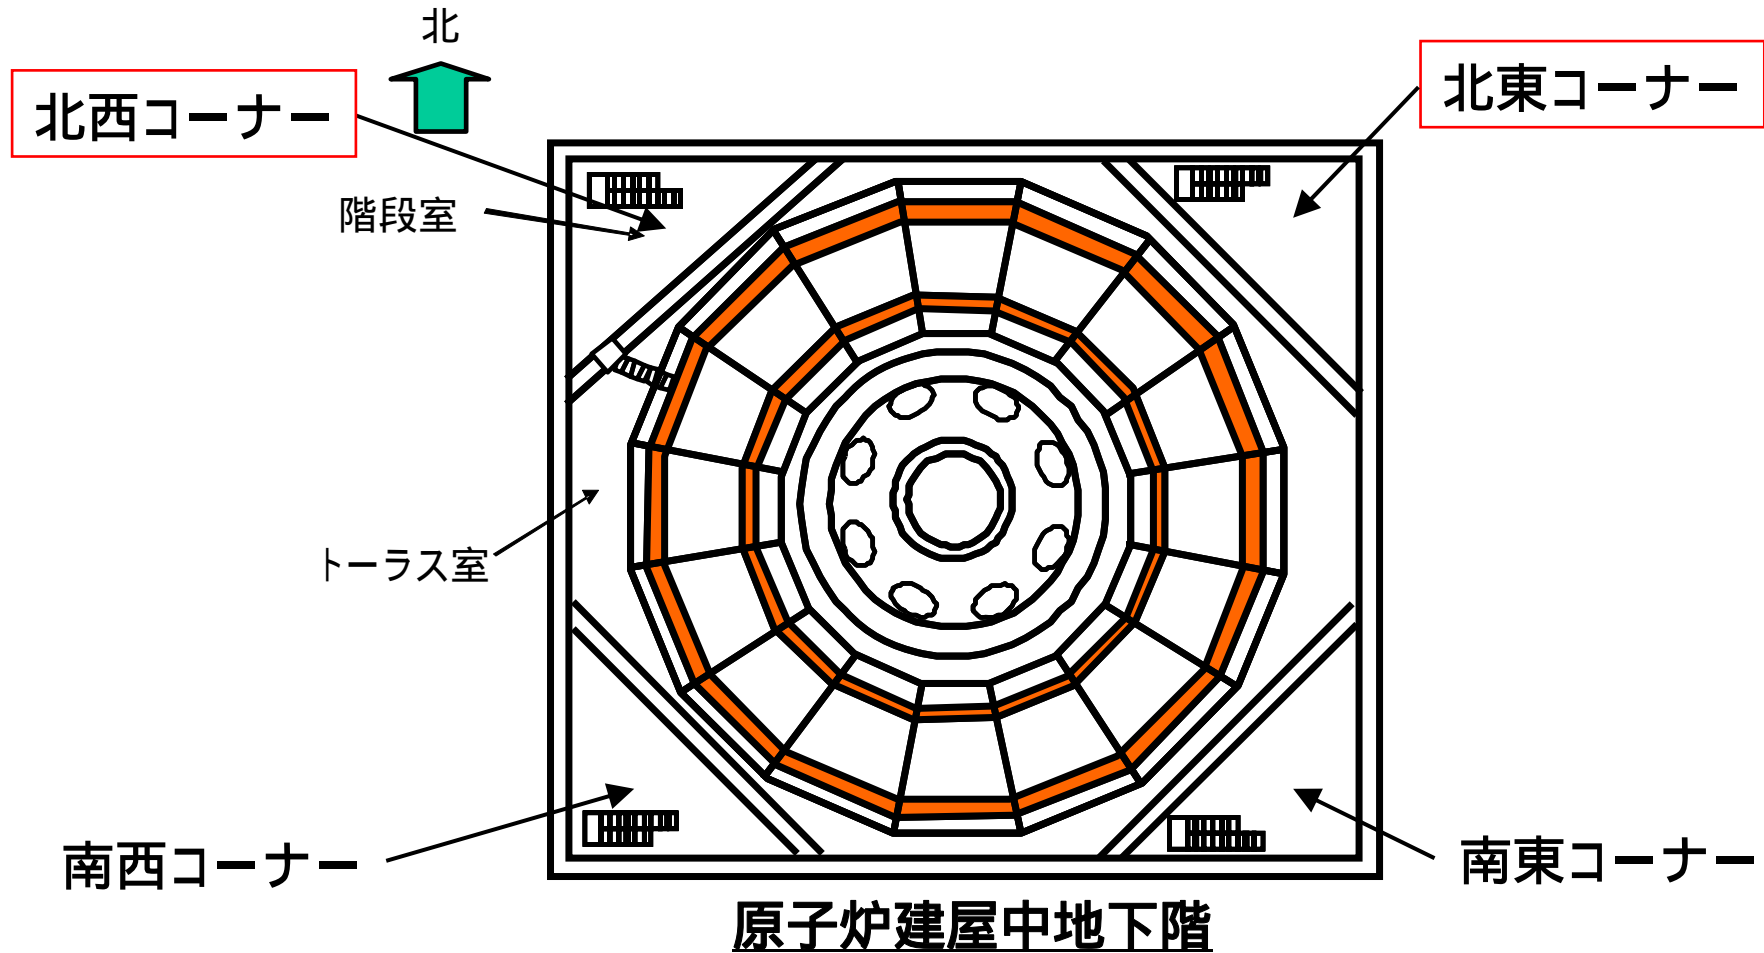

# 1号機三角コーナー測定記録(H24.9.20)

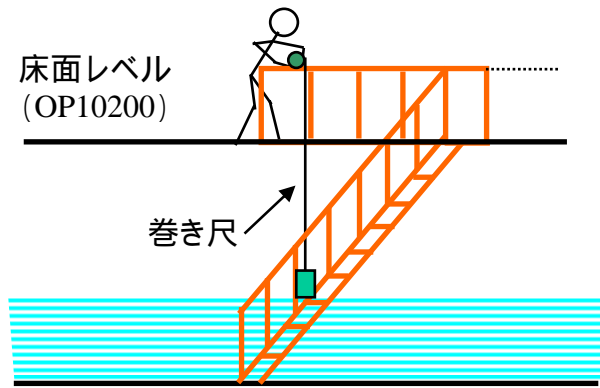

水位測定

|        | 場所     | 水位         |
|--------|--------|------------|
| 水位測定結果 | 北東コーナー | OP 3910 mm |
|        | 北西コーナー | OP 4420 mm |

|        | 場所     | 温度   |
|--------|--------|------|
| 温度測定結果 | 北東コーナー | 32.4 |
|        | 北西コーナー | 32.6 |

被ばく線量(実績)

\* 計画線量: 9 mSv

\* 実績線量: 1.72 mSv(最大)
