

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋カバー解体工事 屋根パネル戻し完了について

10月22日に着手した建屋カバー解体に向けた飛散防止
剤散布と調査が完了し、本日、取り外した2枚の屋根パネ
ルの戻しが完了しました。

本期間中、空気中の放射性物質濃度を監視しているダ
ストモニタや敷地境界に設置してあるモニタリングポス
トに有意な変動はありませんでした。

< 概要 >

■ 作業日

平成26年12月4日

■ 作業時間

(1枚目)

7時25分：吊り上げ開始

8時31分：戻し完了

(2枚目)

11時45分：吊り上げ開始


12時09分：戻し完了

屋根パネル戻し状況




福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバ―解体工事 建屋カバ―南2屋根パネルの拡大した孔の塞ぎ方について

- 拡大した孔が位置する南2屋根パネルは、南3屋根パネルに隣接します。
- 南3屋根パネルに、南2屋根パネルの拡大した孔を覆うはね出し部材を取り付け、南3屋根パネル戻しにより、南2屋根パネルの拡大した孔を上面から覆いました。

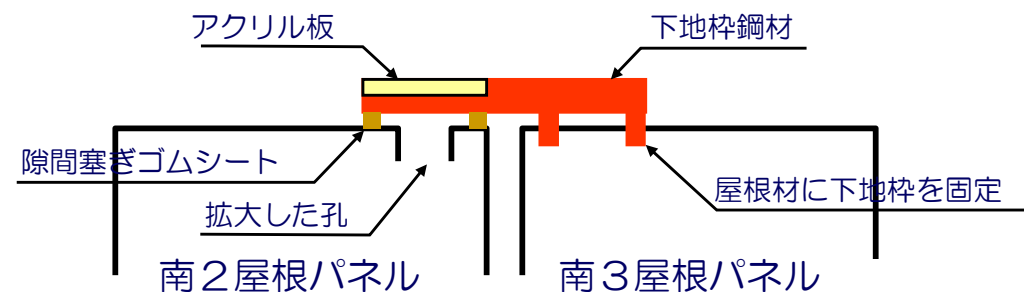

概念図（断面図）

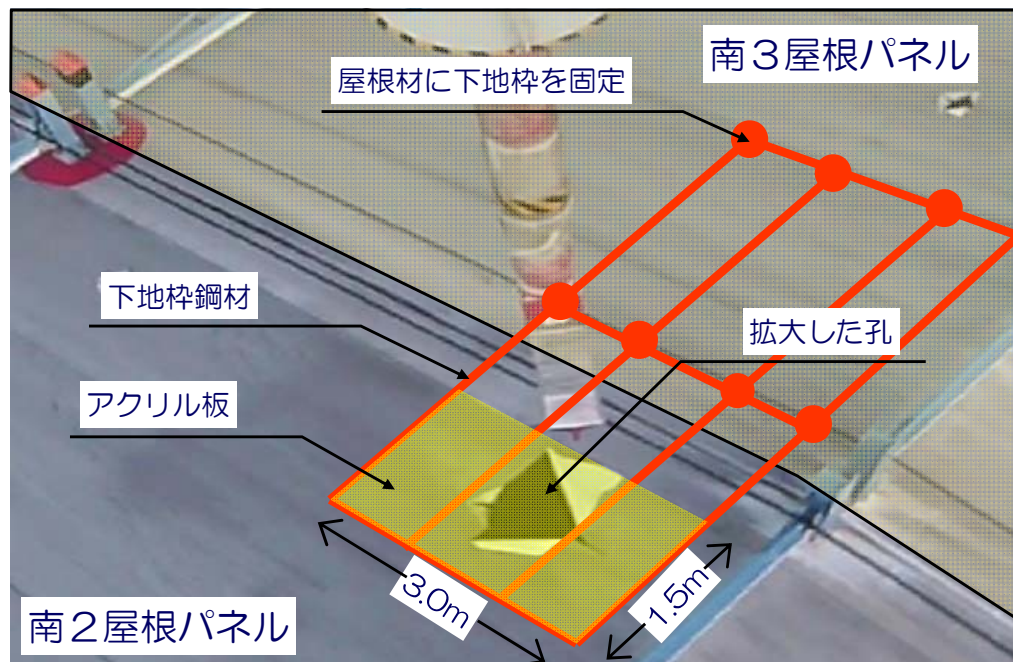

概念図（平面）



はね出し部材取り付け状況
