

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値

2025年10月30日



東京電力ホールディングス株式会社

1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的

オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度

1回/月

標準散布量

1.5L/m²以上

濃 度

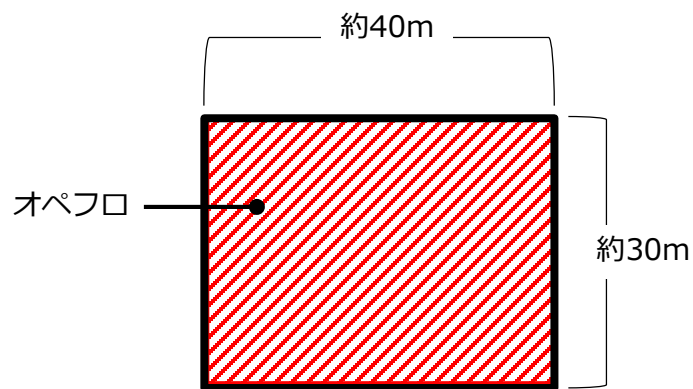
1/10

散布範囲



【凡例】

 : 散布範囲

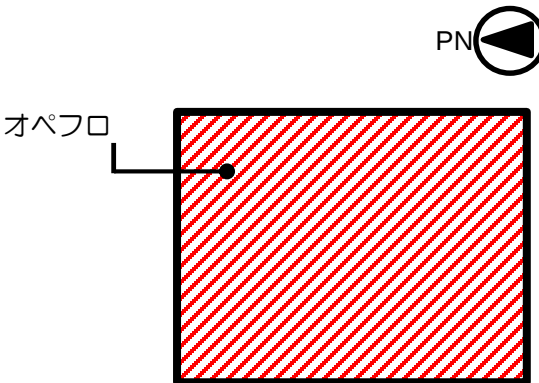
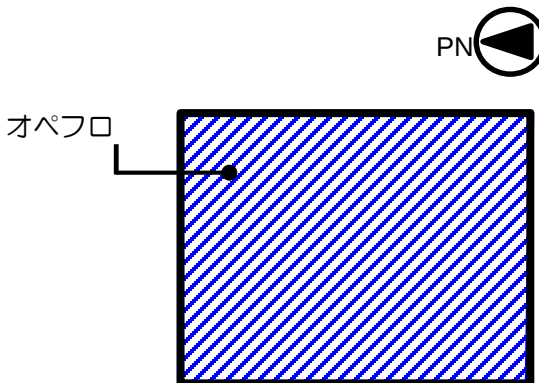
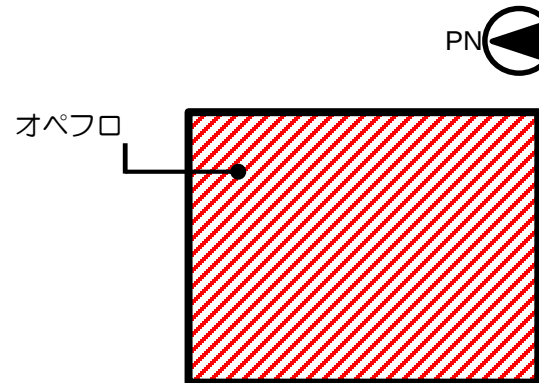


散布面積

1,234m²

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布			
目 的	オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。		
標準散布量	1.5L/m ² 以上	濃 度	1/10
散布対象 作業	ガレキ撤去		

定期散布の実績及び予定		
計画（10月）	実績（10月）	計画（11月）
完了予定日：10月 25日 	完了日：10月 25日 	完了予定日：11月 22日 

【凡例】 ：計画散布範囲 ：実績散布範囲

2025年10月28日時点

3.作業時散布の実績及び予定（1号機）

9月	月	21（日）	22（月）	23（火）	24（水）	25（木）	26（金）	27（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	5.08E-05（最大）	8.76E-05（最大）	7.16E-05（最大）	8.72E-05（最大）	5.85E-05（最大）	8.75E-05（最大）	9.54E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	火	28（日）	29（月）	30（火）	1（水）	2（木）	3（金）	4（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
10月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.09E-04（最大）	7.17E-05（最大）	8.48E-05（最大）	7.97E-05（最大）	8.23E-05（最大）	1.03E-04（最大）	7.42E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	6.24E-07（最小）	6.23E-07（最小）
	水	5（日）	6（月）	7（火）	8（水）	9（木）	10（金）	11（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.41E-05（最大）	6.91E-05（最大）	7.44E-05（最大）	9.81E-05（最大）	6.40E-05（最大）	9.03E-05（最大）	8.75E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	6.24E-07（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	木	12（日）	13（月）	14（火）	15（水）	16（木）	17（金）	18（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.96E-05（最大）	6.64E-05（最大）	7.95E-05（最大）	7.96E-05（最大）	8.22E-05（最大）	7.27E-05（最大）	7.43E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	金	19（日）	20（月）	21（火）	22（水）	23（木）	24（金）	25（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	○
	散布実施	－	－	－	－	－	－	○
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.27E-05（最大）	6.64E-05（最大）	1.01E-04（最大）	9.54E-05（最大）	9.00E-05（最大）	1.01E-04（最大）	8.49E-05（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）	ND（最小）
	土	26（日）	27（月）	28（火）	29（水）	30（木）	31（金）	1（土）
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布予定	－	－	－	－	－	－	－
	散布実施	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	7.94E-05（最大）	8.40E-05（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）	－（最大）
		ND（最小）	ND（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）	－（最小）

※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

2025年10月28日時点
