

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 2号機及び3号機原子炉压力容器と
原子炉再循環系配管の接続部の点検終了について

平成 15 年 5 月 8 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所


当社は、原子炉压力容器と原子炉再循環系配管の接続部について、近年(約5年間)点検を行っていない溶接線についても点検を実施することとし、準備が整ったプラントから順次点検を開始しております。

(4月1日お知らせ済み)

当所2号機は4月16日から、また3号機は4月11日から当該溶接部の点検を開始していましたが、昨日までに全ての点検が終了しましたのでお知らせいたします。なお、点検を実施した接続部各々6箇所、計12箇所について、ひびは確認されませんでした。

以 上


柏崎刈羽原子力発電所 2号機
 原子炉压力容器と原子炉再循環系配管の接続部点検状況

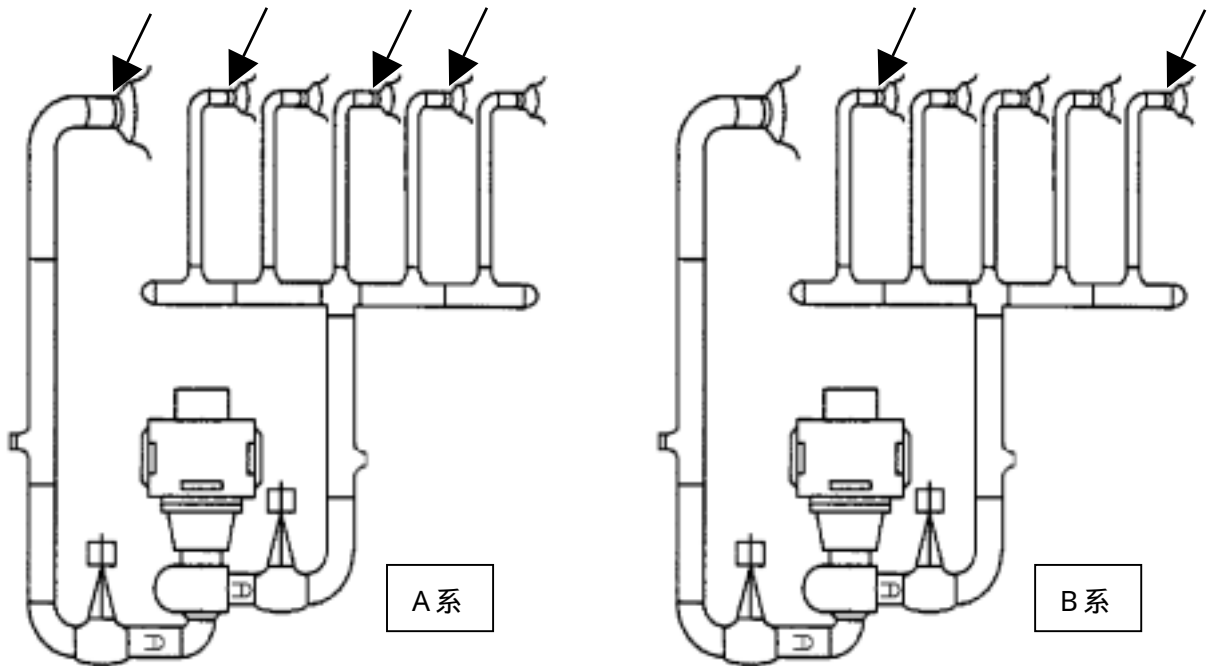

	未点検箇所	近年(約5年間) 点検(ISI)を実施 していない箇所	今定期検査での 点検(ISI)箇所	点検数 / 総数
A系	0	2	2	4 / 6
B系	0	1	1	2 / 6

(ISI) : 供用期間中検査

柏崎刈羽原子力発電所 3号機
 原子炉压力容器と原子炉再循環系配管の接続部点検状況

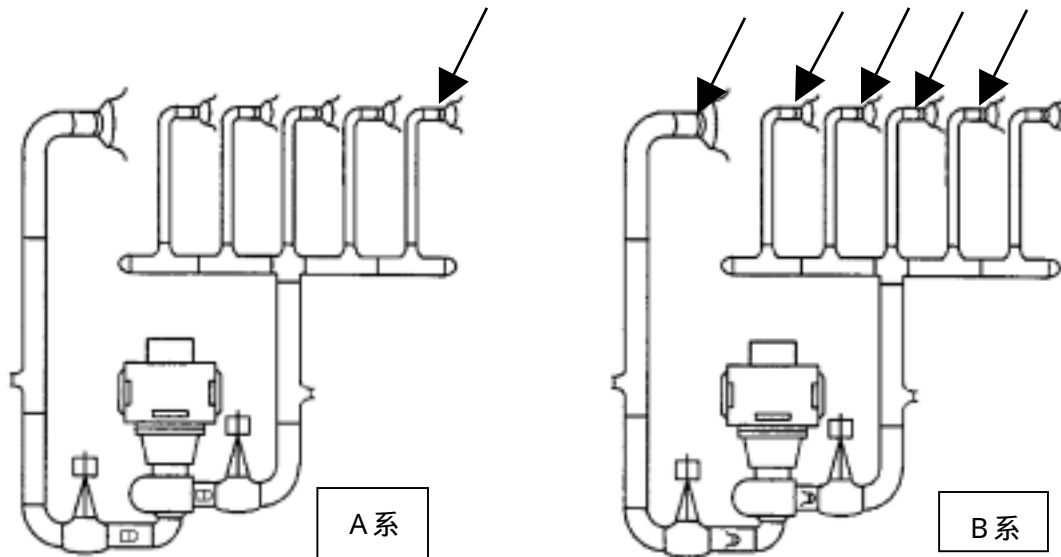

	未点検箇所	近年(約5年間) 点検(ISI)を実施 していない箇所	今定期検査での 点検(ISI)箇所	点検数 / 総数
B系	3	0	2	5 / 6

(ISI) : 供用期間中検査
