
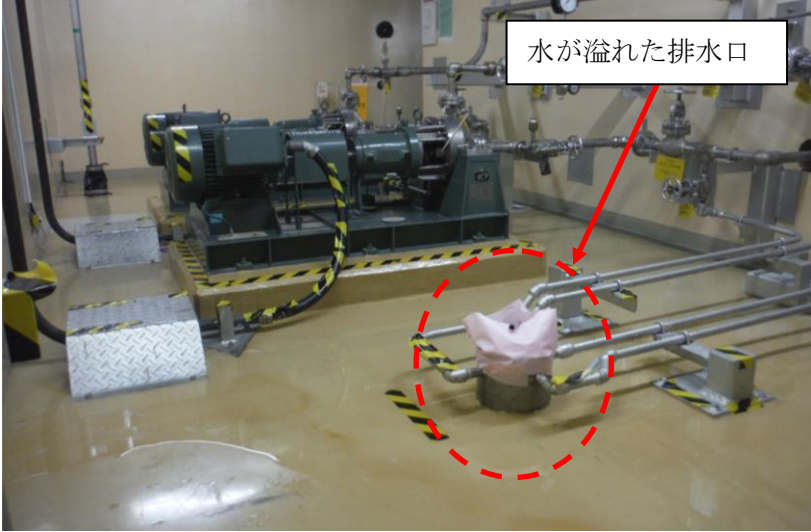


区分：Ⅲ

号機	1号機	
件名	原子炉複合建屋（管理区域）における水の漏えいについて	
不適合の概要	<p>2023年7月21日午後11時16分頃、1号機原子炉複合建屋*地下3階の蒸留水ポンプ・タンクエリアにおいて、タンクの水抜き作業を行っていた協力企業作業員が、水たまりを確認しました。</p> <p>その後、タンクから排水するための弁を閉止し、水の漏えいは停止しました。漏えい量は約240Lと推計しています。</p> <p>現場を調査したところ、排水配管の詰まりにより排水口から水が溢れたものと推定しております。</p> <p>なお、漏えい水から放射能は検出されておらず、外部への放射能の影響はありません。</p> <p>*原子炉複合建屋：原子炉建屋の廻りに、廃棄物処理設備等を収納した建屋</p> <p style="text-align: center;">＜現場状況＞</p>  <p style="text-align: center;">水が溢れた排水口</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>＜安全上の重要度＞</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p>＜損傷の程度＞</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	今後、原因調査と再発防止を検討してまいります。	

1号機 原子炉複合建屋（管理区域）における水の漏えいについて

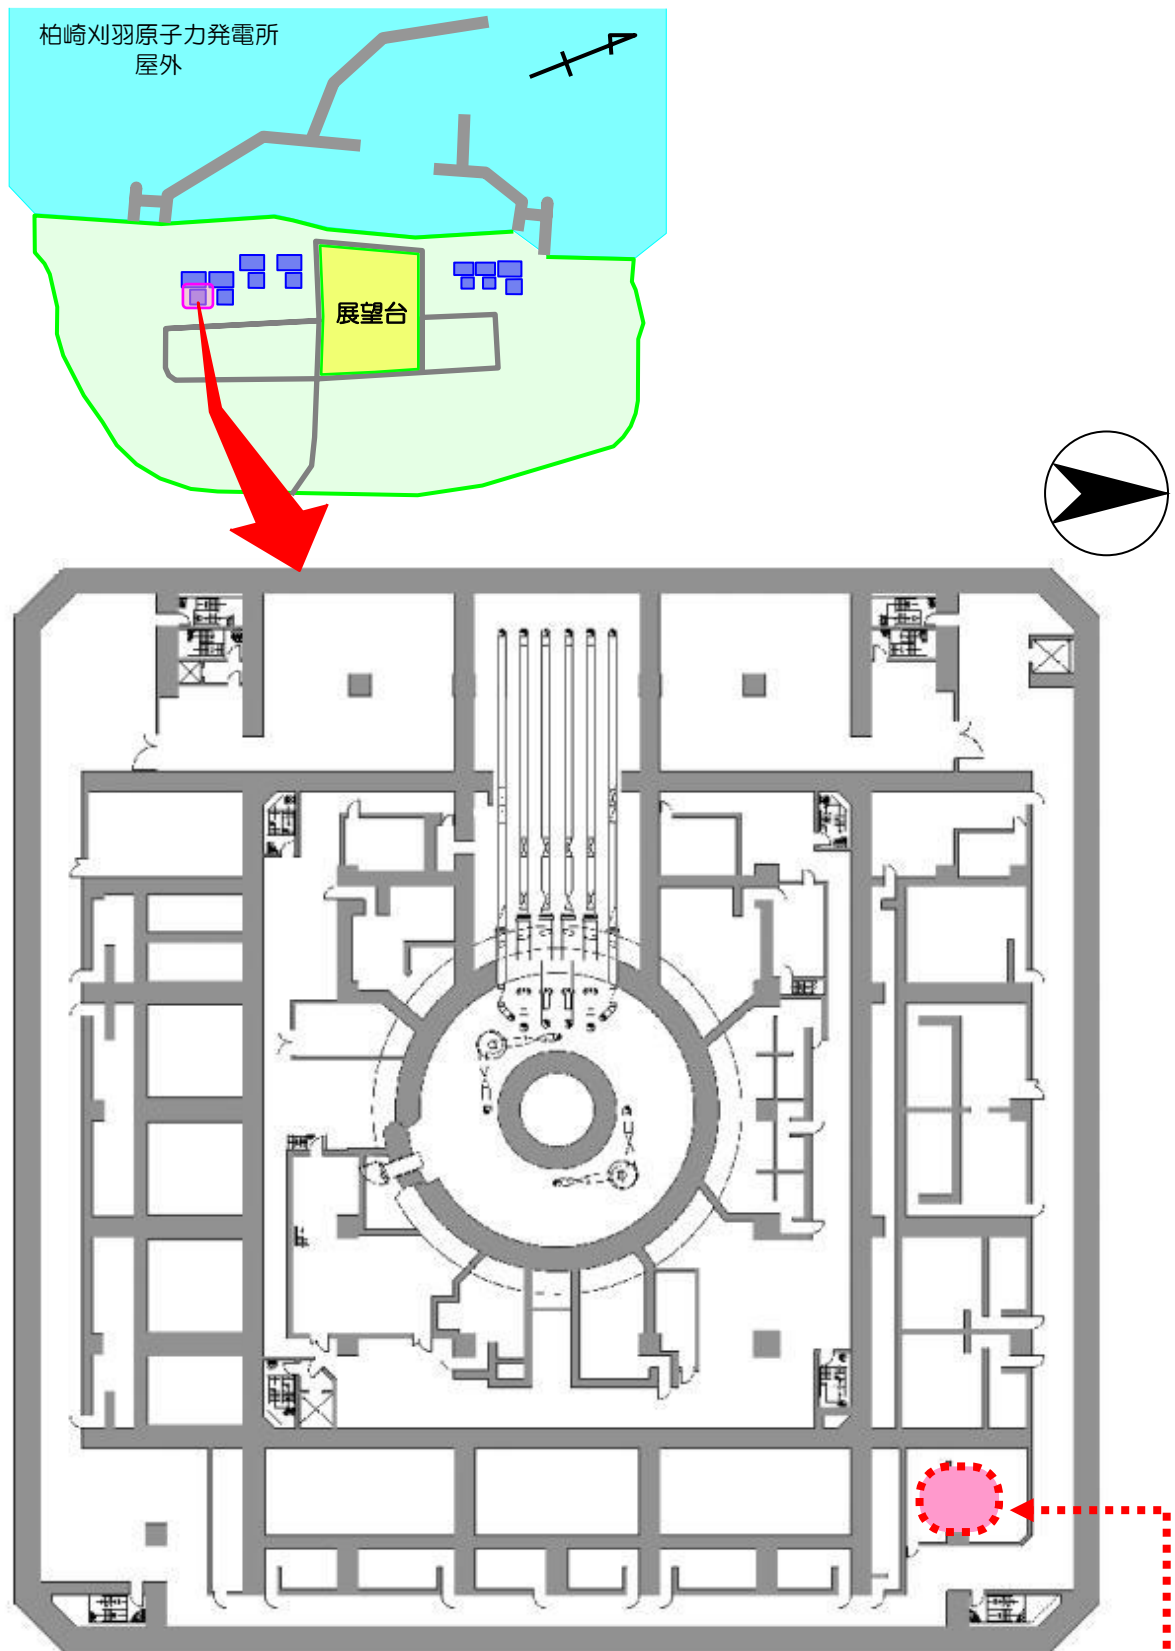

柏崎刈羽原子力発電所 1号機 原子炉複合建屋 地下3階
