


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

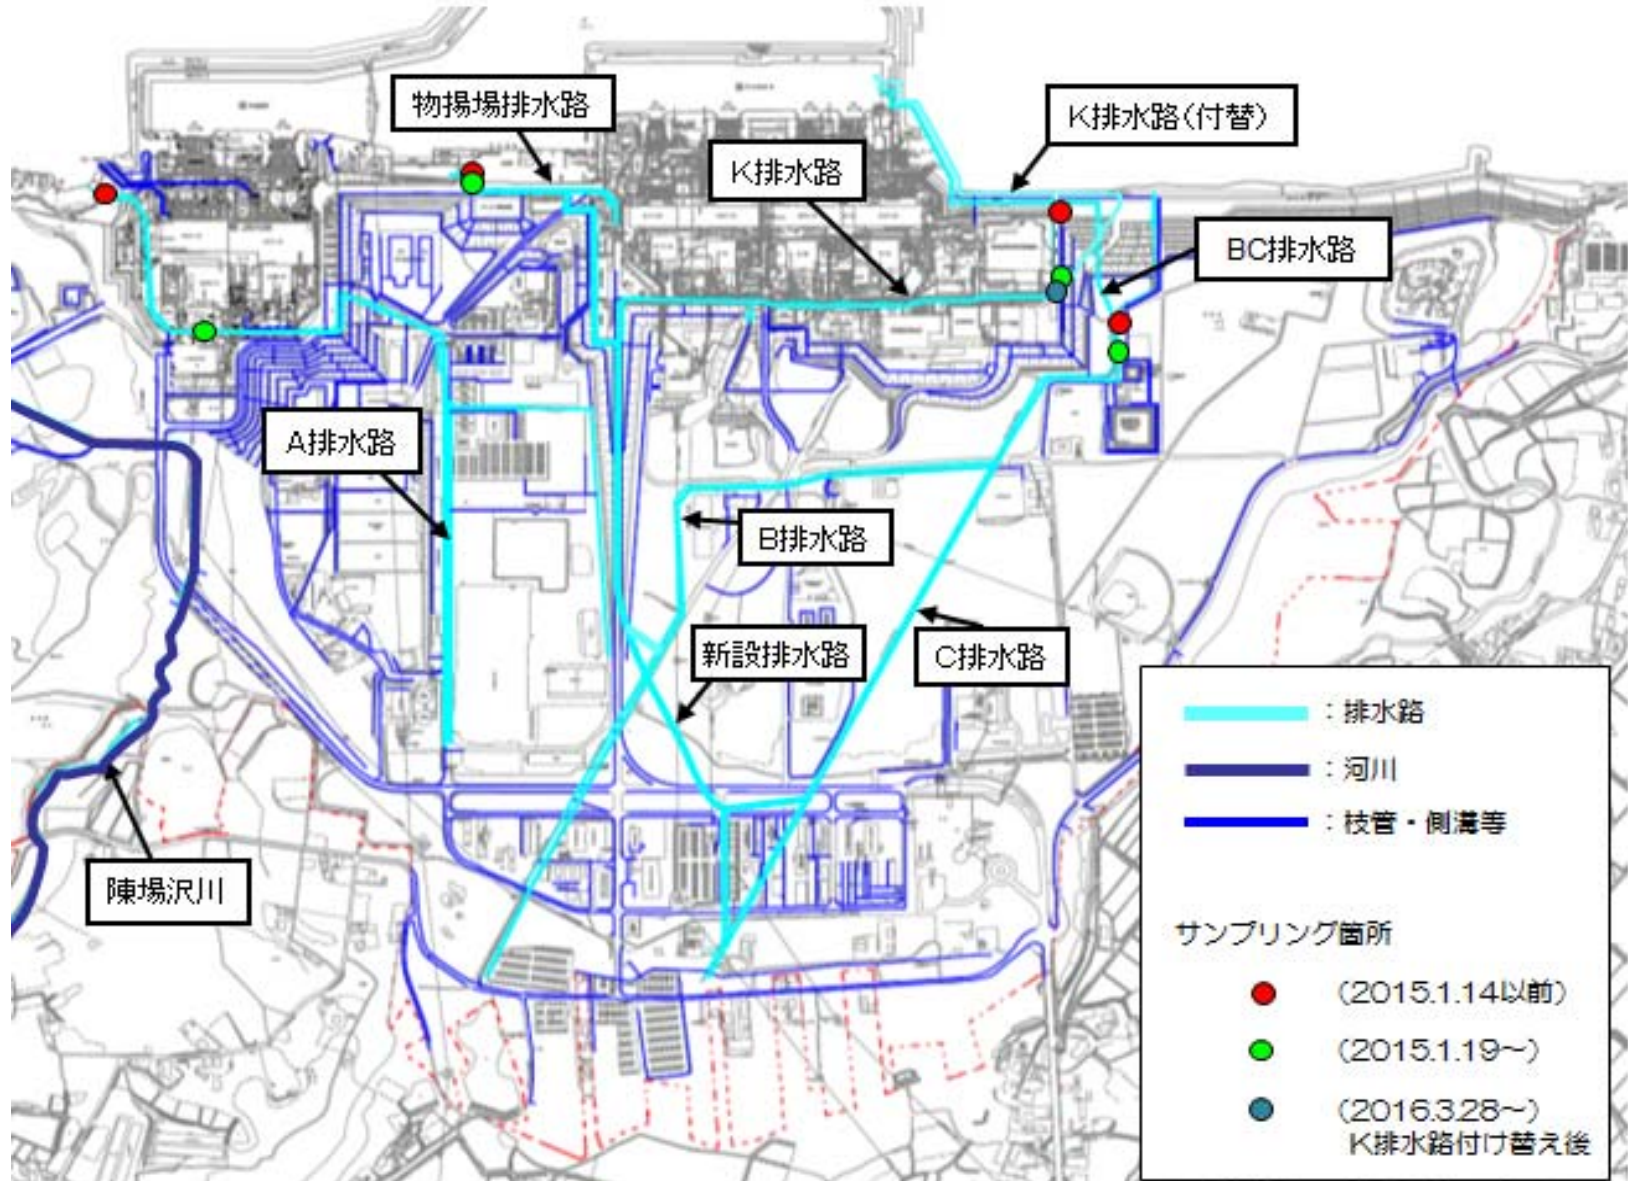

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1/2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
採取時刻	7:00	7:00	8:06	7:00	7:00	7:00	7:00	8:09	8:10	7:46	9:07	8:15	8:05	※1
降雨量(mm/日)	0.5	1.5	0	0	0	8.5	10.5	0.5	1.5	0	0	0	8.5	10.5
流量(m ³ /秒)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.009	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.009	0.011
Cs-134(約2年)	0.62	0.78	ND(0.59)	ND(0.64)	0.82	ND(0.63)	ND(0.82)	ND(0.59)	ND(0.92)	ND(0.67)	ND(0.73)	ND(0.62)	ND(0.54)	※1
Cs-137(約30年)	5.7	8.2	3.9	3.5	6.0	7.3	4.5	2.2	1.7	2.1	2.3	2.6	2.3	※1
全β	12	8.2	7.8	6.0	11	15	8.7	ND(3.9)	ND(4.4)	ND(3.7)	5.5	3.4	4.1	※1
H-3(約12年)	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	ND(7.4)	—

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	※2	7:15	7:42	7:35	6:42	7:35	7:10	※1
降雨量(mm/日)	0.5	1.5	0	0	0	8.5	10.5	0.5	1.5	0	0	0	8.5	10.5
流量(m ³ /秒)	0.015	0.017	0.015	0.014	0.013	0.014	0.021	0.011	0.011	0.013	0.009	0.010	0.009	0.014
Cs-134(約2年)	1.1	1.0	ND(0.88)	0.79	ND(0.98)	0.93	※2	ND(0.72)	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(0.76)	ND(0.65)	ND(0.67)	※1
Cs-137(約30年)	9.0	9.1	9.1	7.3	7.2	8.4	※2	0.82	ND(0.78)	ND(0.81)	ND(0.91)	ND(0.65)	ND(0.81)	※1
全β	18	15	13	12	14	12	※2	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(4.4)	※1
H-3(約12年)	—	—	—	—	—	140	—	—	—	—	—	—	ND(7.4)	—

* 太枠内が今回公表データ。他は9月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※1 悪天候により採取中止。

※2 採取装置不具合により採取できず。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
採取日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日			9月8日	9月9日	9月10日	9月11日		
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00			7:53	7:35	7:23	7:38		
降雨量(mm/日)	6	0	0	1.5			6	0	0	1.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	1.2	0.67	0.92			ND(0.55)	ND(0.65)	ND(0.76)	ND(0.64)		
Cs-137(約30年)	6.7	8.5	4.3	2.9			2.4	0.86	ND(0.79)	1.4		
全β	13	11	10	5.7			7.6	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(3.7)		
H-3(約12年)	—	—	—	—			—	—	—	—		

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
採取日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日			9月8日	9月9日	9月10日	9月11日		
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00			6:48	7:00	7:02	6:30		
降雨量(mm/日)	6	0	0	1.5			6	0	0	1.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	3.0	ND(0.88)	ND(0.84)	0.81			ND(0.61)	ND(0.58)	ND(0.75)	ND(0.73)		
Cs-137(約30年)	21	6.8	5.1	5.7			1.6	2.1	1.8	0.88		
全β	39	10	8.0	9.6			20	15	12	7.6		
H-3(約12年)	—	—	—	—			—	—	—	—		

* 太枠内が今回公表データ。他は9月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全β	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。
