

福島第一原子力発電所 雑固体廃棄物焼却設備建屋の 基礎コンクリート打設開始について


< 参考資料 >
平成25年6月28日
東京電力株式会社

雑固体廃棄物焼却設備建屋の工事については、平成25年5月に着手し、基礎の鉄筋の配筋を進めて参りましたが、配筋等の準備が整ったため、6月29日より基礎のコンクリートの打設を開始致します。

今後、基礎工事、建物工事、焼却設備の設置等の工程を経て、平成26年度中の運用開始に向けて、工事を進めてまいります。



雑固体廃棄物焼却設備建屋 イメージ図

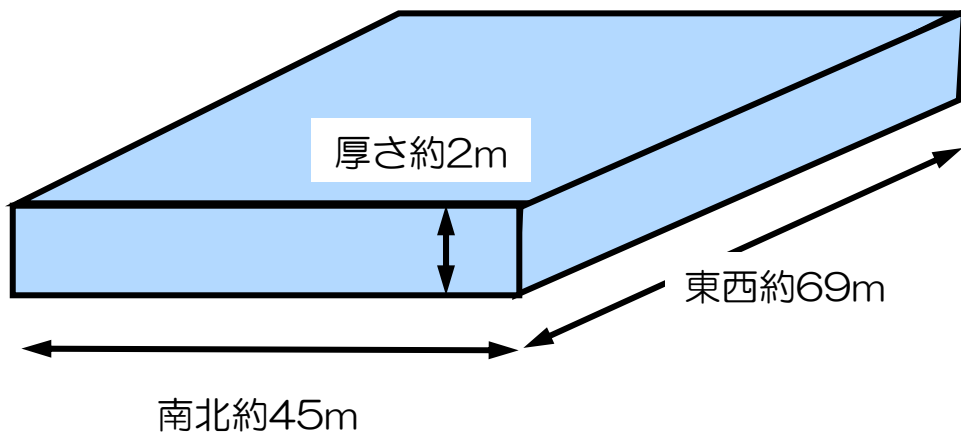

基礎概形イメージ図



基礎の配筋状況

撮影日：平成25年6月26日

6月29日より 基礎のコンクリート打設を開始します。
総打設量は約6,300m³で、1日あたりのコンクリート打設量は
約200m³～約400m³を予定しています。
