



2号機 原子炉水位 / 压力仮設計器水張り後の傾向監視

平成23年6月25日
東京電力株式会社

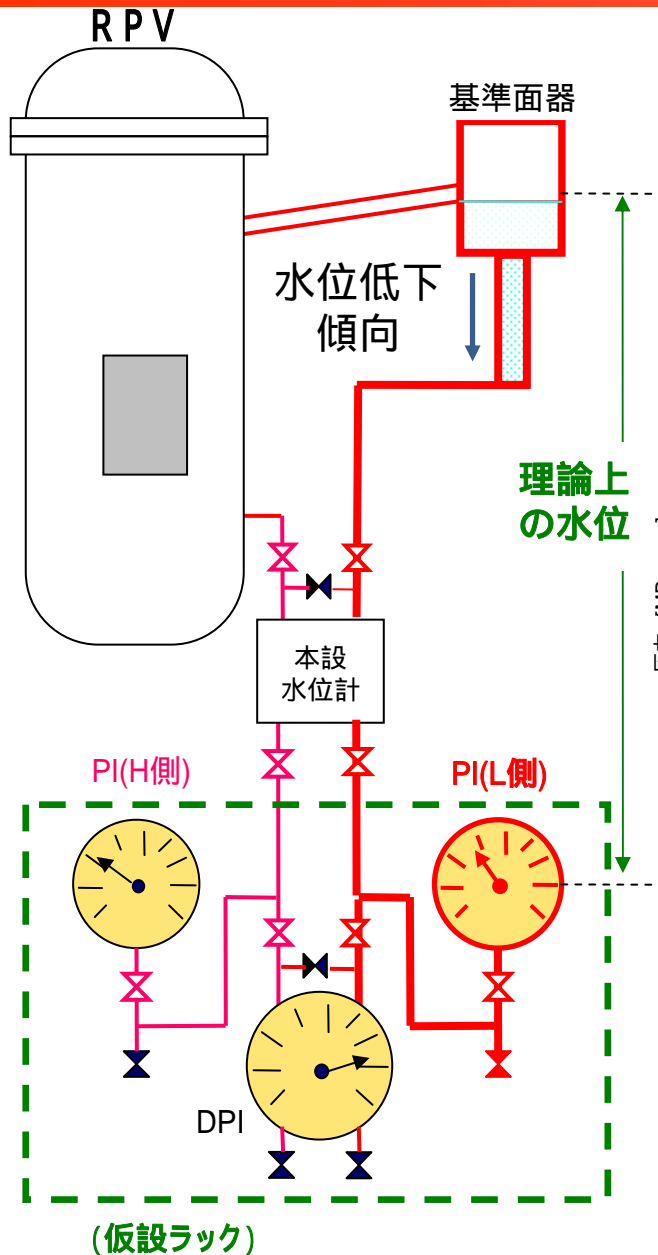

仮設水位計等の水張りを実施した結果、基準面器計器配管の水位が理論上の水位より下回っており、かつ継続的に低下していることが判明

2号機 仮設圧力計指示トレンド

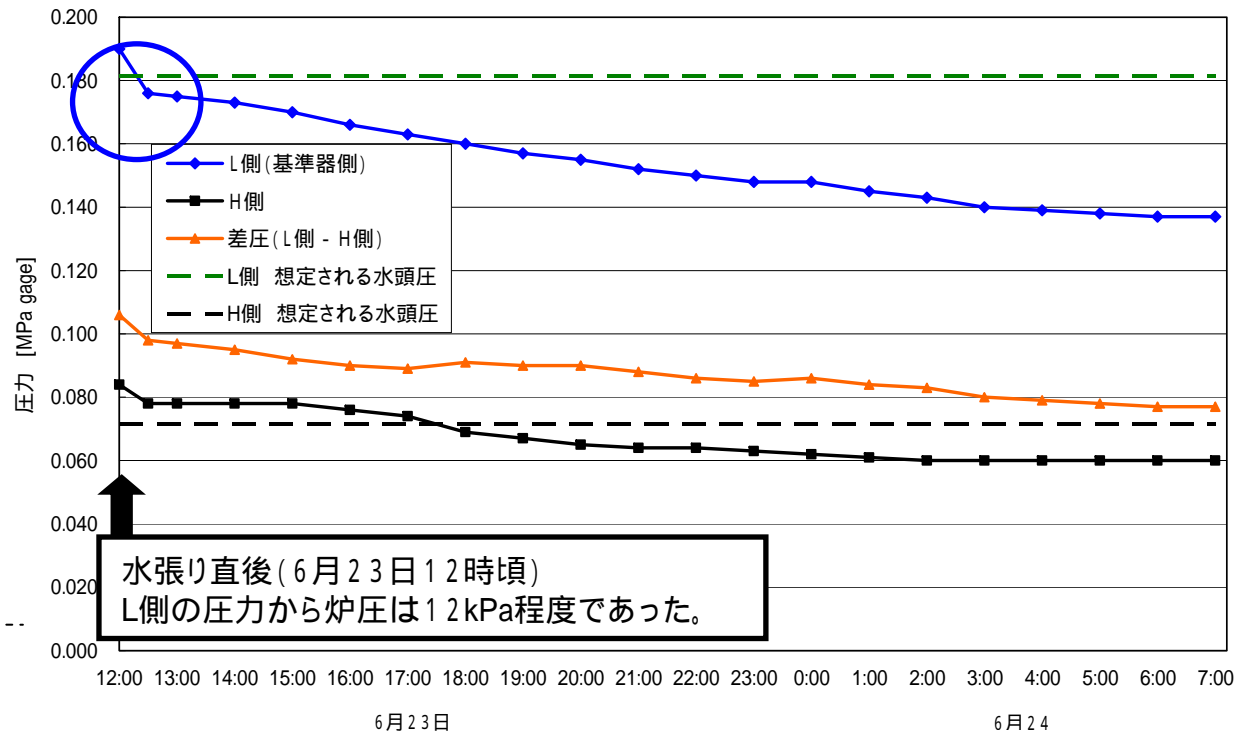

配管からの漏えいや弁のシートパス等の可能性も考えられたが、L側 (基準面器側) およびH側ともに継続的な低下が見られることから【PCV温度の影響による蒸発】の可能性が高い
