


セシウム吸着装置の信頼性向上工事について

■目的

セシウム吸着装置の各スキッドのポンプは、スキッド内の高線量・狭隘部に設置されており、保守作業性（交換作業性）が悪いため、現状のスキッド外にポンプスキッドを増設し、保守作業性の向上を図る。

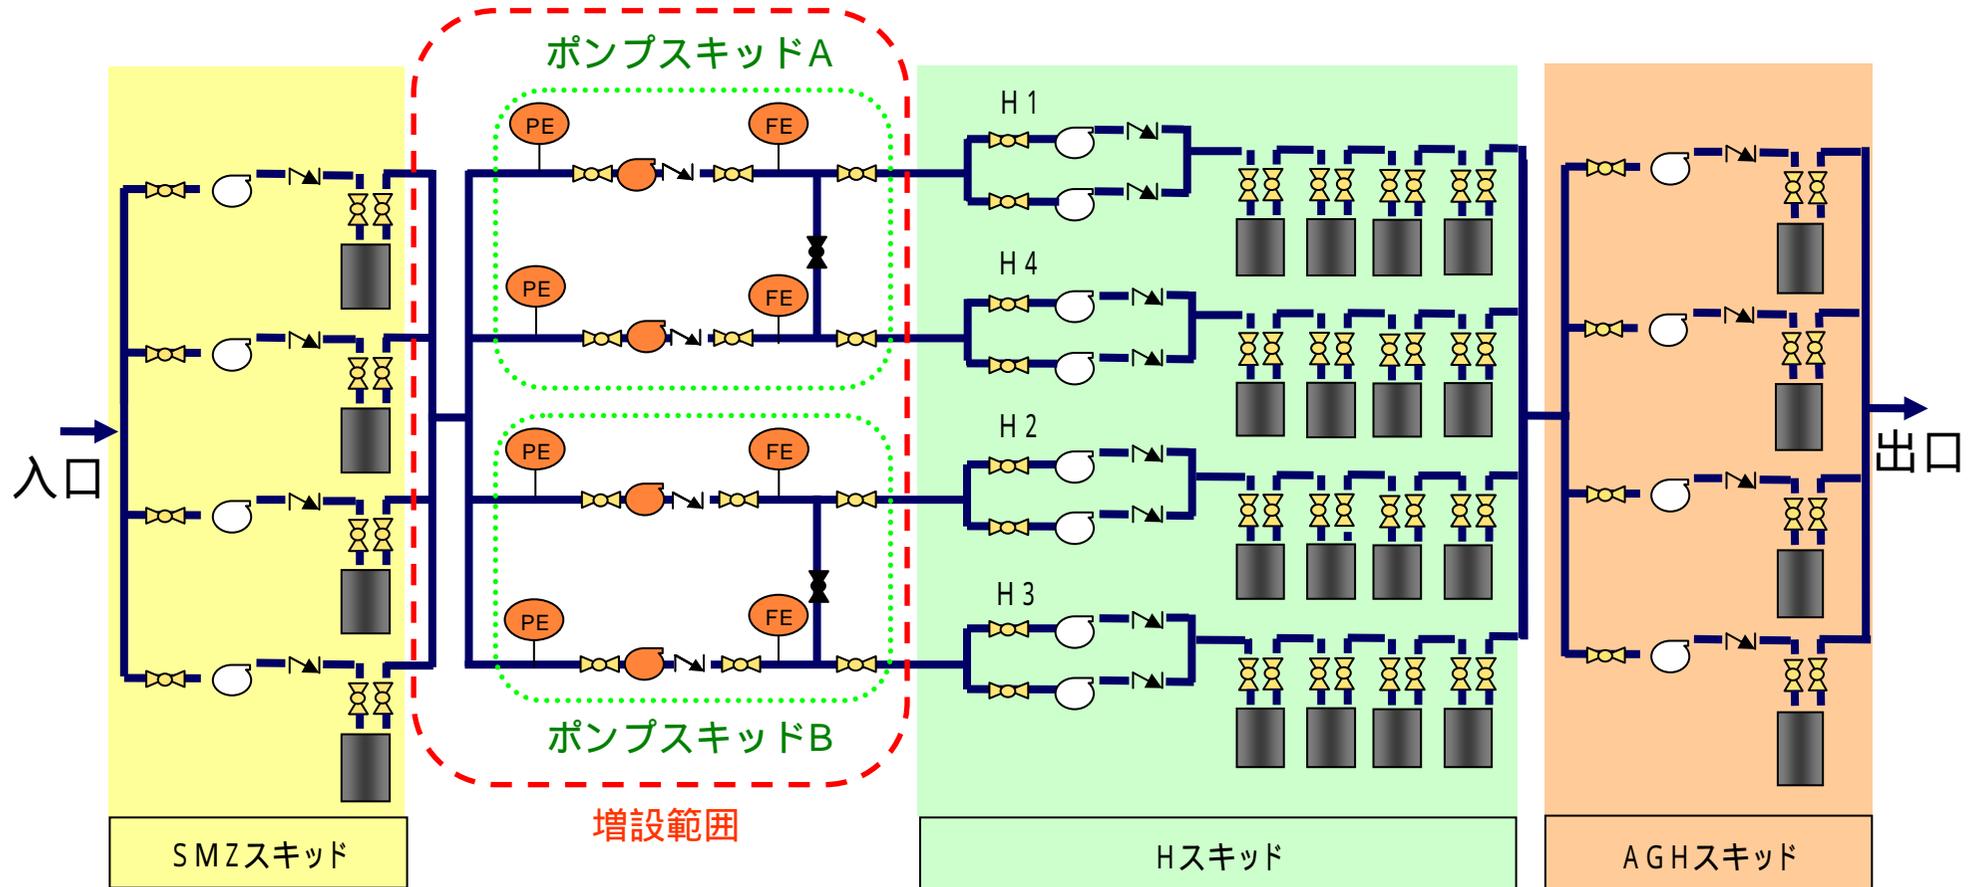

■ 工事概要

- 外付ポンプ等の追設。
- ポンプ・弁・計測器はユニット化し、スキッド内に収納。
- スキッドには漏えい検知装置を設置。

■ 工程（計画）

施工期間：5月15日～6月上旬（予定）

■ 概略機器配置

