



福島第一原子力発電所 5号機における残留熱除去海水系ポンプ(A)の点検結果について

< 参考資料 >
平成24年10月1日
東京電力株式会社

< 概要 >

- 平成24年9月上旬より流量低下が確認され、起動と停止を繰り返しながら状況を確認していた5号機残留熱除去海水系ポンプ(A)について、吸込部の分解点検を実施。
- 点検の結果、残留熱除去海水系ポンプ(A)にビニール片、プラスチック片を確認したため除去。
- 他に異常は確認されなかったため、平成24年10月2日、残留熱除去海水系ポンプ(A)の試運転を実施予定。

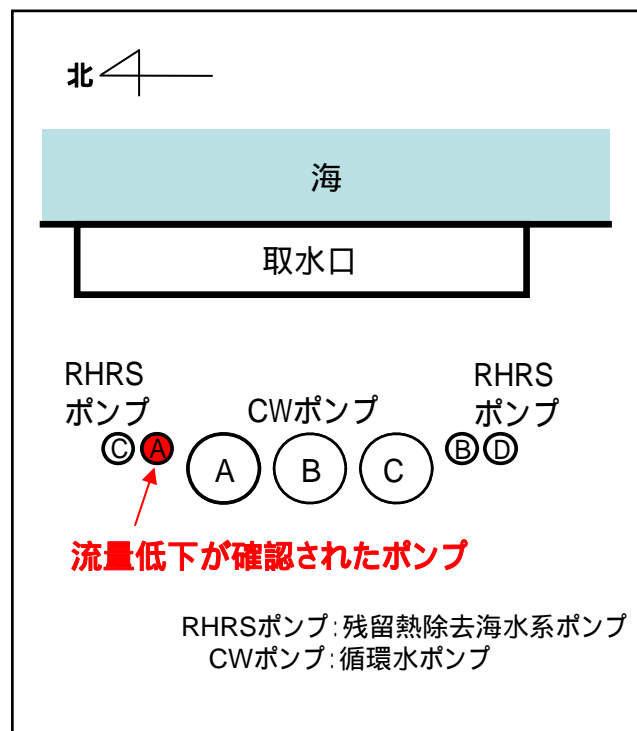

ポンプ全体図



ポンプ吸込部



ポンプ吸込部拡大
(吸込部取り外し前に撮影)



吸込部の裏側の状況
(吸込部取り外し後、裏側より撮影)



ポンプ本体側の状況
(吸込部取り外し後、ポンプ本体側を撮影)

撮影日: 平成24年9月18日
撮影者: 東京電力株式会社
