


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月			6月			7月		8月	備考	
			22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下		
防護装備	1	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化運用開始(2016年3月8日) Green zoneの拡大(2018年5月8日) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※(運用範囲の拡大等) <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。</p>	検討・設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討													
			現場作業	<p>実績反映</p> <p>▼5/8 Green zoneの拡大 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化</p>													
人身安全	2	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 2017年度災害発生状況、2018年度安全活動計画(4/26公表) 熱中症予防対策の実施(4~10月) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) 熱中症予防対策の実施(4~10月) 	現場作業	<p>▼2017年度災害発生状況、2018年度安全活動計画(4/26公表) 情報共有、安全施策の検討・評価</p> <p>熱中症予防対策の実施(4~10月)</p>													
			現場作業	健康相談受付													
健康管理	3	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 	現場作業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用清算手続き													
			現場作業	1F救急医療室の7~9月の務医師調整													
健康管理	4	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の2018年6月までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-30)支援医師) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の7~9月の勤務医師調整 	検討・設計	1F救急医療室の7~9月の務医師調整													
			現場作業	1F救急医療室6月までの医師確保完了													
要員管理、労働環境改善	5	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 	検討・設計	<p>▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼</p> <p>▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽</p> <p>▽作業員の確保状況調査依頼</p>													
			現場作業	<p>作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計</p> <p>作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計</p> <p>作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計</p>													
労働環境改善	6	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック 相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 	検討・設計	労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック													
			現場作業														
車内点検整備	7	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 未点検の構内専用車両の整備の実施 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定 未点検の構内専用車両の整備の実施 	検討・設計	<p>未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(5月分)</p> <p>未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(6月分)</p> <p>未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(7月分)未点検の構内専用車両の整備計画の検討・策定(8月分)</p>													
			現場作業	未点検の構内専用車両の整備の実施													

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		4月		5月			6月			7月	8月	備考
			22	29	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	

更新

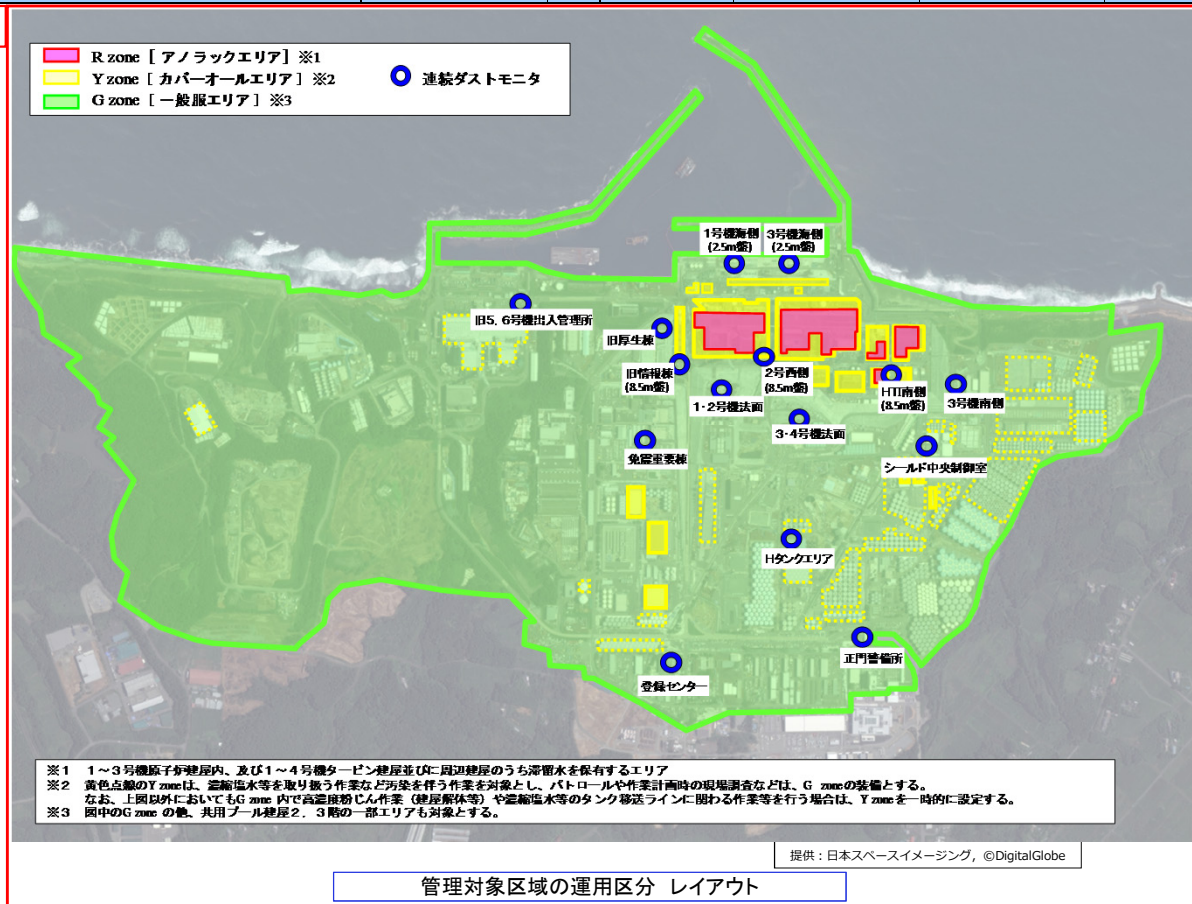

労働環境改善
