循環注水冷却スケジュール（1/1）

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	（実　績） ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業
		海水腐食及び塩分除去対策	（実　績） ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）	現場作業
	原子炉格納容器関連	窒素充填	（実　績） ・【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入 －連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業
	原子炉格納容器関連	PCVガス管理	（実　績） ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：2026/3/5 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　B系：2026/3/6 （予　定） ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　　A系：2026/4/下旬 ・水素モニタ停止　　B系：2026/5/中旬 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：2026/4/13	現場作業
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	（実　績） ・【共通】循環冷却中（継続） ・2号機SFP循環冷却設備計装品定例点検 ・SFP循環冷却設備冷却停止 ・電気設備点検手入工事（電源盤点検） 二次系全停：2026/3/16～2026/3/23 （予　定） ・【1号機】 ・1号機 SFP循環冷却設備機械品点検(弁点検，配管点検) ・1号機 SFP循環冷却設備計装品定例点検 ・電気設備点検手入工事（電源盤点検） 一次系全停：2026/3/9～2026/3/31	現場作業
		使用済燃料プールへの注水冷却	（実　績） ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業
		海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	（実　績） ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業

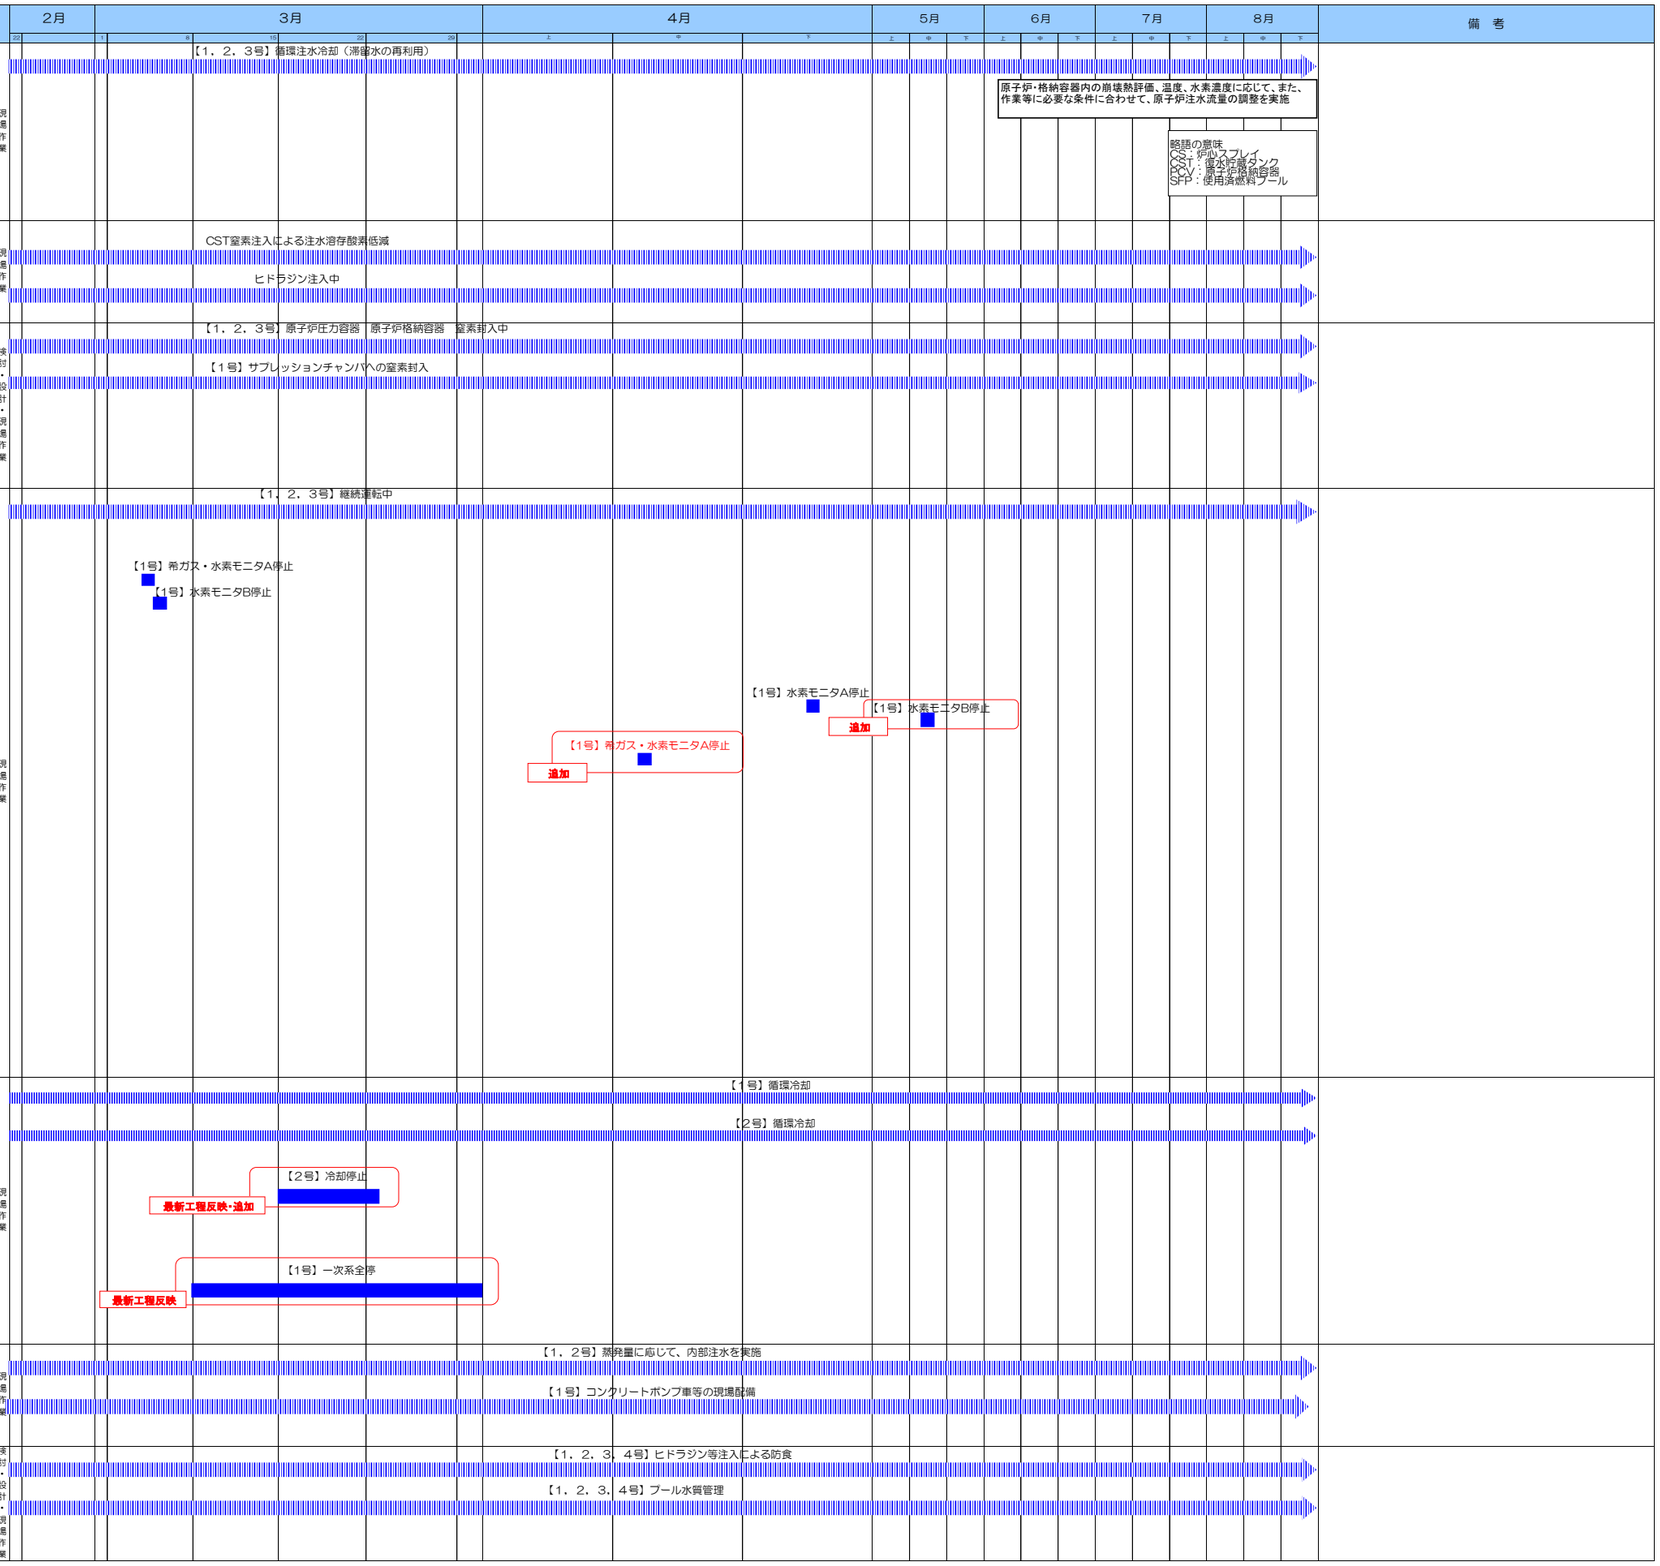

備　考

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：復水貯蔵タンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール
