
東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野
2026/10/29 現在

汚染水対策スケジュール（1／1）

分野名	括り	廃炉中長期実行プラン2026目標工程	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降	備　考
汚染水対策分野		●建屋滞留水の処理	建屋内滞留水	【1～4号機　滞留水移送装置】 （実績・予定） ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業		1～4号機滞留水移送装置設置　運転						（継続運転）	プロセス主建屋・高温焼却炉建屋滞留水移送装置の設置に係る実施計画変更（2025年6月27日認可）
				【α核種除去設備検討】	設計・工事		詳細設計・工事						（2027年度工事完了予定）	α核種除去設備の設置に係る実施計画変更（2024年6月27日申請）
				【1～4号機　T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討		設計検討							
				【滞留水一時貯留設備】	設計・工事		詳細設計・工事						（2027年度工事完了予定）	建屋滞留水一時貯留設備の設置に係る実施計画変更（2025年1月21日認可）
				【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土嚢の検討】	容器封入 集積作業		容器封入作業　詳細設計・工事 集積作業　詳細設計・工事							容器封入作業 実規模モックアップ（2023年9月～） 容器封入作業に係る実施計画変更（2025年11月18日認可） 容器封入作業の着手時期は2027年度後半 集積作業開始（2025年3月26日） HTI集積作業終了（2026年5月11日）
		●汚染水発生量を50～70m3/日程度に抑制(2028年度末)	浄化設備	【既設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業		処理運転（処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止）						（継続運転）	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転 または処理停止 濃縮廃液の試験的先行処理完了（目標とする除去性能を満足することを確認） 本格処理に向けた処理方法検討中
				【サブドレン浄化設備】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業		処理運転						（継続運転）	
				【地下水バイパス設備】 （実績・予定） ・運転	現場作業		運転						（継続運転）	
				【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 （実績・予定） ・処理運転	現場作業		処理運転						（継続運転）	
				【RO-3】 【建屋内RO 循環設備】 （実績・予定） ・運転	現場作業		運転						（継続運転）	
			陸側遮水壁	（実績・予定） ・維持管理運転	現場作業		維持管理運転						（継続運転）	
			フェーシング（陸側遮水壁内エリア）	【凍土壁内フェーシング（全6万m^2）】 （実績・予定） ・3号機西側エリア	現場作業		3号機西側エリア							
			1-4号機建屋周辺トレンチ調査	（実績・予定） ・2箇所の調査検討実施（2026年度） ・2026年4月　調査検討開始	現場作業									2026年4月　調査検討開始
			建屋間ギャップ端部止水対策	（実績・予定）・ ・2号機：1箇所／4箇所完了 ・	現場作業									2号機T／B：2026年6月4日現場着手、1箇所／4箇所完了
		●タンク関連	H4エリアNo．5タンクからの漏えい対策	（実績・予定） ・汚染の拡散状況把握	現場作業		モニタリング						（継続実施）	
			タンク解体	【J8・J9エリアタンク解体工事】 （実績・予定） ・J9エリアタンク解体基数　12基／12基 ・J8エリアタンク解体基数　5基／9基	現場作業									2025年2月3日：実施計画認可　　2025年2月14日：解体作業開始 2025年11月20日：J8エリアアウトサービス 2026年1月20日：J8エリアタンク解体開始 2026年4月10日：5基／9基　解体完了 2026年5月11日～　暖候期（5月～10月）は解体作業中断、11月頃再開予定
				【横置きタンク解体工事】 （実績・予定） ・解体基数　40基／367基	現場作業									横置きタンクの解体に係る実施計画変更（2024年5月17日認可） 未使用タンク：23基/28基、使用済みタンク：17基/339基 2026年8月4日から使用済みタンクの解体を開始
		●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 （実績・予定） ・ろ過水タンク西側整備工事実施（完了） ・地盤改良（完了） ・集水設備設置（１０基）（完了） ・移送設備設置	現場作業		サブドレン集水設備高台機能移転工事						2030年度設置完了予定	2024年11月1日：変更申請認可 8.5m盤受けタンク設置エリアの見直し（検討中）に伴う工事期間の延伸 2026年1月21日～22日　使用前検査ー部受検完了（高台集水タンク増）

東京電力ホールディングス株式会社
汚染水対策分野

廃炉中長期実行プラン2026

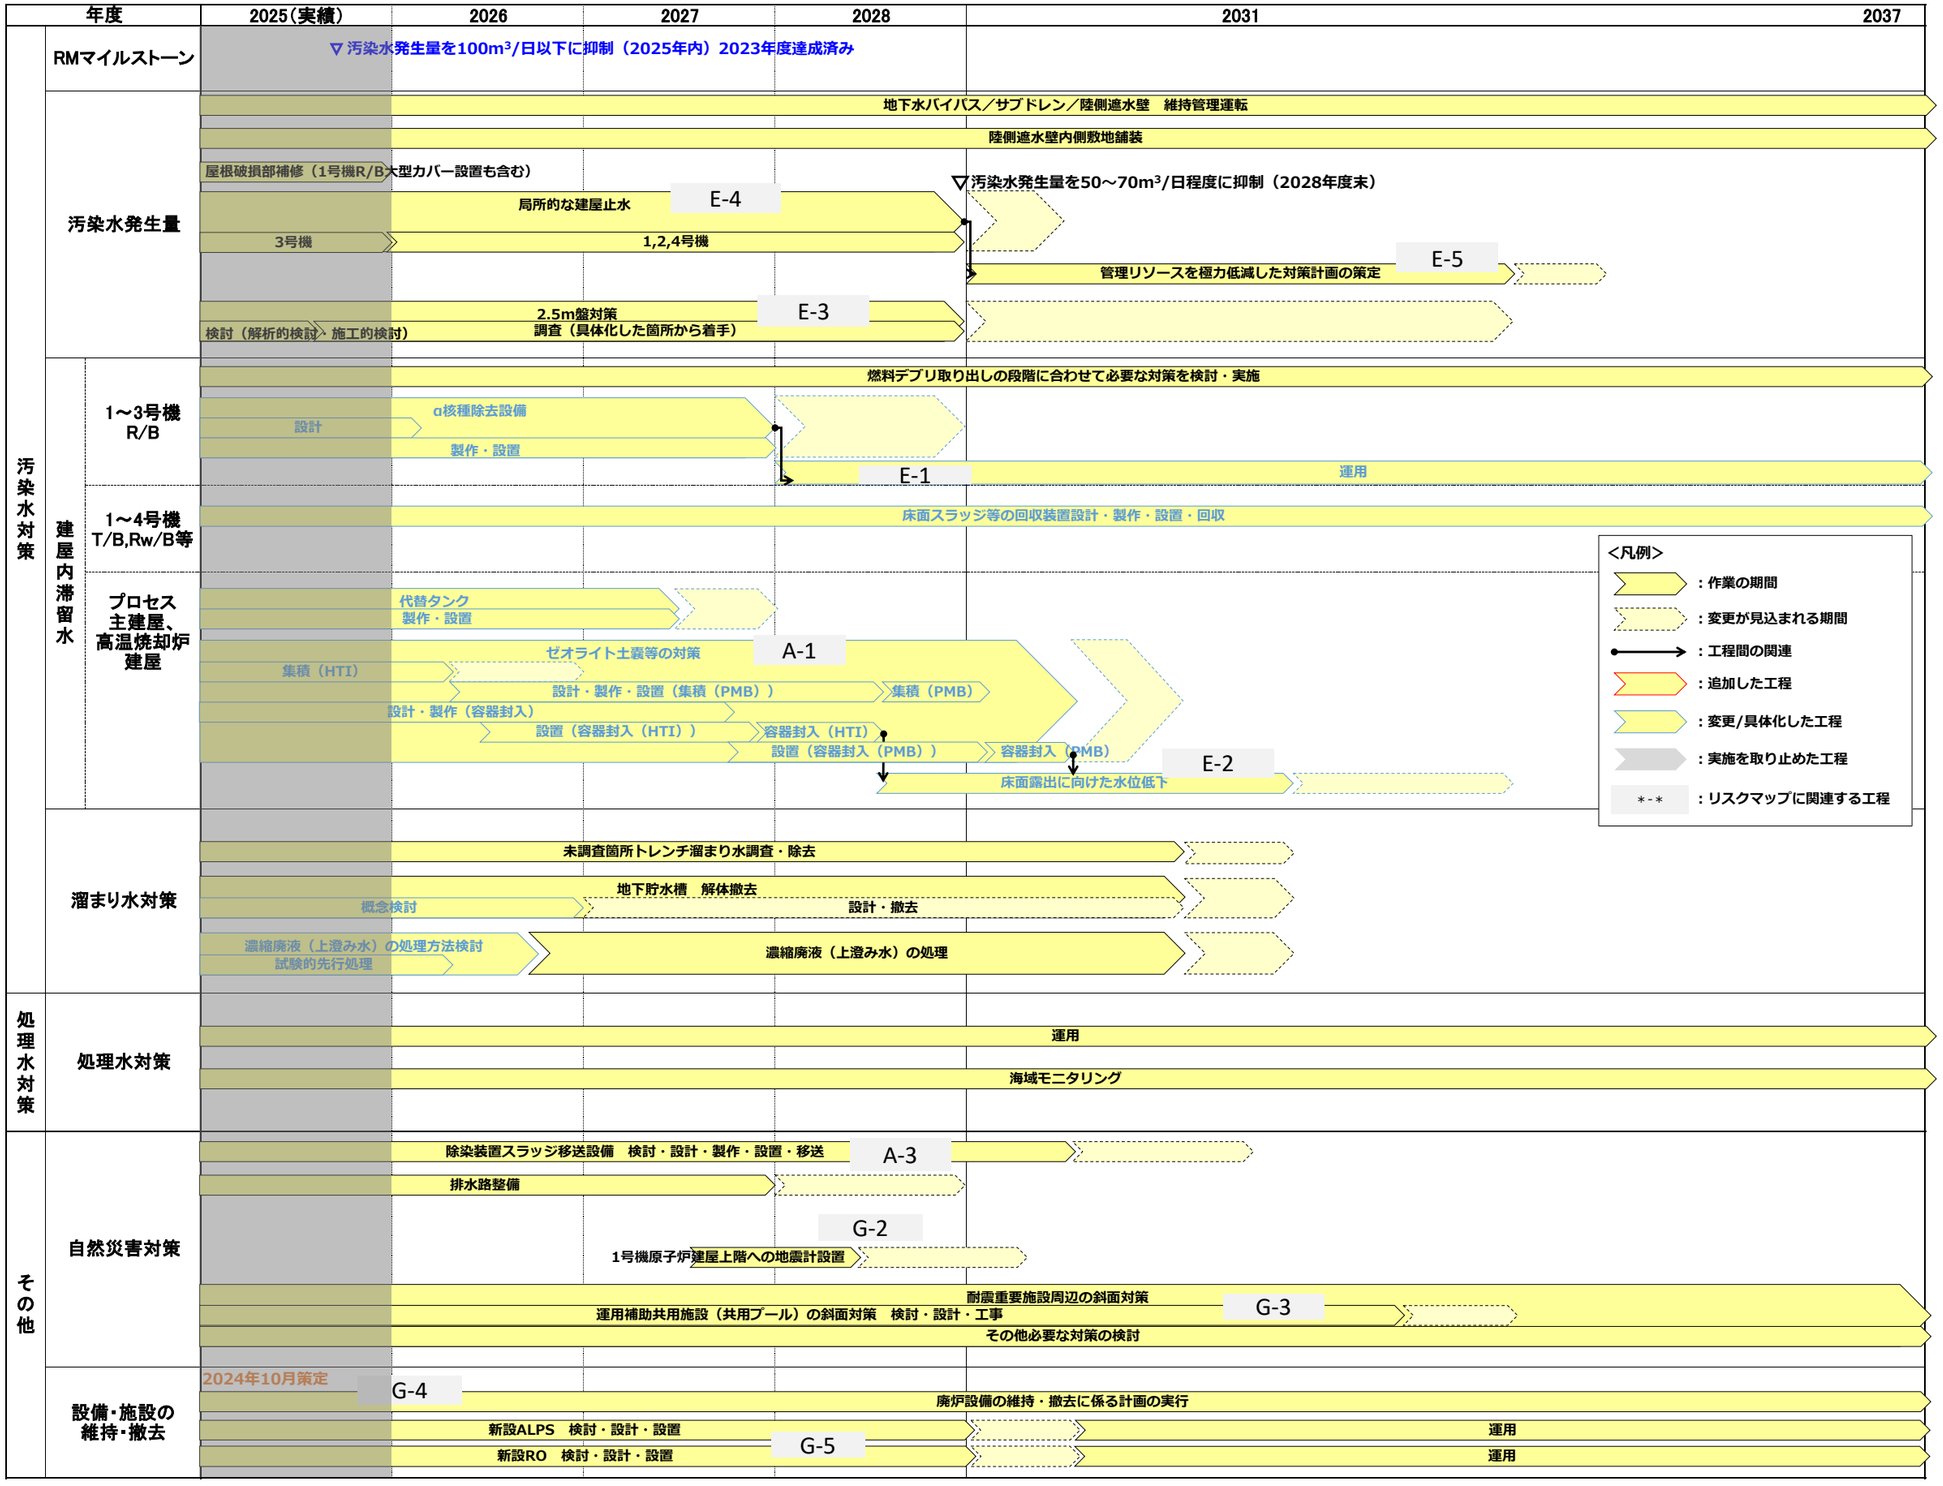

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
