放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

分野名	廃炉中長期実行プラン2026 目標工程	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月以降	備　考
							25	1 8 15 22 29	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
	●ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）	1．保管適正化の推進		雑固体廃棄物焼却設備	（実　績） ・処理運転（A系・B系） ・機電設備点検（A系） （予　定） ・処理運転（A・B系） ・機電設備点検（A・B・共通系） ・自動倉庫Aスタッカクレーン修理	現場作業	【A系】 処理運転 機電設備点検・自動倉庫Aスタッカクレーン修理 調整中 【B系】 処理運転 年末年始停止 機電設備点検 【共通系】 機電設備点検								【A系】 ・10月29日に自動倉庫Aスタッカクレーンの不具合により停止。 ・自動倉庫Aスタッカクレーンの修理対応に合わせ，12月中旬より予定していたA系の機電設備点検を前倒しして実施 【B系】 ・7月1日よりB系の機電設備点検を実施 ・10月2日にB系の機電設備点検完了後，処理運転を再開 ・2027年1月上旬よりB系の機電設備点検を予定 【共通系】 ・2027年1月上旬より共通系の機電設備点検を予定
				増設雑固体廃棄物焼却設備	（実　績） ・焼却調整運転 ・設備点検 （予　定） ・本格運転 ・設備点検	現場作業	焼却調整運転 設備点検 本格運転 年末年始停止 設備点検 設備点検								・2026年8月5日より11月まで焼却調整運転を実施。 ・2026年11月16日より11月末まで設備点検を実施中。 ・2026年12月より本格運転に移行
				減容処理設備	（実　績） ・処理運転 ・機械設備点検 （予　定） ・処理運転 ・空調設備点検 ・年次点検	現場作業	処理運転 機械設備点検 空調設備点検 年次点検								・2026年11月9日～13日 機械設備点検のため処理運転停止。 ・2026年12月中旬より空調設備点検を予定。 ・2027年1月上旬より年次点検を予定。
				除染装置（AREVA）スラッジ	（実　績） ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減 （予　定） ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	検討・設計	スラッジ対処方法検討 （2028年度完了予定）								・廃スラッジ回収施設の耐震評価を実施中。また、具体的な設備の製造・据付に向けた検討・設計業務を引き続き実施中。
						現場作業	建屋内線量低減 （2027年度完了予定）								・プロセス主建屋内の線量低減を実施中 ・津波による廃スラッジ流出リスク低減を目的としたプロセス主建屋内の貯槽D開口部閉止作業は2026年3月16日に完了。
			2．保管適正化の推進のための設備設置	固体廃棄物貯蔵庫第11棟	（実　績） ・準備工事（山留・掘削工事） ・建屋工事 （予　定） ・準備工事（山留・掘削工事） ・建屋工事	検討・設計									・2025年10月6日　準備工事（山留・掘削工事）着手 ・2026年5月18日　実施計画変更認可 ・2026年5月25日　貯蔵庫棟の基礎コンクリート打設開始
						現場作業	建屋工事 準備工事（山留・掘削工事） （2026年度完了予定）								
	●水処理二次廃棄物			大型廃棄物保管庫第一棟	（実　績） ・機電設備設置工事 ・吸着塔架台据付 （予　定） ・吸着塔架台据付	検討・設計									・2026年7月27日　実施計画変更認可（使用済吸着塔架台の設置）
						現場作業	架台据付								
				大型廃棄物保管庫第二棟	（実　績） ・設計検討 （予　定） ・設計検討	検討・設計	設計検討（建屋、機電） （2027年度完了予定）								・2031～2032年度運用開始を目標とする
						現場作業									
				スラリー安定化処理設備	（実　績） ・安定化処理設備の設計方針検討 （予　定） ・安定化処理設備の詳細設計検討 ・現地工事	検討・設計	安定化処理設備の設計検討 （2028年度完了予定）								・建屋の構造強度が成立する機器配置と建屋形状の見直しに時間を要したことや建屋設計が他の耐震B＋クラスの実績を踏まえると、想定よりも時間を要することが確認されたため、工程の見直しを行った。
						現場作業	現地工事（2030年度以降完了予定）								

分野名	廃炉中長期実行プラン２０２６ 目標工程	括り	作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月以降	備　考
							25	1 8 15 22 29	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	
固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画	●放射能濃度の評価と管理	処理・処分計画	３．固体廃棄物の性状把握		（実　績） ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析 （予　定） ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析	検討・設計								
						現場作業	計画に基づいたサンプリングの実施							（採取継続）	
						現場作業	汚染水分析・水処理二次廃棄物分析							（分析継続）	
						現場作業	瓦礫類分析							（分析継続）	・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中 ・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている リスト：https://clads.jaea.go.jp/jp/rd/tech-info.html 検索　：https://frandli-db.jaea.go.jp/FRAnDLi/
	●分析施設		４．分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第１棟	（実　績） ・放射性物質を用いた分析作業 （分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む） （予　定） ・放射性物質を用いた分析作業 （分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む）	現場作業					放射性物質を用いた分析作業（分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む）			（分析継続）	
				JAEA分析・研究施設第２棟	（実　績/予　定） ・設置工事	現場作業	設置工事							（設置工事継続）	・2020年5月20日　実施計画変更認可申請 ・2024年12月11日　実施計画一部補正提出 ・2024年12月18日　実施計画変更認可 ・2025年3月25日　事前了解 ・2025年8月8日　実施計画変更認可申請(仕様変更) ・2026年4月9日　実施計画変更認可
				総合分析施設（廃棄物分析）	（実　績/予　定） ・設計検討（基本設計）	検討・設計	設計検討（基本設計）								

廃炉中長期実行プラン2026

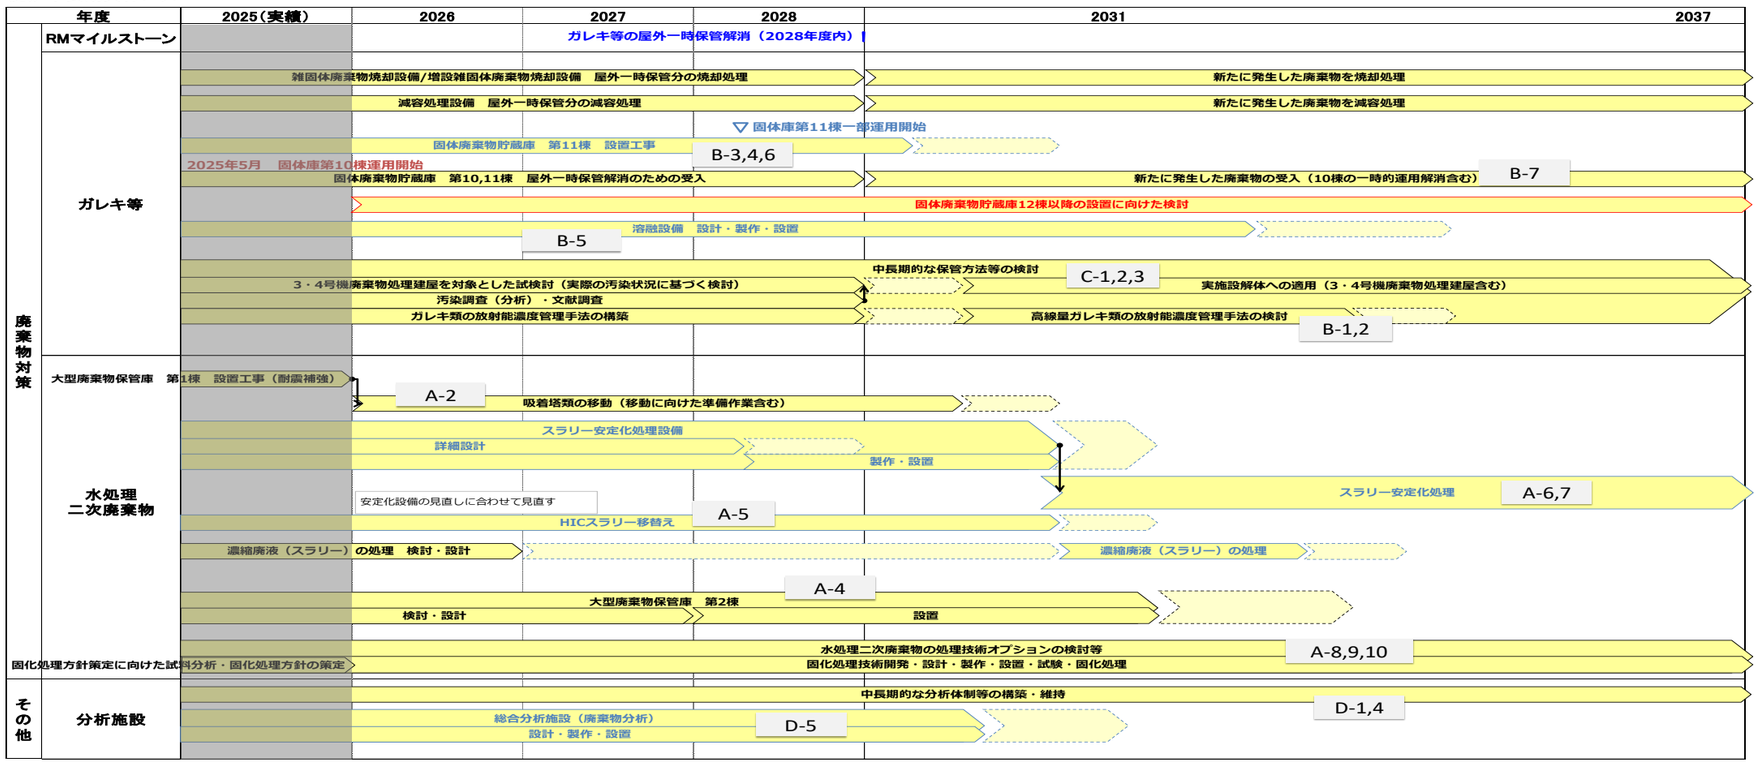

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
