福島第一原子力発電所 陸側遮水壁　凍結管設置作業の進捗状況について

＜参考資料＞
2015年9月3日
東京電力株式会社

陸側遮水壁　4週間工程表　（平成27年8月23日～平成27年9月19日）

施工ブロック （削孔完了本数※／全削孔本数※） ※（）内数字は貫通本数再掲	8月							9月																				
	先週							今週							来週							再来週						
	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日
凡例 準備工： 削孔工： 建込工： 配管工： ブライン循環・試験凍結：																												
1BLK（凍結：75／75本） （測温：16／16本） （建込：75／75本）		注）8/21ブライン供給休止																						注）9/16ブライン供給再開（予定）	ブライン循環			
2BLK（凍結：19／19本） （測温：5／5本） （建込：19／19本）		試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
3BLK（凍結：199／199本） （測温：43／43本） （建込：199／199本）		試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
4BLK（凍結：33(7)／33(7)本） （測温：7／7本） （建込：33(7)／33(7)本）	注）6/3より試験凍結箇所へのブライン供給休止中	試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
5BLK（凍結：218(23)／218(23)本） （測温：47(3)／47(3)本） （建込：218(23)／218(23)本）		注）8/21ブライン供給休止																						注）9/16ブライン供給再開（予定）	ブライン循環			
6BLK（凍結：193(19)／193(19)本） （測温：42／42本） （建込：193(19)／193(19)本）		試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
7BLK（凍結：125(14)／125(14)本） （測温：29(1)／29(1)本） （建込：125(14)／125(14)本）		試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
8BLK（凍結：102／102本） （測温：22／22本） （建込：102／102本）	注）8/13より試験凍結箇所へのブライン供給休止中	試験凍結工 注）8/21ブライン供給休止							試験凍結工							試験凍結工							ブライン循環、試験凍結工 注）9/16ブライン供給再開（予定）					
9BLK（凍結：72(7)／72(7)本） （測温：17(1)／17(1)本） （建込：72(7)／72(7)本）			配管工								配管工									配管工								
10BLK（凍結：81(0)／83(3)本） （測温：19／20本） （建込：79(0)／83(3)本）		建込工、配管工							削孔工、配管工							削孔工							建込工					
11BLK（凍結：160(0)／235(36)本） （測温：44(0)／56(3)本） （建込：142(0)／235(36)本）		探査ボーリング工、削孔工（貫通）							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工					
12BLK（凍結：.112(0)／160(28)本） （測温：36／39本） （建込：112(0)／160(28)本）		建込工							建込工														探査ボーリング工					
13BLK（凍結：42(0)／54(4)本） （測温：15／16本） （建込：42(0)／54(4)本）																												
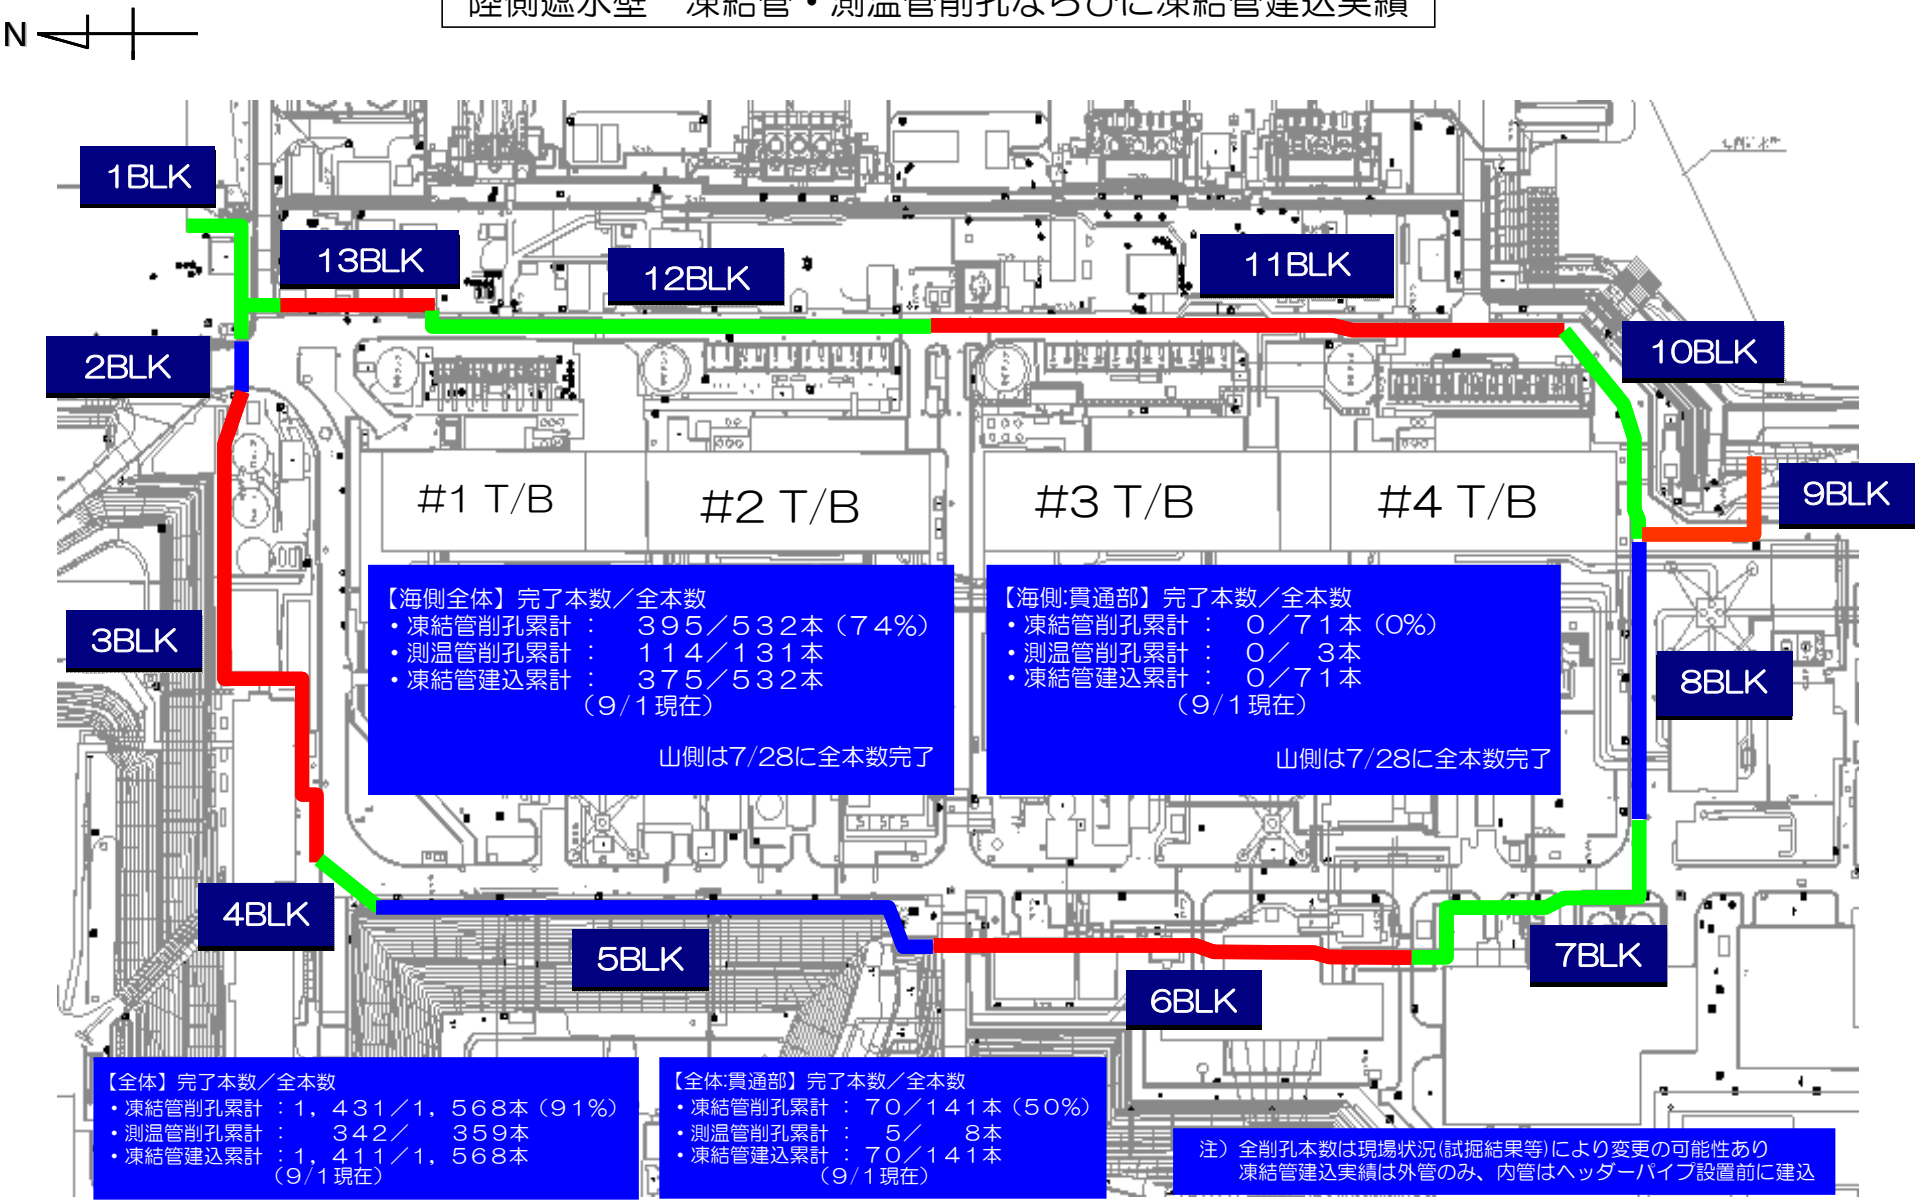
陸側遮水壁　凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績
