福島第一原子力発電所 陸側遮水壁　凍結管設置作業の進捗状況について

＜参考資料＞
2015年9月17日
東京電力株式会社

陸側遮水壁　4週間工程表　（平成27年9月6日～平成27年10月3日）

施工ブロック （削孔完了本数※／全削孔本数※） ※（）内数字は貫通本数再掲	9月																									10月		
	先週							今週							来週							再来週						
	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日
凡例　準備工： 削孔工： 建込工： 配管工： ブライン循環・試験凍結：																												
1BLK　（凍結：75／75本） （測温：16／16本） （建込：75／75本）		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
2BLK　（凍結：19／19本） （測温：5／5本） （建込：19／19本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
3BLK　（凍結：199／199本） （測温：43／43本） （建込：199／199本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
4BLK　（凍結：33(7)／33(7)本） （測温：7／7本） （建込：33(7)／33(7)本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
	注）6/3より試験凍結箇所へのブライン供給休止中	注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
5BLK　（凍結：218(23)／218(23)本） （測温：47(3)／47(3)本） （建込：218(23)／218(23)本）		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
6BLK　（凍結：193(19)／193(19)本） （測温：42／42本） （建込：193(19)／193(19)本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
7BLK　（凍結：125(14)／125(14)本） （測温：29(1)／29(1)本） （建込：125(14)／125(14)本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
		注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
8BLK　（凍結：102／102本） （測温：22／22本） （建込：102／102本）		試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工							試験凍結工					
	注）8/13より試験凍結箇所へのブライン供給休止中	注）8/21ブライン供給休止								注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
9BLK　（凍結：72(7)／72(7)本） （測温：17(1)／17(1)本） （建込：72(7)／72(7)本）						配管工																						
										注）9/15ブライン充填作業完了、ブライン循環再開時期検討中																		
10BLK（凍結：83(0)／83(3)本） （測温：20／20本） （建込：79(0)／83(3)本）			削孔工													建込工							建込工					
11BLK（凍結：182(20)／235(36)本） （測温：47(2)／56(3)本） （建込：142(0)／235(36)本）		探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、建込工、配管工							探査ボーリング工、削孔工、建込工、配管工					
12BLK（凍結：.112(0)／160(28)本） （測温：36／39本） （建込：112(0)／160(28)本）						削孔工（貫通）			探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工							探査ボーリング工、削孔工（貫通）、配管工					
13BLK（凍結：42(0)／54(4)本） （測温：15／16本） （建込：42(0)／54(4)本）												探査ボーリング工				探査ボーリング工							探査ボーリング工					
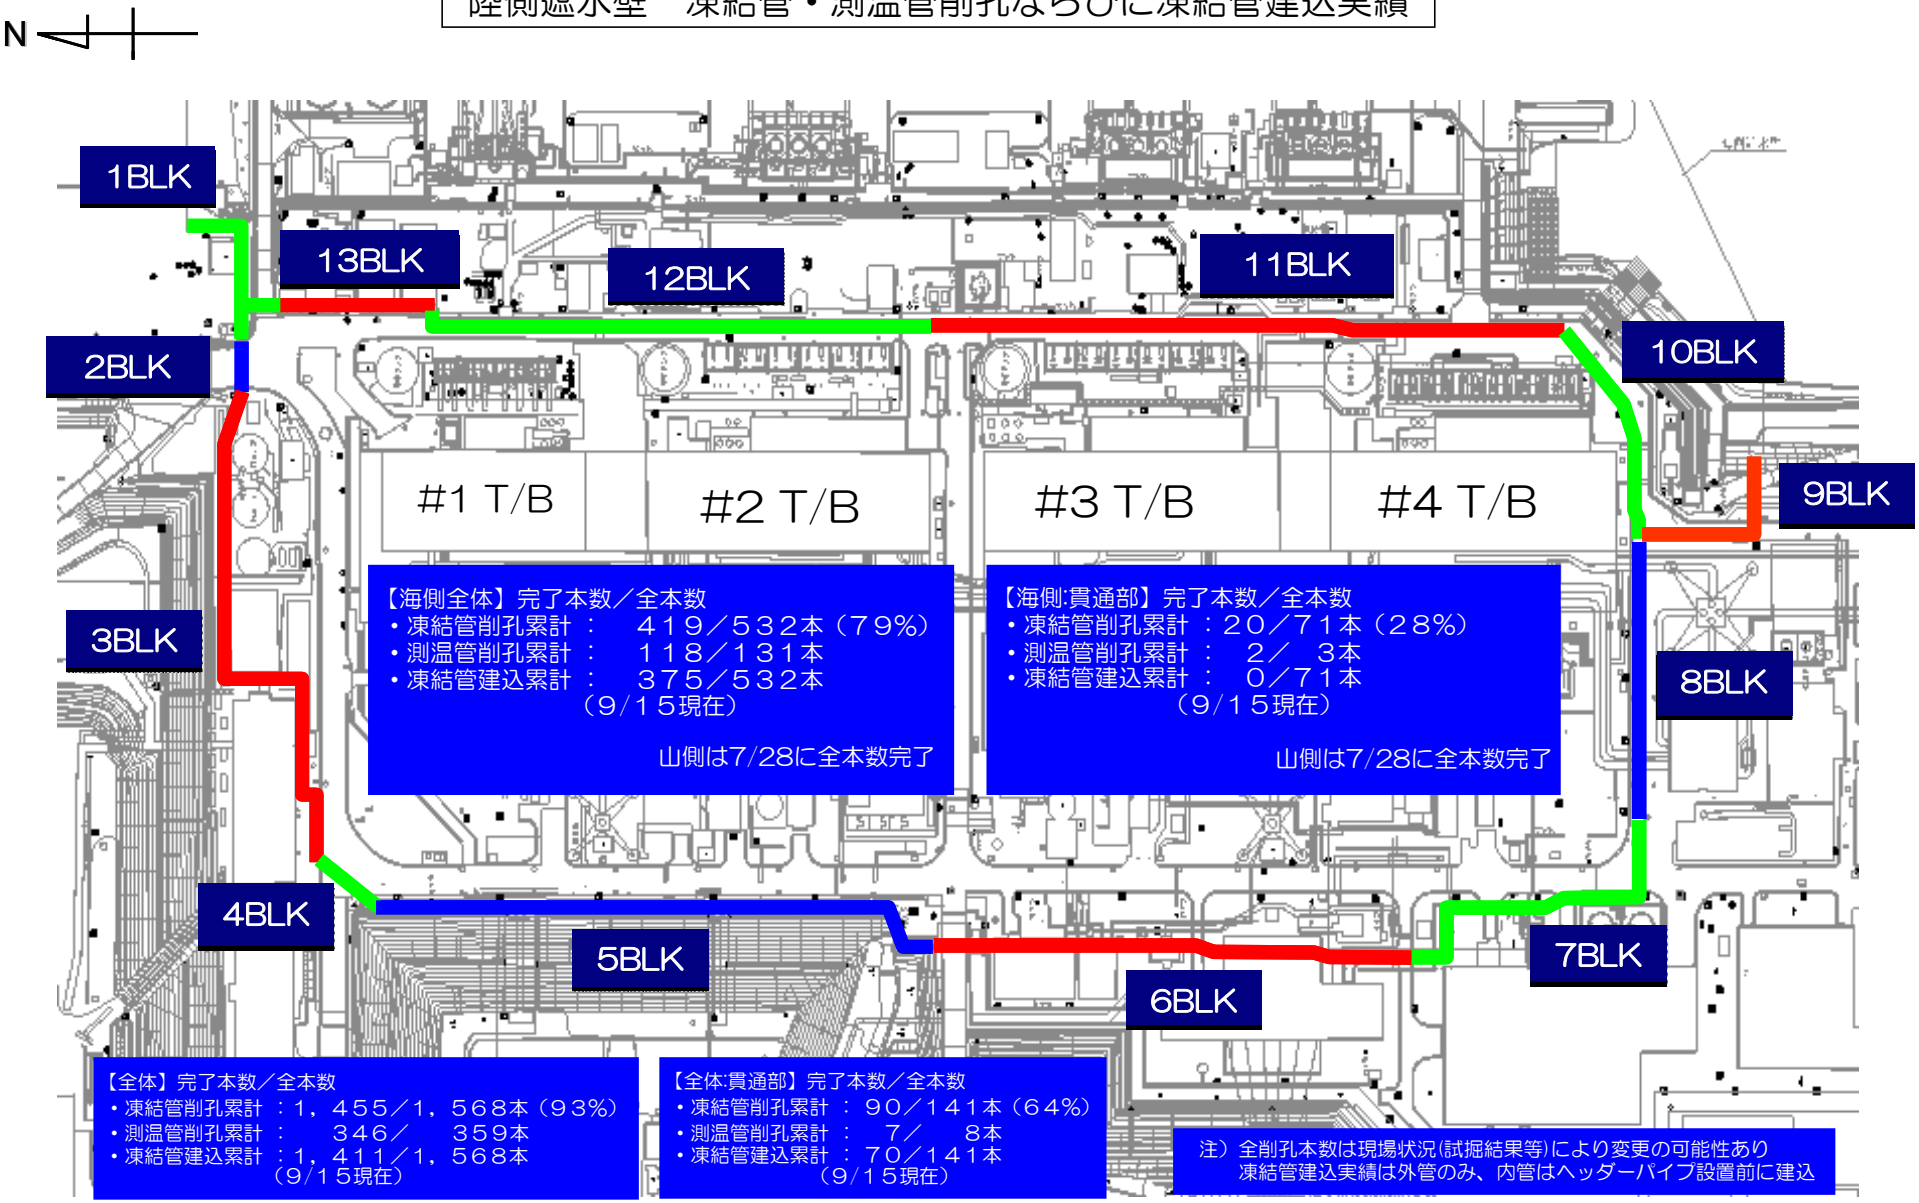
陸側遮水壁　凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績
